

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.

Mustafa Kemal Atatürk

İÇİNDEKİLER

1- GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	1
1.3. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	9
1.4. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları	14
2- 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI	16
2.1. Devam Eden Projeler	16
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri	16
2.2. Tamamlanan Projeler	19
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi	19
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu	20
3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER	26

TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı	2
Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar	3
Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar	3
Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları	4
Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları	5
Tablo 6 2025 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler	9
Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı	14
Tablo 8 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı	14
Tablo 9 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı	15
Tablo 10 2025 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı	16
Tablo 11 2025 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı	16
Tablo 12 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi	19

Şekil 1 2025 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı	1
Şekil 2 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda harcama dağılımı	15

EKLER

Ek 1 2025 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	27
--	----


1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemizin, 2025 Yılı Yatırım Programında 10 adet projesi bulunmakta olup, bu projelerin finansman kaynağını; Hazine Yardımı, Öz Gelir (ikinci Öğretim Gelirleri, Uzaktan Öğretim Gelirleri, Kira Gelirleri, Araştırma projeleri gelir payı) ve Şartlı Bağış ve Yardımlar oluşturmuştur. Projeler için 1.603.308.000 TL Hazine Yardımı, 53.538.000 TL Öz Gelir ve 10.512.538 TL Şartlı Bağış ve Yardımlar olmak üzere toplam 1.667.358.538 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Şekil 1 2025 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı

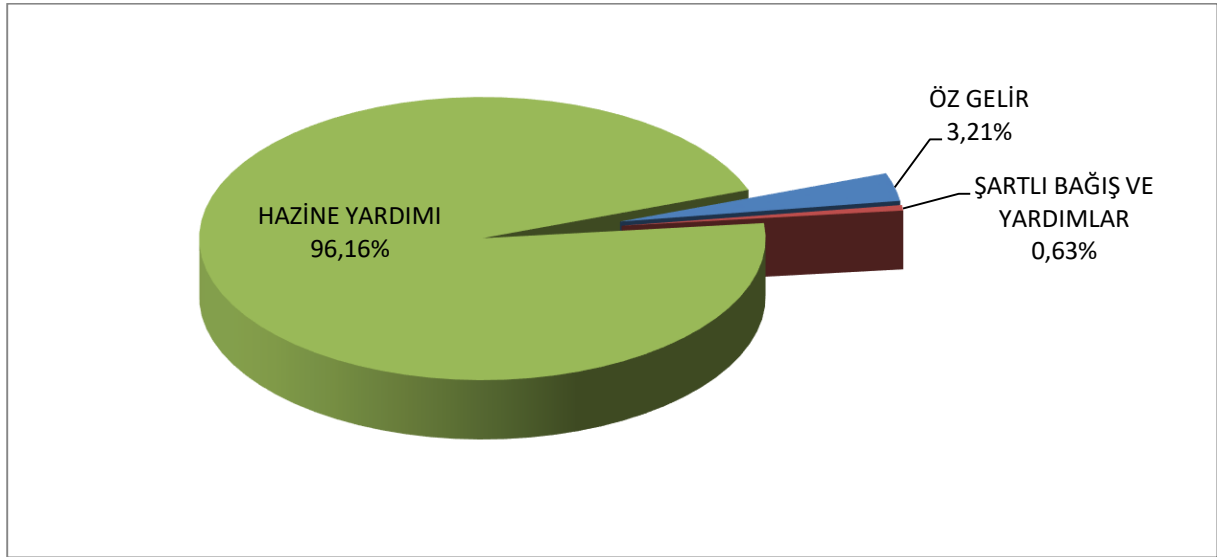

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemizde 19 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu'nda hizmet verilmektedir. Üniversitemiz toplamda 17.513.647 m² açık alana 677.021 m² kapalı alana sahiptir.

Balcalı Yerleşkesi'nde idari binalar, eğitim binaları, tam teşekküllü üniversite hastanesi, merkezi kütüphane, personel ve öğrenci yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, kayıkhanesi, botanik bahçesi, laboratuvarlar, kongre merkezi, kongre ve toplantıların yapılabileceği farklı kapasitelerde amfiterenler, açık hava amfi tiyatrosu, kuzey çarşısı, anaokulu, personel lojmanları, banka şubeleri ve ATM'leri, süpermarket, çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Ayrıca

Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin araştırma projeleri ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yürütüldüğü yaklaşık 7.000 dekar arazi varlığına sahip Araştırma ve Uygulama Çiftliği Balcalı kampüsü içerisinde bulunmaktadır.

Yerleşke dışında ise il merkezinde; Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; ilçelerde Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ve Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir.

Üniversitemiz kapalı alanının sunulan hizmet türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı

AÇIKLAMA	KAPALI ALAN MİKTARI (m ²)
Eğitim Alanları	277.653
Araştırma Alanları	8.561
Sosyal Alanlar	27.777
Spor Alanları	36.100
İdari Alanlar	60.608
Sağlık Alanları	146.036
Kütüphane Alanları	17.816
Barınma Alanları	37.752
Toplantı ve Konferans Alanları	28.615
Diğer Alanlar	36.103
TOPLAM	677.021

Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymaları, enerjilerini bu yönde kullanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösteren spor dalları; Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, Basketbol, Futbol, Salon Futbolu, Voleybol, Hentbol, Güreş, Kürek, Kano, Tekvando, Karate, Bilek Güreşi, Bisiklet, Boks, Spor Tırmanışı, Kick Boks ve Korumalı Futbol branşlarını kapsamaktadır.

Spor Müdürlüğümüz bünyesinde üniversitemiz de her yıl düzenlenen Ünilig müsabakaları Fakülte ve Yüksekokul ile Meslek Yüksekokulları arasında Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis branşlarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversiteler arasında her yıl yapılmakta olan Ünilig müsabakalarına üniversitemizi temsilen okul takımlarımız branşlarına göre katılım sağlamaktadır. Sakıp Sabancı ve Spor Sergi Sarayı her yıl düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Spor Tesislerimizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sabancı Vakfı tarafından kontrol edilen Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitimi ve Rehabilitasyon Derneğinin (TOSSED) işbirliği ile Adana ili ve çevresinde bulunan yedi ilden gelen engelli çocuklara tesislerimizde sağlık taramaları yapılmakta ve Basketbol, Atletizm, Futbol ile Yüzme branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi müsabakasına ev sahipliği yapılmaktadır.

Üniversitemizin mevcut bilgi ve teknolojik kaynakları ile yazılım alt yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar

Taşınır Kod Listesi	ADET
Masaüstü Bilgisayarlar (Masaüstü Bil., Server Bil., Thin Client ve Kasa+Ekran)	7.923
Dizüstü Bilgisayarlar	2.049
Tablet Bilgisayarlar	267
Cep Bilgisayarları	8
Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar	542
Blade Sunucular	1
Raf Sunucular	1
Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	46
Yazıcılar ve Okuyucular	4.412
Tarayıcılar	481
Yedekleme Cihazları (Harici Yedekleme Üniteleri)	2.069
Fotokopi Makineleri	183
Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	139
Swichler (Anahtarlar)	613
Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	150
İletişim Ağ Cihazları	40
Firewall Cihazları	3
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	1.390
Tepegözler (Slayt Cihazları)	29
Fotoğraf Makineleri	311

Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar

Yazılım	Yazılım Edinim Şekli			
	Bilgi İşlem	Satın Alma	Kiralama	Kamu Kurumu
Ansyc Akademik Lisans		X		
Autocad Akademik Lisans			X	
Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi				X
Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS)	X			
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)				X
Program Bütçe (Bütçe Takip)				X
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EOBS)	X			
Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)		X		
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)				X
EndNote Akademik Lisans			X	
Hizmet Takip Programı (HİTAP)				X
Akademisyen Bilgi Sistemi (ABS)	X			
İşçi ve Sözleşmeli Maaş Programı	X			
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)				X
Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS)		X		
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)				X
Matlab Akademik Lisans			X	
MDAEMON Mail Yazılımı		X		
Yükseköğretim Mekanları Envanter Sistemi (YMESS)				X
Microsoft Akademik Lisans			X	
Netcad Akademik Lisans		X		
Online Sınav Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			
OSKA Yazılım			X	
Personel Özlük İşleri Programı	X			
Kaspersky Antivirüs Akademik Lisans		X		
SPSS Akademik Lisans		X		
Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-SGB)				X

Yazılım	Yazılım Edinim Şekli			
	Bilgi İşlem	Satın Alma	Kiralama	Kamu Kurumu
Kalite Yönetim Sistemi (KYBS)	X			
VM Ware Sunucu Sanallaştırma İşletim Sistemi		X		
Windows Office Paketleri			X	
Akademik Başvuru Sistemi (ABSİS)	X			
Adobe Creative Cloud			X	
Etkinlik Yönetim Sistemi (EVENTS)	X			
Çukurova Mobil APP	X			
Kütüphane Otomasyon Ssitemi (LIBRA)		X		
Kitap Takip Sistemi (KİTS)				X
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			

Üniversitemizde kullanılan taşıtların cinsi ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları

TAŞITIN CİNSİ	MEVCUT TAŞIT SAYISI	HİZMET ALIMIYLA KULLANILAN TAŞIT SAYISI
Binek otomobil	13	3
Station-Wagon	11	0
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik)	13	0
Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik)	14	0
Panel	5	1
Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	0
Otobüs (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik)	3	0
Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)	3	0
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	5	0
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	1	0
Ambulans (Tıbbi donanımlı)	2	0
Motosiklet (En fazla 600 cc. lik)	2	0
Motosiklet (En az 601 cc. lik)	1	0
TOPLAM	74	4

Araştırma ve eğitimin en önemli destek birimi olan Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, 8.000 m²'lik kapalı alanı bulunan binasında aynı anda 850 okuyucunun yararlanabileceği 4 okuma ve çalışma salonları, 1 sergi, 1 engelli okuma salonu, 1 konferans salonu yer almaktadır. Kütüphanemizde 217.786 basılı ve 1.109.981 elektronik kitaba ulaşılabilmektedir. Kütüphanemizde 2025 yılı itibariyle 1.494 kalem basılı süreli yayın arşivi ile 68.077 adet elektronik süreli yayınıımız bulunmaktadır. Online olarak erişim yapılabilen tez sayısı 4.183.000 adet üzerinde olmakla birlikte elektronik kaynaklardan yaklaşık 667.000 adet yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirmesi gerçekleştirilmiştir. Eski yıllara ait dergiler de, süreli yayınlar bölümü görevlilerince okuyucunun istifadesine sunulmaktadır. Nadir Eserler Bölümü'nde 70 adet el yazması, 849 adet eski harfli basma eser bulunmaktadır.

İnternet aracılığıyla kütüphanemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM) erişilebilmektedir.

Kütüphanemiz, 2025 yılında toplam 84 adet veritabanına abone olmakla birlikte bu veritabanlarının 24 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla, 49 adedine TÜBİTAK EKUAL, TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

aracılığıyla, 11 adedine ise doğrudan firmalardan satın alınma yöntemiyle erişim sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinin abone olduğu veri tabanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
1	Academic Search Ultimate
2	Akademik Sunum
3	Akademisyen Online Veritabanı (AOV)
4	AMA Journals
5	American Chemical Society (ACS) Journals
6	Annual Reviews
7	Applied Science & Business Periodicals Retrospective
8	Applied Science & Technology Index Retrospective
9	Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM)
10	Art Index Retrospective
11	ASCE Library
12	ASME Digital Collections
13	BMJ Journals
14	BOOK Cites
15	Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
16	Business Source Ultimate
17	CAB Abstracts
18	Cambridge Journals Online
19	Central & Eastern European Academic Source
20	Clinical Key
21	Dynamed
22	EBSCO Discovery Services
23	Ebook Central Open Access Collection
24	EBSCO E-Book Super Collection
25	Education Index Retrospective 1929-1983
26	Elsevier E-Books
27	Emerald
28	Emerald Social Sciences e-Book Collection
29	ERIC
30	Essential Science Indicators
31	European Views of the Americas: 1493-1750
32	GreenFILE
33	Hein Online
34	Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
35	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
36	İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı
37	InCites Benchmarking& Analytics
38	İntihal.net
39	IThenticate
40	Journal Citation Reports (JCR)
41	JSTOR
42	Legal Online Veritabanı
43	Library, Information Science & Technology Abstracts
44	Lexpera
45	MasterFILE Complete
46	MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)
47	Math Science Net
48	Medline
49	Mendeley
50	Military Big Data (MILDATA)
51	Müteferriqa : Osmanlı Türkçesi
52	Nature Academic Journals
53	Nature Journals

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
54	Newspaper Source Plus
55	Newswires
56	Open Dissertations
57	OVID Journals
58	Oxford Online Journals
59	Palgrave Macmillan Journals
60	Pooltext Report
61	ProQuest Agricultural Science Collection
62	Proquest Dissertations and Thesis
63	Regional Business News
64	SAGE Journals Online
65	Science Direct
66	Scopus
67	SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
68	Social Sciences Index Retrospective: 1907 - 1983
69	Springer Biomedical & Life Sciences E-Books
70	Springer Engineering E-Books
71	Springer Link
72	Taylor & Francis Online Journals
73	Teacher Reference Center
74	The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)
75	Thieme (2018 ve öncesi erişim)
76	TR Dizin (EBSCOhost)
77	Turcademy
78	Turnitin
79	UpToDate
80	VETİS
81	Web News
82	Web of Science(SCI, SSCI, AHCI)
83	Wiley E-Books
84	Wiley Online Library

Üniversitemizde 2.123 akademik personel 25 sözleşmeli akademik personel görev yapmaktadır. Bunun yanında 2.447 kadrolu idari personel, 203 sözleşmeli idari personel, 2.090 işçi ve 32 geçici işçi görev yapmaktadır.

Üniversitemizde 41.160 I. Öğretim öğrencisi, 3.049 II. Öğretim öğrencisi ve 1.232 Uzaktan Öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 45.441 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlardan 2.512 öğrenci Tezli Yüksek Lisans, 558 öğrenci Tezsiz Yüksek Lisans ve 1.314 öğrenci Doktora programlarında eğitim-öğretim hizmeti almaktadır.

Üniversitemiz Tarım ve Gıda, Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimler, Enerji ve Çevre ve Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik gibi öncelikli alanlara yönelerek çalışmalarına bu yönde devam etmektedir. Öncelikli alanlara yönelik hizmet veren uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere Üniversitemizde toplam 41 adet araştırma ve uygulama merkezi faaliyet göstermektedir. Merkezler dışında güçlü ve deneyimli kadroya sahip akademik birimlerle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Araştırma ve Geliştirme Stratejileri Koordinatörlüğü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Çukurova Teknokent A.Ş. araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve hizmet vermektedir.

Üniversitemiz araştırma faaliyetleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından koordine edilmektedir. BAP, Üniversitemizdeki araştırma projelerinin idari ve mali süreçlerini web tabanlı bir yazılım (BAPSİS) ile yürütmektedir. Üniversitemiz iç kaynaklı proje

türlerinden Genel Amaçlı Projeler (GAP), Tez Projeleri (TEZ), İş Birlikli Projeler (İBP) ve Tohum Projeler (TP) olmak üzere 4 grup altında desteklenmektedir. Üniversitemiz araştırma-geliştirme altyapısının önemli kısmı birimlerin ilgili laboratuvarlarında bulunmaktadır. Ayrıca en yeni teknolojilerle donatılmış, tüm birimler ve üniversite dışı kurumlara destek veren ÇÜMERLAB, Subtropik Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Biyoteknoloji), Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı öğretim elemanlarımıza önemli altyapı desteği sunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Ülkemizdeki 23 araştırma üniversitesinden biri olarak Ar-Ge faaliyetlerinden ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı ve ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda tanınırlığını devamlı artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Üniversitemiz ar-ge kapasitesi ve kalitesinin artırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan bir araştırma politikası izlemektedir.

Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunumu Balcalı Hastanesi, Medikososyal Merkezi ve Dış Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Balcalı Hastanemizde; 1 Acil Servis, 52 Poliklinik, 10 Yoğun Bakım Ünitesi, 35 Ameliyathane, 47 Klinik, 7 Laboratuvar, 1 Radyoloji Alanı, 2 Nükleer Tıp Alanı, 1 Onkoloji Ek Hizmet Binası, 1 Kan Merkezi, 1 Yanık Ünitesi, 4 Sterilizasyon Alanı, 1 Eczane, 1 Hemodiyaliz, 1 Çamaşırhane ve 6 Teknik Servis bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 77 Anabilim dalında bilimsel araştırma ve uygulama yapılmakta ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Hastanemizin idari yapısı 1 Başhekim, 7 Başhekim Yardımcısı, 1 Hastane Başmüdürü, 1 Hastane Müdürü, 6 Hastane Müdür Yardımcısı, 1 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, 4 Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Eczacılık Hizmetleri, Teknik Koordinatörlük ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetleri ve idari hizmetler bu idari teşkilat ve bu birimlerde görev yapan personel ile yerine getirilmektedir.

Hastanemizin 2025 yılında acil servis yatak sayısı 17, yoğun bakım yatak sayısı 123, klinik yatak kapasitesi 573'dür. Bunun yanı sıra Hastanemizde 3.211 Acil Servis Hizmetleri, 5.735 Yoğun Bakım, 46.515 Klinik, 51.368 Ameliyat, 524.121 Poliklinik, 7.145.818 Laboratuvar Hizmetleri tetkik sayısı, 369.552 Radyoloji Ünitesi Hizmetleri tetkik sayısı, 17.120 Nükleer Tıp Hizmeti tetkik verilmiştir. Deprem dolayısıyla bazı birimlerimiz geçici olarak Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yüreğir Devlet Hastanesi Binası'nda hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemizde 2025 yılında 990.014 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Hastanemiz, ülkemizin en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden birisidir. Modern ünitelerde her türlü yoğun bakım hastası izlenebilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Hastanemiz merkez laboratuvarı, gelişmiş ülkelerin sağlık akreditasyonu olarak kabul ettiği JCI akreditasyonuna sahiptir. Bölgenin en büyük ve kapsamlılarından olan Kan Merkezimiz, 24 saat hizmet vermektedir. Radyoloji bölümünde modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Hastanemizde tüm cerrahi alanlarda son teknoloji ile donatılmış cihazları ve alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile her türlü ameliyat yapılmaktadır. 2025 yılında 51.368 adet ameliyat yapılmıştır.

Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezinde, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik tedavilerinin yapılmasının yanında; personel ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de tedavileri yapılabilmektedir.

Merkezimizde 2 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Polikliniği, 1 Psikiyatri ve 1 Dahiliye Polikliniği, 1 Cildiye Polikliniği, 1 Beslenme ve Diyet Polikliniği, 1 Dış Polikliniği, 3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Polikliniği olmak üzere toplam 10 Poliklinikte hizmet verilmektedir.

Mediko-Sosyal Merkezimizde 2025 yılında Sağlık ve Koruyucu Sağlık hizmetinden yararlanan 4.898 personel ve 12.930 Üniversitemiz öğrenci sayısı bulunmaktadır. Merkezimizde, 2025 yılında eğitim öğretim gören 466 öğrenciye psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, 1018 öğrenciye Dâhiliye, Cildiye, Beslenme ve Diyet ve Psikiyatri hizmetleri, 478 öğrenciye dış polikliniği hizmeti, 10.968 öğrenciye Kurum İçi Eğitim, Danışmanlık, Hemşirelik Hizmeti, Sağlık Eğitim Hizmeti verilmiştir. Merkezimizde çoğunluğu öğrenci olmak üzere toplam 17.828 hastaya da sağlık hizmeti verilmiştir. Ayrıca Merkezde oluşturulan sağlık ekiplerince ayda bir Üniversitemiz Anaokulu çocuklarının sağlık taraması yapılmaktadır.

Dış Hekimliği Fakültemiz, 163 dış ünitesi ile günde ortalama 1100 hastaya hizmet vermektedir. Dış Hekimliği Fakültemiz 2025 yılında 311.225 hastaya sağlık hizmeti vermiş, 77.221 adet tetkik yapmıştır. Fakültemiz, Ayrıca Dış Hekimliği Fakültesinde 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bunun yanında üniversitemizde engelli öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi tarafından, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve ihtiyacı olan tüm çocuklara protez ve kapsamlı rehabilitasyon sağlanması, uzuv kaybı yaşayan çocuklara özel bir Rehabilitasyon Merkezinin inşa edilmesi ve işletilmesi, Türkiye’de uzuv kaybı yaşayan çocuklar için çocuk rehabilitasyon alanında bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması olmak üzere kısa, orta ve uzun vadede ulaşılabilecek öngörülen üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) kurulmuştur. ÇOİM Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası Üniversitemiz Balcalı Yerleşkesinde bulunmakta olup tüm hizmetleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi sağlık personeli ve Bilim Kurulu tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir.

1.3. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Tablo 6 2025 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2025H03-259085	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje İşlerinin Yapılması	Proje kapsamında muhtelif hizmet binaları ve tesisleri için zorunlu enerji etüdü yaptırılması ve enerji yöneticiliği hizmet alım işi ve Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık ve Temel Tıp Bilimleri yeni binaları uygulama projelerinin revize yapılması ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %74'ü harcanmıştır.
Eğitim	2024H03-232971	Kampüs Altyapısı	-Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin Yapılması	Proje kapsamında su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi, Ziraat Fakültesi galeriler ve muhtelif kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ve kampüs içi muhtelif yerlere kamera tesisi yapılması işi, Balcalı kampüsü kuzey göl dalgıç pompa değişimi ve park bahçeler pompa dairesinde bulunan pompaların bakım onarım yapılması işi, muhtelif yerlerde kanalizasyon ve alt yapı yapılması işi, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı kalorifer tesisatı ve ana ısı merkezi içme suyu besleme hattı işi, muhtelif fakültelerde engelli erişebilirlik düzenlemesi yapılması işi, Rektörlük muhtelif mekanik tadilat onarım işi, kampüs muhtelif alt yapı işleri, Kuzey Çarşısı mescit, İŞKUR binası, Nükleer Tıp binası yağmur suyu ve Yabancı Diller Yüksekokulu binası yağmur suyu tadilat onarım işi, Kültür ve Zooteknik Bölümü kanalizasyon hattı yenileme işi, Açık Amfi foseptik hattı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi altyapı işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %56'sı harcanmış olup, projenin 2025 yılı için planlanan işlerinin fiziki gerçekleşme oranı %100'dür. Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı işlerinin yapılması ile kampüs altyapısında iyileşme ve daha kaliteli hizmet sunumu sağlanmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2025H03-259087	Muhtelif İşler	-Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet) Taahhüt Alımı	Projenin bakım onarım işleri kapsamında iş makinesi yedek parça ve bakım onarım işi, Güvenlik Binası yapım işi, Güvenlik Binası sistem odası elektrik tadilatı yapılması işi, süs havuzları tadilat işi, muhtelif birimlerde bulunan iklimlendirme sistemleri yıllık periyodik bakım işi, Dış İlişkiler Binası tadilat ve onarım işi, muhtelif asansörlerin bakım-onarım ve revizyonu işi, muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işi, Mithat Özsan Amfisi ve Rektörlük İdari Birimler binası tadilat ve onarım işi, Tufanbeyli MYO doğalgaz dönüşüm işi, Adana MYO B Blok tadilat ve onarım işi, Sağlık Bilimleri Fakültesi yangın hidroforu ve içme suyu bakım onarım işi, Veterinerlik binası tadilat ve onarım işi, Üniversitemiz kütüphane klima santraline bağlı ısıtma-soğutma gruplarının muhtelif arızalarının onarımı işi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi VRF arıza ve onarım işi, 140 KVA jeneratörünün kapsamlı revizyonu işi, muhtelif jeneratörlerin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması ile arızalarının giderilmesi işi, Merkezi Santralına ait arızalı kartların ve konsol telefonlarının onarımı, balıkçılık su pompası ve sepic su pompası arızalarının giderilmesi işi, İletişim Fakültesi Ve Biyoteknoloji Laboratuvarı iklimlendirme sistemleri yenilenmesi işi, Afife Jale Tiyatro Salonu döner sahne onarımı ve Target Kafe WC onarım işi, Kuzey Çarşı elektrik panosuna tadilat yapılması işi, Üniversitemiz Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Dış İlişkiler Biriminde bulunan iklimlendirme sistemi (VRF) arızası onarım işi, Kültür Müdürlüğü çatı onarım ve tadilat işi, Makine Mühendisliği Laboratuvarı tadilat ve onarım işi, Veteriner Fakültesi Binasına ait trafonun değiştirilmesi işi, kampüs içerisindeki kazan daireleri ile ısıtma hatlarının bakım onarımının yapılması işi, TÖMER - YADİM ve Stüdyo binası tadilat işi, Ziraat Fakültesi ve Kuzey Çarşı muhtelif tadilat onarım yapılması işi, Güvenlik Müdürlüğü elektrik tesisatı arızalarının yapılması işi, Peyzaj Mimarlığı Toplantı Salonu ve Otomotiv Mühendisliği tadilat ve onarım işi, YADEM ile muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işi, Ana Isı Merkezi ve muhtelif yerlerdeki arızaların bakım onarımının yapılması işi, Tropikal Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tadilat ve onarım işi, Dış Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım işi, Üniversitemiz muhtelif yerlerinde bulunan içme suyu, kalorifer hattı, buhar hattı ve mekanik tesisat arızaları bakım onarım işi, Afife Jale Tiyatro Salonu kalorifer tesisatına onarım ve Eğitim Fakültesi sınıfına tadilat yapılması işi, projenin makine teçhizat alımı kapsamında ise muhtelif büro makine ve teçhizat alımı, muhtelif mobilya ve mefruşat alımı, Merkezi Kafeterya muhtelif mutfak ekipmanı alımı, muhtelif temizlik makine teçhizat alımı, Ford Yeni Transit kamyonet alımı, Skoda Superb araç alımı, asansörlü Forklift alımı, masaüstü bilgisayar alımı (14 Adet), projeksiyon cihazı (40 adet), yazıcı (6 adet), dizüstü bilgisayar (12 adet), anahtarlama cihazı (Switch) alımı, erişim noktası alımı, alıcı-verici (SFP Transceiver) alımı, LED/LCD monitör alımı, yol süpürme makinesi (1 Adet), laboratuvar tezgahı (17 adet), hasta simülasyon sistemi (9 Adet), yaka kamerası (16 Adet), muhtelif makine ve teçhizat yedek parça alımı gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %86'sı harcanmıştır. Eğitim kalitesinin artırılması, derslik alanlarının iyileştirilmesi amacıyla büro mefruşat, büro makineleri, bilgisayar ve yazılım alımları vb. ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca idari işlerde kullanılmak üzere 1 adet Ford Yeni Transit kamyonet ve 1 adet Skoda Superb otomobil alınmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2022H03-187403	Derslik ve Merkezi Birimler	-Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	Eğitim Binası Yapımı (20.000 m ²)	Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Temel Tıp Bilimleri yeni bina yapım işinin uygulama projeleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri kapsamında yapılmıştır.	Projeye ait ödenekten harcama yapılmamış olup, 2026 yılında projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.
Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor-	2025H05-259089	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	- Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat Alımı	Proje kapsamında Üniversitemiz Kapalı Yüzme Havuzu kazan dairesinin soğuk su akış kolektörü ve boiler tesisatı yenileme işi ve Ç.Ü. Lütfullah AKSUNGUR Kapalı Spor Salonu binasında tadilat ve onarım yapılması işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %24'ü harcanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de iyileşme sağlanmıştır.
Eğitim	2025H03-259083	Yayın Alımı	- Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2025 yılı içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 84 adet olup, yılı içerisinde 24 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin ödeme gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %99'u harcanmıştır. Yapılan alımlarla; 1.109.981 adet elektronik kitap, 68.077 elektronik dergi sayısına ulaşılmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Sağlık	2025100-248691	Muhtelif İşler	-Makine Teçhizat	Kesin Hesap, Makine-Teçhizat Alımı	Projenin bakım onarım işleri kapsamında Balcalı Hastanesi Yemekhane Mutfak ve Çocuk İnfüzyon Birimi yapım işi, Balcalı Hastanesi tıbbi izole güç sistemleri ve ameliyathane kontrol panelleri bakım onarım işi, Balcalı Hastanesi 4 adet asansör demontaj-montaj işi, projenin makine teçhizat alımı kapsamında ise Statifli Dijital Röntgen Cihazı (2 Adet), Tepsili Gazlı Konveksiyonlu Fırın (6 Adet), Tansiyon Holter Cihazı (2 Adet), Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (4 Adet), Elektrokoter Cihazı (2 Adet), Görüntüleme Sistemi (Endoskopi,Lap.Bronkoskopi) (1 Adet), USG Probu (1 Adet), Anestezi Cihazı (1 Adet), Ritim Holter Cihazı (1 Adet), Ritim Holter Kaydedici (9 Adet), Kırık Vida Çıkarma Seti (1 Adet), Konveks, Lineer ve Kardiyak Özellikli Kablosuz Prob (1 Adet), Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı TEE Probu (1 Adet), Video EEG Cihazı (1 Adet), Radyofrekans Cerrahi Sistemi (1 Adet), Perfüzyon Pompası (20 Adet), Hasta Isıtma Sistemi Cihazı (2 Adet), Vantilatör Cihazı (2 Adet), Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı (1 Adet), Dijital Mamografi Cihazı (1 Adet), Cerrahi Alet Seti Mal Alımı (13 Adet), Otoklav Cihazı Alımı (1 Adet), Bataryalı Cerrahi Revizyon Testere Seti (1 Adet), Monoplan Dijital Angiografi Sistemi (1 Adet), Fakomülsifikasyon Cihazı (1 Adet), Cerrahi Motor Seti (1 Adet), Difüzyonlu Solunum Fonksiyon Test Cihazı (1 Adet), Laparoskopik El Aletleri Seti (1 Adet), Fess Seti Mal Alımı (1 Adet), Eklem İçi Cerrahi Girişim ve Onarım Seti (1 Adet), Endoskopik Kafa Tabanı Hipofiz Seti (1 Adet), Endoskopik Görüntüleme Sistemi (1 Adet), Yüksek Çözünürlüklü Motilite ve Ürodinami Sistemi (1 Adet), Enjektörlü Perfüzör Cihazı (8 Adet), Otoskop Oftalmoskop Seti (1 Adet), Disfaji Terapi Cihazı (1 Adet), Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi İhtiyacı Olan Yer Tipi Soğutmalı Santrifüj Cihazı (1 Adet), Polikarbon Kapak (1.200 Adet) ve Yemekhane Muhtelif Makine Teçhizat ve Araç-Gereç Alımı (Sıcak Servis Ünitesi, Buzdolabı, Bulaşık Yıkama Makinesi, Patates Soyma Makinesi, Hamburger Şekillendirme Makinası, Kıyma Makinası, Yer Ocağı Doğalgaz Uyumlu, Tepsi Toplama Arabası (6 Adet), Sıcak Soğuk Araba Tepsisi (300 Adet), Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrama Makinesi (1 Adet), Büyük Boy Çırpma Teli (20 Adet), Takviyeli Kızartma Kevgiri (20 Adet), Takviyeli Süt Süzgeci (20 Adet), Sıcak Soğuk Yemek Dağıtım Arabası (2 Adet), Üfleme Ünitesi Hasta Isıtma Cihazı (1 Adet), Derin Dondurucu (1 Adet), Binicisiz (Arkadan İtmeli) Akülü Yer Temizleme Makinası (1 Adet), Sanayi Tipi Su Sebili Alımı (1 Adet), Sanayi Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi (4 Adet), Aspiratör Cihazı (5 Adet) vs.) alımları gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğinin %97'si harcanmış olup, sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla bina bakım onarım işleri ile tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve alet alımları tamamlanmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Sağlık	2023100-231525	Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme	-A Blok Deprem Güçlendirme -B Blok Deprem Güçlendirme - Yoğun Bakım Revizyonu 2. Etap	Büyük Onarım (63.400 m ²)	B Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında güçlendirme işi (fiziki gerçekleşme oranı %70) ve A Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında güçlendirme işi (fiziki gerçekleşme oranı %50) devam etmektedir. Yılı içerisinde Yoğun Bakım Revizyon 2. Etap projesi kapsamında iş yapılmamıştır.	Projeye ait yılı ödeneğinin %80'ini harcanmıştır. 2026 yılında projenin A ve B Blok deprem güçlendirme, Yoğun Bakım Revizyonu 2. Etap tadilat ve onarım işlerine devam edilecektir.
Sağlık	2025100-267071	Kardiyoloji Ek Hizmet Binası	,	Hastane İnşaatı (4.235 m ²)	Proje kapsamında yapılacak yapım işleri, Üniversitemiz ile başışçı arasında yapılan protokol çerçevesinde başışçı tarafından yapılacak olup, inşaatın bitiminde Üniversitemize hizmet binası olarak teslim edilecektir. 2025 yılında etüd proje işleri tamamlanarak yapım işine (fiziki gerçekleşme oranı %20) başlanmıştır.	6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde hasar alan hastanemizde kardiyoloji hastalarına verilen hizmetimiz sektöre uğramış ve 7/24 hizmet verebilecek, çağımızın yüksek teknoloji hizmetlerini sağlayabilecek yeni bir yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç hem mevcut hizmet alanlarımızdaki tadilatlarla hem de 4.235 m ² kapalı alana sahip olacak kardiyoloji ek hizmet binası ile giderilecek ve hizmet kapasitemiz artırılabilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal- Teknolojik Araştırma	2025K12-248444	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	,	Proje Desteği Sağlanması	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından proje kapsamında 426 adet proje desteklenmiş olup, Konfokal Mikroskop, Liyofilizatör ve Patch/Current Clamp Sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.	Yılı ödeneğinin %50'si özel hesaba aktarılmıştır. Proje kapsamında gerek verilen desteklerle gerekse de alınan makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi sağlanmış, makine-teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir.

1.4. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde 10 adet proje yürütülmüş olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 970.408.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 696.950.538 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 1.667.358.538 TL'ye yükselmiştir. Yatırım başlangıç ödeneğimiz bir önceki yıla göre %119,44, yılsonu toplam ödeneği ise % 107,11 artmıştır.

Üniversitemiz bütçesinden 2025 yılında yapılan toplam yatırım giderleri bir önceki yıla göre % 209,10 oranında artarak 1.260.184.655 TL olmuştur. Yatırım giderlerinde, başlangıç ödeneğine göre %129,84 oranında, yılsonu toplam ödeneğe göre %75,58 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı

Yıl	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yılsonu Toplam Ödenek (TL)	Toplam Harcama (TL)
2024	442.227.000	805.049.542	407.694.817
2025	970.408.000	1.667.358.538	1.260.184.655

2025 yılında eğitim sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 232.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 292.506.938 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için toplam 163.528.332 TL harcanmıştır.

2025 yılında sağlık sektöründe 3 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 700.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 1.298.983.600 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için toplam 1.058.696.323 TL harcanmıştır.


2025 yılında diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 37.908.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 75.868.000 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki proje için toplam 37.960.000 harcanmıştır.

Tablo 8 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	6	232.500.000	58.092.000	1.914.938	292.506.938	163.528.332
Sağlık	3*	700.000.000	590.386.000	8.597.600	1.298.983.600	1.058.696.323
Diğer Kamu Hizmetleri	1	37.908.000	37.960.000	0	75.868.000	37.960.000
TOPLAM	10	970.408.000	686.438.000	10.512.538	1.667.358.538	1.260.184.655

*1 adet proje bağışçı tarafından yapılarak hizmet binası olarak teslim edileceğinden tabloda ödenek bilgisine yer verilmemiştir.

Şekil 2 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda harcama dağılımı

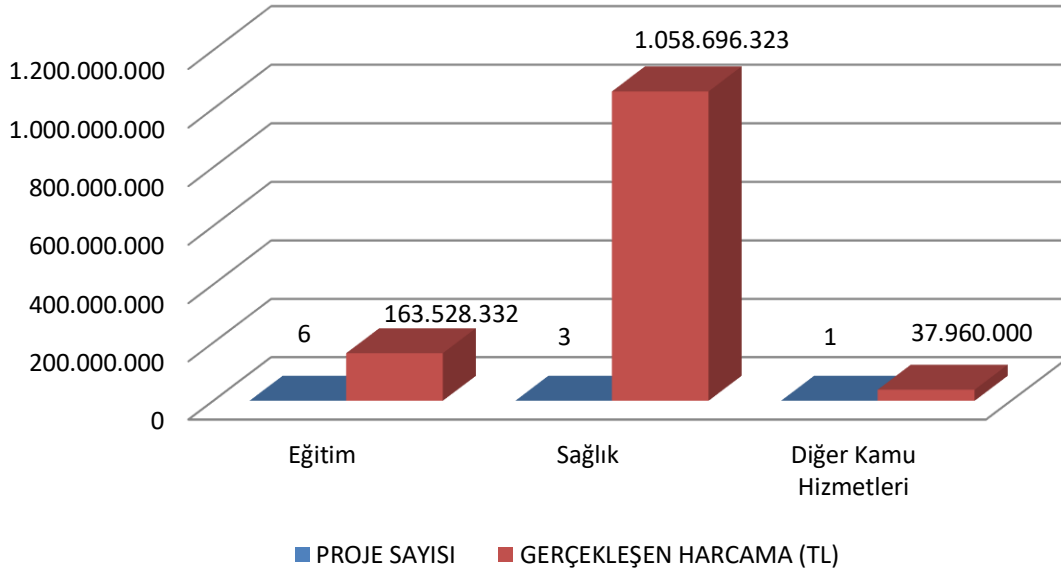

Tablo 9 2025 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	10.000.000		0	11.000.000	8.167.991
	Kampüs Altyapısı	37.000.000	0	20.000.000	0	17.000.000	9.492.938
	Yayın Alımı	13.000.000	1.000.000	0	0	14.000.000	13.861.050
	Muhtelif İşler	74.000.000	78.092.000	2.000.000	1.914.938	152.006.938	130.230.353
	Derslik ve Merkezi Birimler	100.000.000	0	9.000.000	0	91.000.000	0
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7.500.000	0	0	0	7.500.000	1.776.000
Sağlık	Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme	600.000.000	676.924.000	112.924.000	0	1.164.000.000	927.097.568
	Muhtelif İşler	100.000.000	43.323.747	16.937.747	8.597.600	134.983.600	131.598.754
	Kardiyoloji Ek Hizmet Binası	Proje başı başı tarafından yapılarak hizmet binası olarak teslim edileceğinden tabloda ödenek bilgisine yer verilmemiştir.					
Diğer Kamu Hizmetleri	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	37.908.000	37.960.000	0	0	75.868.000	37.960.000
TOPLAM		970.408.000	847.299.747	160.861.747	10.512.538	1.667.358.538	1.260.184.655

Tablo 10 2025 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı

PROGRAM / ALT PROGRAM / FAALİYET	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ ÖDENEK (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	37.908.000	75.868.000	37.960.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	37.908.000	75.868.000	37.960.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma	37.908.000	75.868.000	37.960.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	700.000.000	1.298.983.600	1.058.696.323
TEDAVİ HİZMETLERİ	700.000.000	1.298.983.600	1.058.696.323
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	700.000.000	1.298.983.600	1.058.696.323
YÜKSEKÖĞRETİM	198.462.000	233.704.000	122.199.941
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	198.462.000	233.704.000	122.199.941
OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği	0	1.092.000	707.027
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile	13.000.000	14.000.000	13.861.050
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	185.462.000	218.612.000	107.631.864
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	34.038.000	58.802.938	41.328.391
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	34.038.000	58.802.938	41.328.391
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	5.000.000	5.000.000	4.750.382
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	7.000.000	7.000.000	742.778
Genel Destek Hizmetleri	13.000.000	24.764.938	23.385.092
Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler	1.538.000	14.538.000	10.674.140
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	7.500.000	7.500.000	1.776.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	970.408.000	1.667.358.538	1.260.184.655

Tablo 11 2025 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı

EKONOMİK KODU	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ ÖDENEK (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)
06.01 Mamul Mal Alımları	168.908.000	241.226.285	197.902.301
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000	1.000.000	0
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	126.004.000	136.062.253	35.904.112
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	5.000.000	2.764.688
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	674.496.000	1.284.070.000	1.023.613.554
TOPLAM	970.408.000	1.667.358.538	1.260.184.655

2- 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

1. 2024H03-232971 Kampüs Altyapısı Projesi

Projenin amacı, Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs altyapısına kavuşması için gerekli projeleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) tamamlamaktır.

2025 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 17.000.000 TL revizeli yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2026 yılında tamamlanması planlanmıştır. Proje için 9.492.938 TL harcama yapılmıştır. Projeye ait ödeneğin %56'sı harcanmış olup, projenin 2025 yılı için planlanan işlerinin fiziki gerçekleşme oranı %100'dür.

Proje kapsamında su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi, Ziraat Fakültesi galeriler ve muhtelif kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ve kampüs içi muhtelif yerlere kamera tesisi yapılması işi, Balcalı kampüsü kuzey göl dalgiç pompa değişimi ve park bahçeler pompa dairesinde bulunan pompaların bakım onarım yapılması işi, muhtelif yerlerde kanalizasyon ve alt yapı yapılması işi, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı kalorifer tesisatı ve ana ısı merkezi içme suyu besleme hattı işi, muhtelif fakültelerde engelli erişebilirlik düzenlemesi yapılması işi, Rektörlük muhtelif mekanik tadilat onarım işi, kampüs muhtelif alt yapı işleri, Kuzey Çarşı mescit, İŞKUR binası, Nükleer Tıp binası yağmur suyu ve Yabancı Diller Yüksekokulu binası yağmur suyu tadilat onarım işi, Kültür ve Zooteknik Bölümü kanalizasyon hattı yenileme işi, Açık Amfi foseptik hattı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi altyapı işi tamamlanmıştır. Projeye 2026 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.

2. 2023I00-231525 Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme

06/02/2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle Üniversitemiz Hastanesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde Hastanemiz binaları orta hasarlı çıkmıştır.

Projenin amacı, deprem nedeniyle 63.400 m² alana sahip A ve B Blok binalarında oluşan hasarların onarım ve tadilatlarının gerçekleştirilerek ayakta ve yatakta verilen sağlık hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Ayrıca 2025 yılı sonunda yatırım programına alınan Yoğun Bakım Revizyonu 2. Etap alt projesi ile de yoğun bakım hizmetleri kapsamında hem tıbbi kalitenin hem de hasta güvenliğinin artırılması, mevcut parçalı yapıdan doğan sorunların ortadan kaldırılması, hasta bakım süreçlerinin hızlandırılması, personel verimliliğinin artırılması ve üniversite hastanesi niteliğine uygun modern bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

2025 yılında toplam 600.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde yapılan eklemeler ile revizeli toplam ödeneği 1.164.000.000 TL olmuştur. Projeye ait yılı ödeneğin %80'ı harcanmış olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı %60'dır.

B Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında güçlendirme işi (fiziki gerçekleşme oranı %70) ve A Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında güçlendirme işi (fiziki gerçekleşme oranı %50) devam etmektedir. Yılsonunda yatırım programına alınan Yoğun Bakım Revizyon 2. Etap projesi kapsamında Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Beyin Cerrahi, Çocuk Bölümü ve Nöroloji yoğun bakım üniteleri büyük onarım işine ait ihale işlemlerine 2026 yılında başlanacaktır.



A Blok Deprem Güçlendirme projesine ait görseller



B Blok Deprem Güçlendirme projesine ait görseller

3. 2022H03-187403 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin amacı, Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun, 20.000 m² kapalı alana sahip, Tıp Fakültesi Morfoloji hizmet binasının yapılması ve böylelikle öğrencilerimize daha modern ortamlarda eğitim ve öğretim sunumunun sağlanmasıdır.

2022 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 10.000.000 TL ödenek, 2023 yılında 60.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait 2022 ve 2023 yıllarında harcama yapılmamıştır. 2024 yılında toplam 50.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı

ödeneğin %5'i harcanmıştır. 2025 yılında toplam 100.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde yapılan çıkarmalar ile revizeli toplam ödeneği 91.000.000 TL' ye düşürülmüştür.

Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Temel Tıp Bilimleri yeni bina yapım işinin uygulama projeleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri kapsamında yapılmıştır. Projeye ait ödenekten harcama yapılmamış olup, 2026 yılında projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

4. 2025I00-267071 Kardiyoloji Ek Hizmet Binası

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde hasar alan hastanemizde kardiyoloji hastalarına verilen hizmetimiz sekteye uğramış ve 7/24 hizmet verebilecek, çağımızın yüksek teknolojlili hizmetlerini sağlayabilecek yeni bir yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu proje ile ortaya çıkan ihtiyacın hem mevcut hizmet alanlarımızdaki tadilatlarla hem de 4.235 m² kapalı alana sahip olacak kardiyoloji ek hizmet binası ile giderilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yapılacak yapım işleri, Üniversitemiz ile başışçı arasında yapılan protokol çerçevesinde başışçı tarafından yapılacak olup, inşaatın bitiminde Üniversitemize hizmet binası olarak teslim edilecektir. Proje tutarı 120.000.000 TL olup, 2025 yılında etüd proje işleri tamamlanarak yapım işine (fiziki gerçekleşme oranı %20) başlanmıştır.

4.235 m² kapalı alana sahip olacak kardiyoloji ek hizmet binasında, anjiyo bölümleri, muayene odaları, seminer salonu, ameliyathane ve koroner yoğun bakım 6 adet hasta yatağı, KVC yoğun bakım 4 adet hasta yatağı, izalasyon odası 1 adet hasta yatağı, Pre-op hazırlık bay 6 adet hasta yatağı, Pre-op hazırlık bayan 6 adet hasta yatağı bulunacak olup, proje yapım işlerinin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 12 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi

SIRA NO	PROJE SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1	Eğitim	2025H03-259085	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
2		2025H03-259083	Yayın Alımı	Ç.Ü. Kütüphane ve Dok. DB
3		2025H03-259087	Muhtelif İşler	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB / Ç.Ü. İdari ve Mali İşler DB
4		2025H05-259089	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
5	Sağlık	2025I00-248691	Muhtelif İşler	Ç.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
6	Diğer Kamu Hizmetleri	2025K12-248444	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

1. 2025H03-259085 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2025H03-259085					
Proje Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapılarının planlanarak etüd-proje hazırlıklarının yapılması.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Etüd-Proje					
Fiziki Hedefi:	Hizmet alımı					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.000			11.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		8.168			8.168	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üstyapıların yapım işlerine başlanabilmesi için etüd-proje hazırlıklarının tamamlanması beklenmektedir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacı doğrultusunda eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek, bunun neticesinde eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilerek eğitim kalitesinin artırılması, hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi açısından sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapının yapılması için gerekli olan etüd-proje ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında muhtelif hizmet binaları ve tesisleri için zorunlu enerji etüdü yaptırılması ve enerji yöneticiliği hizmet alım işi ve Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık ve Temel Tıp Bilimleri yeni binaları uygulama projelerinin revize yapılması ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. Ayrıca hizmet alımı yoluyla yaptırılan etüd-proje çalışmalarının zamanında teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmelerde yer alan cezai şartlar daha caydırıcı olmalıdır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2. 2025H03-259083 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2025H03-259083					
Proje Adı:	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Yayın koleksiyonunun geliştirilerek, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi:	1.000.000 elektronik kitap, 60.000 elektronik dergi					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		13.000			14.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		13.861			13.861	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim elemanlarına, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacına ilişkin belirlenen bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek hedefi doğrultusunda yapılan yayın alımları ile basılı ve elektronik kaynak sayısına önemli katkıda bulunmuştur. 2025 yılı için öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın hedefi 21,20 olup, yapılan yayın alımları ile öğrenci başına düşen yayın sayısı 29,31 olarak gerçekleşmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2025 yılı içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 84 adet olup, yılı içerisinde 24 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin ödeme gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında yapılan alımlarla; 1.109.981 adet elektronik kitap, 68.077 elektronik dergi sayısına ulaşılmıştır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi olumsuz yönde etkilemektedir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Döviz kurlarındaki yükselmeler nedeniyle kütüphanenin yayın alımları ödeneğinin Üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak artırılması.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. 2025I00-248691 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri					Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No:	2025I00-248691					
Proje Adı:	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat ve binek otomobil alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet).					
Fiziki Hedefi:	Makine-teçhizat ve taşıt alımları, bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		74.000			152.007	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		130.230			130.230	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinin muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat ve taşıt alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini artırılması beklenmektedir. Bu nedenle büro mefruşat, büro makinaları, taşıt, bilgisayar vs. alımları ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen fiziki kapasiteyi iyileştirmek, bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Eğitime yönelik olarak yapılan yatırımın çıktılarında olan sınıf iyileştirme sayısı; öğrenci memnuniyetinin artırılmasına yapılan katkı olarak görülmekte ve eğitimin kalitesinde bir artışa sebep olmaktadır. Yatırım ödenekleri; herkes için kapsayıcı, eşitlikçi ve adil eğitimin sağlanması ile yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi amacı doğrultusunda kullanılmıştır. Bu yönüyle proje, ulusal kalkınma hedefleri ve sektörel planlarla uyumlu bir yapı sergilemektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Projenin bakım onarım işleri kapsamında iş makinesi yedek parça ve bakım onarım işi, Güvenlik Binası yapım işi, Güvenlik Binası sistem odası elektrik tadilatı yapılması işi, süs havuzları tadilat işi, muhtelif birimlerde bulunan iklimlendirme sistemleri yıllık periyodik bakım işi, Dış İlişkiler Binası tadilat ve onarım işi, muhtelif asansörlerin bakım-onarım ve revizyonu işi, muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işi, Mithat Özsan Amfisi ve Rektörlük İdari Birimler binası tadilat ve onarım işi, Tufanbeyli MYO doğal gaz dönüşüm işi, Adana MYO B Blok tadilat ve onarım işi, Sağlık Bilimleri Fakültesi yangın hidroforu ve içme suyu bakım onarım işi, Veterinerlik binası tadilat ve onarım işi, Üniversitemiz kütüphane klima santraline bağlı ısıtma-soğutma gruplarının muhtelif arızalarının onarımı işi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi VRF arıza ve onarım işi, 140 kVA jeneratörünün kapsamlı revizyonu işi, muhtelif jeneratörlerin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması ile arızalarının giderilmesi işi, Merkezi Santralına ait arızalı kartların ve konsol telefonlarının onarımı, balıkçılık su pompası ve sepiçi su pompası arızalarının giderilmesi işi, İletişim Fakültesi Ve Biyoteknoloji Laboratuvarı iklimlendirme sistemleri yenilenmesi işi, Afife Jale Tiyatro Salonu döner sahne onarımı ve Target Kafe WC onarım işi, Kuzey Çarşı elektrik panosuna tadilat yapılması işi, Üniversitemiz Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Dış İlişkiler Biriminde bulunan iklimlendirme sistemi (VRF) arızası onarım işi, Kültür Müdürlüğü çatı onarım ve tadilat işi, Makine Mühendisliği Laboratuvarı tadilat ve onarım işi, Veteriner Fakültesi Binasına ait trafo onarım işi, kampüs içerisindeki kazan daireleri ile ısıtma hatlarının bakım onarımının yapılması işi, TÖMER - YADİM ve Stüdyo binası tadilat işi, Ziraat Fakültesi ve Kuzey Çarşı muhtelif tadilat onarım yapılması işi, Güvenlik Müdürlüğü elektrik tesisatı arızalarının yapılması işi, Peyzaj Mimarlığı Toplantı Salonu ve Otomotiv Mühendisliği tadilat ve onarım işi, YADEM ile muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işi, Ana Isı Merkezi ve muhtelif yerlerdeki arızaların bakım onarımının yapılması işi, Tropikal Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tadilat ve onarım işi, Dış Hekimliği Fakültesi tadilat ve onarım işi, Üniversitemiz muhtelif yerlerinde bulunan içme suyu, kalorifer hattı, buhar hattı ve mekanik tesisat arızaları bakım onarım işi, Afife Jale Tiyatro Salonu kalorifer tesisatına onarım ve Eğitim Fakültesi sınıfına tadilat yapılması işi, projenin makine teçhizat alımı kapsamında ise muhtelif büro makine ve teçhizat alımı, muhtelif mobilya ve mefruşat alımı, Merkezi Kafeterya muhtelif mutfak ekipmanı alımı, muhtelif temizlik makine teçhizat alımı, Ford Yeni Transit kamyonet alımı, Skoda Superb araç alımı, asansörlü Forklift alımı, masaüstü bilgisayar alımı (14 Adet), projeksiyon cihazı (40 adet), yazıcı (6 adet), dizüstü bilgisayar (12 adet), anahtarlar (Switch) alımı, erişim noktası alımı, alıcı-verici (SFP Transceiver) alımı, LED/LCD monitör alımı, yol süpürme makinesi (1 Adet), laboratuvar tezgahı (17 adet), hasta simülasyon sistemi (9 Adet), yaka kamerası (16 Adet), muhtelif makine ve teçhizat yedek parça alımı gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

4. 2025H05-259089 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2025H05-259089					
Proje Adı:	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor					
Proje Amacı:	Üniversitemiz spor tesislerinin gerekli bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek ve sunulan spor hizmetlerinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi:	Bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		7.500			7.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		1.776			1.776	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de iyileşme sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.2 Eğitimi Sürdürülebilir Bir Anlayışla Çağın Sürekli Gelişen Koşullarına Uyumlu İçerik, Yöntem ve Olanaklarla Donanmış Bir Hale Getirmek amacına ulaşmak için belirlenen öğrencilerimizin yerleşke içi yaşam kalitesini artırmak hedefine katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında Üniversitemiz Kapalı Yüzme Havuzu kazan dairesinin soğuk su akış kolektörü ve boiler tesisatı yenileme işi ve Ç.Ü. Lütfullah AKSUNGUR Kapalı Spor Salonu binasında tadilat ve onarım yapılması işi tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje kapsamında yapılacak işlerin zamanı, eğitim-öğretim dönemini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

5. 2025I00-248691 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2025I00-248691					
Proje Adı:	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Sağlık					
Proje Amacı:	Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletlerin alımını gerçekleştirmek sağlık hizmetinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
Fiziki Hedefi:	Makine-teçhizat alımı, Kesin Hesap.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		100.000			134.984	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		131.599			131.599	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler alınmış ve tıbbi cihaz ekipman ve donanım anlamında sağlığa ileri teknolojik imkanlarla hem sağlık hizmeti sunumunun kalitesinde hem de sağlık hizmeti sunulan kişi sayısında artış sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.3 Üretilen Bilgi ve Hizmetleri Erişilebilir, Nitelikli, Yenilenebilir ve Evrensel Değerler Kapsamında Toplum ve Kamu Yararına Sunmak amacına ulaşmak için belirlenen sağlık hizmetlerini etkili, erişilebilir, uluslararası ve kalite standartlarına uygun bir şekilde toplum yararına sunmak hedefine katkı sağlamaktadır. Ayrıca; -Sağlık hizmeti sunumu ile güncel tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi, teknolojik imkânların tedavi yöntemlerine uygulanması, tedavi yöntemlerinin ilgili sağlık ve tedavi edici programlarında aktif olarak kullanılması, sağlık hizmetinin ulaşılabilirlik ve tedavi yöntemlerinin sağlık sektöründe en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlanmıştır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Projenin bakım onarım işleri kapsamında Balcalı Hastanesi Yemekhane Mutfak ve Çocuk İnfüzyon Birimi yapımı işi, Balcalı Hastanesi tıbbi izole güç sistemleri ve ameliyathane kontrol panelleri bakım onarım işi, Balcalı Hastanesi 4 adet asansör demontaj-montaj işi, projenin makine teçhizat alımı kapsamında ise Statifli Dijital Röntgen Cihazı (2 Adet), Tepsili Gazlı Konveksiyonlu Fırın (6 Adet), Tansiyon Holter Cihazı (2 Adet), Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (4 Adet), Elektrokoter Cihazı (2 Adet), Görüntüleme Sistemi (Endoskopi,Lap.Bronkoskopi) (1 Adet), USG Probu (1 Adet), Anestezi Cihazı (1 Adet), Ritim Holter Cihazı (1 Adet), Ritim Holter Kaydedici (9 Adet), Kırık Vida Çıkarma Seti (1 Adet), Konveks, Lineer ve Kardiyak Özellikli Kablosuz Prob (1 Adet), Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı TEE Probu (1 Adet), Video EEG Cihazı (1 Adet), Radyofrekans Cerrahi Sistemi (1 Adet), Perfüzyon Pompası (20 Adet), Hasta Isıtma Sistemi Cihazı (2 Adet), Vantilatör Cihazı (2 Adet), Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı (1 Adet), Dijital Mamografi Cihazı (1 Adet), Cerrahi Alet Seti Mal Alımı (13 Adet), Otoklav Cihazı Alımı (1 Adet), Bataryalı Cerrahi Revizyon Testere Seti (1 Adet), Monoplan Dijital Angiografi Sistemi (1 Adet), Fakoemülsifikasyon Cihazı (1 Adet), Cerrahi Motor Seti (1 Adet), Difüzyonlu Solunum Fonksiyon Test Cihazı (1 Adet), Laparoskopik El Aletleri Seti (1 Adet), Fess Seti Mal Alımı (1 Adet), Eklem İçi Cerrahi Girişim ve Onarım Seti (1 Adet), Endoskopik Kafa Tabanı Hipofiz Seti (1 Adet), Endoskopik Görüntüleme Sistemi (1 Adet), Yüksek Çözünürlüklü Motilite ve Ürodinami Sistemi (1 Adet), Enjektörlü Perfüzör Cihazı (8 Adet), Otoskop Oftalmoskop Seti (1 Adet), Disfaji Terapi Cihazı (1 Adet), Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi İhtiyacı Olan Yer Tipi Soğutmalı Santrifüj Cihazı (1 Adet), Polikarbon Kapak (1.200 Adet) ve Yemekhane Muhtelif Makine Teçhizat ve Araç-Gereç Alımı (Sıcak Servis Ünitesi, Buzdolabı, Bulaşık Yıkama Makinesi, Patates Soyma Makinesi, Hamburger Şekillendirme Makinası, Kıyma Makinası, Yer Ocağı Doğalgaz Uyumlu, Tepsi Toplama Arabası (6 Adet), Sıcak Soğuk Araba Tepsisi (300 Adet), Çok Fonksiyonlu Sebze Doğrama Makinesi (1 Adet), Büyük Boy Çırpma Teli (20 Adet), Takviyeli Kızartma Kevgiri (20 Adet), Takviyeli Süt Süzgeci (20 Adet), Sıcak Soğuk Yemek Dağıtım Arabası (2 Adet), Üfleme Üniteli Hasta Isıtma Cihazı (1 Adet), Derin Dondurucu (1 Adet), Binicisiz (Arkadan İtmeli) Akülü Yer Temizleme Makinası (1 Adet), Sanayi Tipi Su Sebili Alımı (1 Adet), Sanayi Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi (4 Adet), Aspiratör Cihazı (5 Adet) vs.) alımları gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir. Alınması planlanan tıbbi cihazların kurulum ve hacmine yönelik bina alt yapısı önceden hazır hale getirilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

6. 2025K12-248444 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2025K12-248444					
Proje Adı:	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Alt sektör:	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal					
Proje Amacı:	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerine destek vermek.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Proje Desteği					
Fiziki Hedefi:	Makine-Teçhizat alımı, Mal alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2025-31.12.2025					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		37.908			75.868	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2025)		37.960			37.960	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında gerek verilen desteklerle gerekse de alınan makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi sağlanmış, makine-teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.1 Araştırma-Geliştirme ve Girişimcilik Kapasitesini Artırmak amacına ulaşmak için belirlenen iç ve dış kaynaklı proje sayısı ile yayın sayısını her yıl düzenli olarak artırmak hedefine katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından proje kapsamında 426 adet proje desteklenmiş olup, Konfokal Mikroskop, Liyofilizatör ve Patch/Current Clamp Sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Makine-teçhizat alımları yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmalıdır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2025 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle idaremizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşulların ve gerekliliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Ek 1 2025 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Kurum/Birim Adı : Çukurova Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim*	6		937.507			25.000			232.500			292.507			163.528
Sağlık**	3		2.230.506			188.412			700.000			1.298.984			1.058.696
Diğer Kamu Hizmetleri	1		75.868			0			37.908			75.868			37.960
-İktisadi															
-Sosyal	1		75.868			0			37.908			75.868			37.960
TOPLAM	10		3.243.881			213.412			970.408			1.667.359			1.260.184

(*) Sektör içerisindeki Muhtelif İşler projesine 1.914.938 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır.

(**) Sektör içerisindeki Muhtelif İşler projesine 8.597.600 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır. Kardiyoloji Ek Hizmet Binası projesi bağışçı tarafından yapılarak hizmet binası olarak teslim edileceğinden tabloda ödenek bilgisine yer verilmemiştir.
