

2008

# 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği





EK: 2

## 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlama sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Yatırım karakterli ileri araştırma projeleri ile araştırma alt yapı geliştirme projelerinin, planlanarak desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi, desteklenmesi DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) plan ve programlarına uygun ve de eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi, proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entelektüel birikim ve gelişimi, ahlaki sorumlulukla özdeşleştirmek, sosyal sorumluluk ögesini kültürel ve ekonomik iyileştirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi'nin vizyonu bilginin keşfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. Yapısal dönüşüm sürecini geçmişten beri yüreklilikle yaşama ve yaşatma geleneğine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  
Rektör

## 2. Genel Değerlendirme

### • **Kuruluşun Vizyonu:**

Artan küreselleşmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barışına katkıda bulunmak.

Yetişmiş insan gücü talebi ve uluslararası ilişkiler karşısında daha gelişmiş AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliştirerek ülkemizin ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden biri olmak.

### • **Kuruluşun Misyonu:**

İletişim teknolojileri ile donanmış, AR-GE'yi güçlendiren, paydaşlarla işbirliği yapan ve alternatif öğretim tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak.

Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleştirel düşüncenin gereksinimlerini karşılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak.

### • **Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:**

- 1- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecek,
- 2- Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirilecek,
- 3- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek,
- 4- Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak,
- 5- Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir.
- 6- Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüştür.
- 7- Araştırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır.

- **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri

2) Kira Gelirleri

3) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

4) Yaz Okulu Gelirleri

5) İkinci Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) SAN-TEZ

c) AB

d) Şartlı Bağışlar

dan oluşmaktadır.

- **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Yasal Dayanakları:**

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “...Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılattan %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.




ÜNİVERSİTEMİZ 2008 YILI ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU

2008 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Alınan Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı(*)	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Öz Gelir Farkı
186.638.000	12.324.027	198.962.027	179.036.275	19.717.589	---	2.933.078

(\*)Bloke Dâhil

ÜNİVERSİTEMİZ 2008 YILI Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları Ve Oranları

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	13.048.000	13.343.401	12.199.304	%91
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000	326.659	237.800	%72
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	---	---	---	---
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.010.000	11.246.866	11.213.980	%99
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.775.000	4.297.796	3.943.374	%91
GENEL TOPLAM		23.083.000	29.214.722	27.594.459	%94

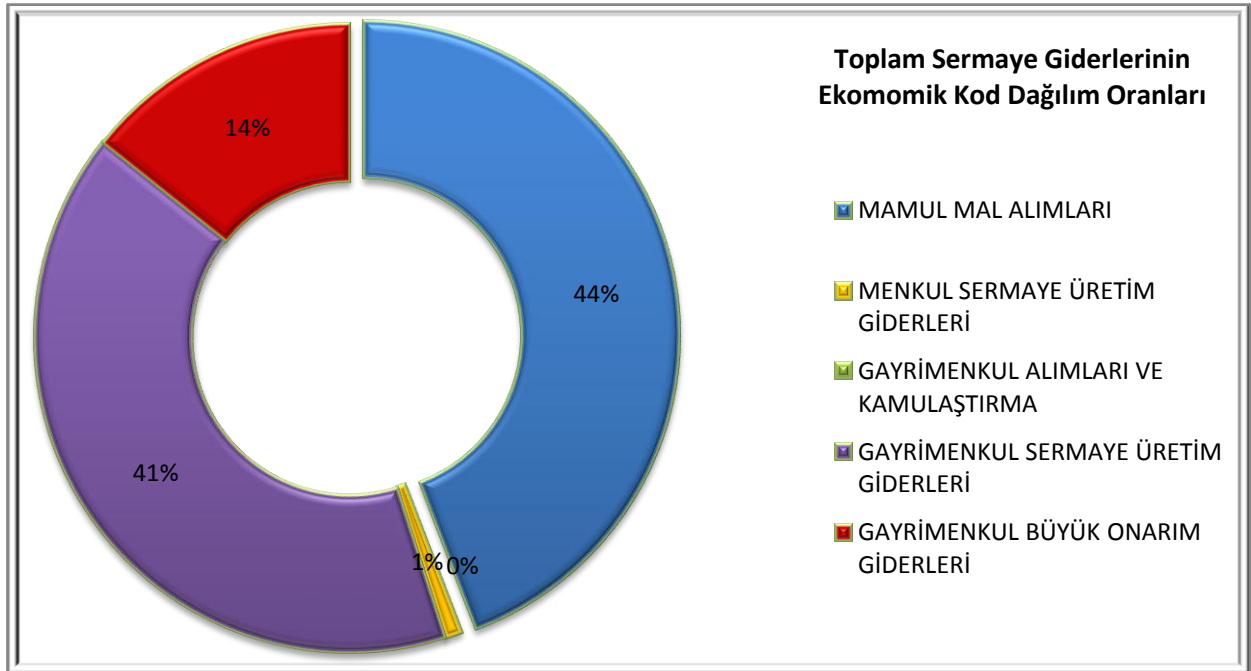

- **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu eğitim vermekte olup, ayrıca 3 lisansüstü eğitim veren Enstitü ve 1 Devlet Konservatuvarı ile birlikte, akademik birim sayısı 26'dır.

Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 161 lisansüstü, 12 Fakültede 76 lisans, 3 Yüksekokulda 7 lisans ve 7 Meslek Yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir. Bunlara ek olarak 2 lisans programı olan Devlet Konservatuvarı ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine İngilizce eğitimi veren bir Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADİM) bulunmaktadır.

Üniversitemiz ~23.000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. ~750.000 m2 kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır. 2007-2008 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 32.319 öğrenci vardır. Üniversitemizde 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 1885 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 398'i profesör, 166'sı doçent, 278'i yardımcı doçent, 131'i okutman 70'i uzman, 178'si öğretim görevlisi ve 664'ü araştırma görevlisidir.

Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

- **2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Merkezi Derslik Projesi kapsamında inşası sürdürülen 3. blok inşaatı işi 2006 Yılı Ekim ayında bitirilerek hizmete açılmıştır. Adana Sağlık Yüksekokulunun inşaatı tamamlanmış, hizmete açılmıştır. Ç.Ü. Mithat Özsan Amfi I ve II Nolu Derslik ile Müh. Fak. İnş. Bölümü Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Süt Ürünleri Üretim Tesisleri Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Zootečni Bölümlerinin Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Y4,Y5,Y6 Bloklarından K2 Bloğunun İklimlendirilmesi İle Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Radyasyon Onkoloji Binası Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Mültidisiplin ve Parazitoloji Laboratuvarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Yanık ve Yara Bakım Ünitesi Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Kampus İçi Havai Hatların Yeraltına Alınması, Ç.Ü. Karataş Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Spor Tesisleri Yapılması, Ç.Ü. Kozan MYO Spor Alanları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Binaları İle Kampus İçi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Kampus İçi Muhtelif Yol, Otopark ve Çevre Düzenlemesi, Ç.Ü. Kampusu Muhtelif Trafo Binalarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fak. Ve Balcalı Hastanesi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fak. İle Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği Çeşitli Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Merkezi Kütüphane, Öğrenci ve İdari Mali İşler Dairesi WC'leri İle Zir. Fak. Bitki Koruma Laboratuvarı Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Göl Pompaları Boru Hattının Kısmi Değişimi İle Karaisalı MYO Depo, Nizamiye Binası, Su Deposu Yapılması, Ç.Ü. İletişim Fakültesi Binası İnşaatı, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryum Laboratuvarı, Ç.Ü. Rektörlük Göl Sulama Pompaları Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İle Kampus İçi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Rektörlüğü Biyoteknoloji Laboratuvarı İkmal İnşaatı, Ç.Ü. Atletizm Pisti Açık Türbin Yapılması İle Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tadilat Onarım, Ç.Ü. Ana Isı Merkezi İle Ziraat Fakültesi Muhtelif Bölümleri Arası Galeri Tesisatı ve Muhtelif Su Depolarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Acil Bölümü Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projelerinin ve İhale Dokümanlarının



Hazırlanması Hizmet Alım, Ç.Ü.Yumurtalı MYO Binası Statik (B.A), Mimari Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alım, Ç.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Uygulama, Sistem Detay Projeleri, Mekanik, Elk.-Elektronik Tesisat Projeleri ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması işlerinin ihaleleri yapılmıştır.

Yine aynı proje kapsamında Adana Sağlık Yüksekokulu 2007 yılı sonunda bitirilip hizmete açılmıştır.

Ayrıca, Adana İli ve bölgenin önemli bir eksiğinin giderilmesi amacıyla projeleri tamamlanan 20.000 m2 kapalı alana sahip Çukurova Bölgesi Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının proje ve inşaat ihalesi yapıp, inşaatına başlanmıştır. 2009 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmiştir.

Rektörlük Büyük Onarım, Sağlık Birimleri Büyük Onarım ve Altyapı ödenekleri ile yaşlanma sürecine girmiş bulunan Üniversitemiz binalarından Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müh. Mim. Fakültesi, Adana MYO, Ziraat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıştır

#### • 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları:

##### - Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2008 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2008 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır.

##### - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi,

Bilimsel Araştırmaları Projelerine bütçe olanakları da göz önüne alınarak öncelik sıralamasına göre destek sağlanmaktadır. Ancak, nitelikli ama yetersiz personelimize, ihale mevzuatının belli dönemlerde değişikliğe uğraması, bütçemiz olanakları dahilinde belli bir gelirimiz olması, bu bütçenin 3 er aylık dönemler halinde Bilimsel Araştırmaları Projeleri bütçesine aktarılması, Özellikle Belli İstekliler ve Pazarlık Usulü yapılan (4734 sayılı kanununun 19. ve 20. maddesi), alımlarda gecikmeli olarak yapılabilmektedir.

Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.



Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.

Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inşaat maliyetleri artmakta ve iş bitim süreleri uzamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Yapım işleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. İmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içerisinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım işinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir.

Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3'er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.

Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.





### **3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları:**

#### **A- DPT İleri Araştırma Projeleri:**

##### **1. 2003K120320 Tercihli Yemlemenin Farklı Çağda, Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarındaki Sığı Projesi:**

Proje 2003 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılı ödeneği 30.000 TL dir. Tamamı harcanmıştır. Vakum Paketleme Makinesi, Fiber analizörü kontrol ünitesi ve çeşitli laboratuvar malzemesi alınarak proje 2008 yılında tamamlanmıştır. Sonuç raporu DPT gönderilmiştir.

Toplam Ödeneği 30.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 30.000 TL

##### **2. 2007K120690 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi:**

Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılı ödeneği 3.000.000 TL dir. 300 kVA kesintisiz güç kaynağı (UPS), 500 kVA sabit tip diesel elektrojen (jenaratör) grubu, Biyolojik emniyet sistemi, Buz Makinesi, Çalkalamalı Su Banyosu, Çalkalayıcı, Çok kanallı mikro pipet seti, çoklu thermal cycler, Deepfreezer (Dik tip), Derin Dondurucu, Derin Dondurucu (Tek kapılı), Dikey Hava Akımlı Kabin Class II (120 cm), etiketli primer sentezi 10 nmol, Genetik Analizör, Hassas Terazi, ICP Emisyon Spektrometresi ve mikrodalga parçalama ünitesi, İnkübatör Çalkalayıcı, Jel Görüntüleme Sistemi, laboratuvar yıkayıcı ve dezenfektörü, Laminar akışlı kabin sistemi, Liyofilizatör, Masa Üstü Santrifüj, Nükleik asit ve protein izolasyon cihazı, Real Time PCR Cihazı, Otomatik Örnek hazırlama cihazı, Otoklav, Saf Su Sistemi (Komple Set, 70 Lt/saat), Sıvı Azot Tankı, Soğutmalı Santrifüj v.b. cihaz ve laboratuvar malzemesi alınarak 2008 Mali yılı bütçesi olan 3.137.000 TL harcanmıştır.

Toplam Ödeneği 3.000.000 TL  
Eklenen Ödenek 641.000 TL  
Düşülen Ödenek 500.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 3.137.000 TL

#### **B- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2008K120540 5.800.000.- TL:**

##### **1. 2007K120670 Çukurova Üniversitesi Birimleri Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Altyapısının İyileştirilmesi Projesi**

Toplam Ödeneği 3.000.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 2.181.000 TL

- a) Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (495 Adet)
- b) Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1134 Adet)

Bu proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, Üniversitemiz birimlerine ait bireysel, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık projelerine ve birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmıştır.



**2. 2005K120360-1(240) Anesteziyoloji Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi**

Prof.Dr.Geylan IŞIK  
Toplam Ödeneği 500.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 000.000 TL

Proje 2005 yılında kabul edilmiş olup proje ihtiyacı önceki yıllardan alındığı için 2008 yılında bu projeden harcama yapılmamıştır ve proje tamamlanmıştır.

**3. 2006K120540-11 Fakültemiz Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini ve Radyoaktivite Araştırmaları İçin Radyasyon Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvarı Kurulması İçin Alt Yapı Projesi**

Prof.Dr.Sadullah SAKALLIOĞLU  
Toplam Ödeneği 500.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 64.000 TL

Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında Üniversal Laboratuar Arabirim Sistemi, Labview 8,5 grafik programla dili, çeşitli laboratuar malzemeleri ve kimyasallar alınarak 64.000 TL harcanarak proje tamamlanmıştır.

**4. 2006K120540-13 Kardiovasküler Hastalarda 64-Kesit Multislice BT Cihazı ile Spiral BT Cihazının Karşılaştırılması Projesi**

Prof.Dr.Erol AKSUNGUR  
Toplam Ödeneği 2.348.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 0.000.000 TL

Proje 2006 yılında kabul edilmiş olup, önceki yıllardan 2-Kesit Multislice Bilgisayarlı Tomografi ve 4 Adet çok amaçlı tek tüp tek masa röntgen cihazı alınmış 2008 yılında projeye ilgili hiç harcama yapılmamış ve bu şekilde tamamlanmıştır.

**5. 2007K120670-14 Radyodiagnostik Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi**

Prof.Dr.Erol AKSUNGUR  
Toplam Ödeneği 1.500.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 1.470.000 TL

Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında manyetik rezonans görüntüleme sistemi alınmış ve proje tamamlanmıştır.

**6. 2007K120670-4 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Traktör Altyapı Projesi**

Prof.Dr.Ayzin KÜDEN  
Toplam Ödeneği 89.690 TL  
2008 Yılı Harcaması 70.200 TL



Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup 2008 yılında traktör alımı yapılmış ve proje tamamlanmıştır.

**7. 2007K120670-18 Su Ürünleri Fakültesi, Üreme ve Beslenme Fizyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı Altyapı Geliştirme Projesi**

Prof.Dr.Metin KUMLU  
Toplam Ödeneği 318.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 291.000 TL

Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında Otomatik Azot/Protein tayin cihazı, trinoküler araştırma mikroskobu, Masa üstü soğutmalı santrifüj, Mikrodalga Numune yakma sistemi Kap seti, Mikrodalga Fırın, Ultra lamba Modülü ve oyuk katot Lambaları, Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometre, Kül Fırını, Rotary Evapatör, Gaz Kromatografisi Cihazı, mikrodalga numune yakma sistemi, Nomarski (DIC) Ataşmanı ve çizim tüpü, 1.Sınıf çam kerestesi (Karaçam; 16 m3), Polyester, Elyaf, Tiner, Hızlandırıcı, Sertleştirici, Eliza Plate Okuyucu ve Yıkayıcı, Mil, Şaft, Flanş, Dümen mili ve diğer aksamaları, Ana boru, Yağdanlık, Egzoz sistemi, sintine ve deniz suyu giriş ve çıkışları, Gölgelek, Depo, Pervane, Irgat, Kızak, Vinç Sistemi, Tekne Kamarası Döşeme Tahtası, Tekne Motoru Yerleştirme, Ekosounder, Telsiz, Hidrolik Dümen Sistemi malzemeler alınarak proje tamamlanmıştır.

**8. 2007K120670-19 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Çayır Biçme, Tırmık Makinesi ve Römork Altyapı Projesi**

Prof.Dr.Ayzin KÜDEN  
Toplam Ödeneği 34.890 TL  
2008 Yılı Harcaması 34.890 TL

Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında Römork, Çayır biçme makinesi, Tırmık (Ayarlanabilir Çim Tırmığı) alınarak proje tamamlanmıştır.

**9. 2007K120670-20 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağının Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi**

Prof.Dr.Semih TANGOLAR  
Toplam Ödeneği 75.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 40.000 TL

Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında Budama Makası, kuş tülü beyaz mono filament, motorlu tırpan, Fidan(1103 P anacı) dikimi, herek çakılması ve aşılması, Asma sıralarında payanda takviyesi yapılması ve tellerin gerilmesi (40 dekar) harcamaları yapılmış, 2009 yılına 35.000 TL bütçesi kalmıştır.

**10. 2007K120670-1 Kök Hücre Kriyoprezervasyon Ünitesi Altyapı Geliştirme-Güncelleştirme Projesi**

Prof.Dr.Birol GÜVENÇ



Proje 2007 yılında kabul edilmiş olup, 2008 yılında harcama yapılmamıştır ve proje tamamlanmıştır.

**11. 2008K120540-1 Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu Projesi**

Prof.Dr.Bilgin YÜKSEL  
Toplam Ödeneği 550.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 000.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, hiç harcama yapılmamıştır. Proje 2009 yılında devam etmektedir.

**12. 2008K120540-2 Mycobacterium Tuberculosis Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvarı Alt Yapı Projesi**

Prof.Dr. Fatih KÖKSAL  
Toplam Ödeneği 75.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 75.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş ve projeden Otoklav, Güç Kaynağı, Elektroforez, pH Metre, Mikrospin Cihazı, Mickle tissue disintegrator, Yatay jel elektroforez tankı, Kimyasal Maddeler, Otomatik Pipet, Otomatik mikropipet, Mikropipet askısı, Optik mini me farland ölçer, Mobilya dolap, laboratuvar masası, Ofis masası, Ofis koltuğu, Amortisörlü döner sandalye, Seminer salonu dolabı, Sekreter Odası Dolabı, Üroloji Dolabı, Seminer Salonu Masası, Misafir Koltuğu, Manyetik Kapı Laboratuvarı, Buzdolabı alınarak proje tamamlanmıştır.

**13. 2008K120540-3 Diyabetik Maküler Ödem Tanı ve Tedavisinde Optik Koherens Tomografi (OCT)**

Prof.Dr.Merih Banu SOYLU  
Toplam Ödeneği 150.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 140.400 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, projeden Spectral Optik Koherens Tomografi Cihazı Alınarak proje tamamlanmıştır.

**14. 2008K120540-4 Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Tanı ve Tedavi Birimi Video-EEG Monitorizasyon Sistemi Altyapı Projesi**

Prof.Dr.Hacer BOZDEMİR  
Toplam Ödeneği 75.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 65.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, Video-EEG monitorizasyon cihazı alınarak proje tamamlanmıştır.

**15. 2008K120540-5 Nöroloji Anabilim Dalı EMG-EP ve Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı Altyapı Geliştirme Projesi**



Prof.Dr.Yakup SARICA  
Toplam Ödeneği 50.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 36.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, EMG-EP cihazı alınarak proje tamamlanmıştır.

**16. 2008K120540-6 Parazitoloji Anabilim Dalı Rutin ve Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Destekleme Projesi**

Prof.Dr.İ.Soner KOLDAŞ  
Toplam Ödeneği 143.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 110.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, Derin Dondurucu, Otoklav, Hassas Teraziler, Dijital Görüntüleme Cihazı, trinoküler araştırma mikroskobu, Binoküler Mikroskop, Buzdolabı (No Frost) alınarak proje tamamlanmıştır.

**17. 2008K120540-7 İnteroperatif Kullanım İçin Standart C-Kollu Floreskopi Cihazı Alt Yapısını Güçlendirme Projesi**

Prof.Dr. Faruk İLDAN  
Toplam Ödeneği 290.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 290.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, C-Kollu floreskopi cihazı alınarak proje tamamlanmıştır.

**18. 2008K120540-8 Teşhis ve Tedavi Amaçlı Olarak, Diş Hekimliği Radyolojisinin Alt Yapısını Güçlendirme Projesi Konik Işınlı Dental Volumetrik Tomografi Cihazı**

Yrd.Doç.Dr. Haluk ÖZTUNÇ  
Toplam Ödeneği 325.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 325.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup, Kronik Işınlı Dental Volumetrik Tomografi Cihazı alınarak proje tamamlanmıştır.

**19. 2008K120540-9 Pozantı-Karsanlı (Aladağ) Kromit Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Yönden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi**

Prof.Dr. Mesut ANIL  
Toplam Ödeneği 118.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 000.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup hiç harcama yapılmamış ve harcamaları 2009 yılına devam etmektedir.

**20. 2008K120540-11 Çukurova Bölgesinde Turunçgillere Alternatif Meyvecilik Geliştirme Altyapı Projesi**

Prof.Dr. Ayzin KÜDEN  
Toplam Ödeneği 189.000 TL  
2008 Yılı Harcaması 000.000 TL

Proje 2008 yılında kabul edilmiş olup hiç harcama yapılmamış ve harcamaları 2009 yılında devam etmektedir.

### **C- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:**

#### **1. 2008H031620 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleştirme seviyesi Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde, Çukurova Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Planı ile Statik Projesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi, Yumurtalık M.Y.O. Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin ve İhale Dokümanlarının hazırlanması işi yapılmıştır.

2008 yılı ödeneği 150.000,00.- TL olup, tamamı harcanmıştır.  
Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100  
Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

#### **2. 1977H030010 Kampüs Altyapıları**

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleştirme seviyesi Üniversitemiz yatırım programında devam etmekte olan Kampüs Altyapısı Projesi işimizde, 1 Adet 1000 KW lık Trafo, 1200 m. çevre ihata duvarı, 3850 m2 kaldırım ve yol çalışması, sulama pompaları tamiri, kısmen çevre aydınlatma, galeri içi eşanjör ve tesisat yenilenmesi,

2008 yılı ödeneği 400.000,00.-TL dir.  
Eklene Ödenek 1.528.000,00.-TL  
Toplam Ödenek 1.928.000,00.-TL  
Harcama 1.900.000,00.-TL  
Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100  
Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100

#### **3. 2008H031630 Büyük Onarım**

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleştirme seviyesi Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi işimizde, çeşitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı.

Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapmak gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri yapılmıştır.

2008 yılı ödeneği 400.000,00.-TL dir.  
ÖSHB Ödeneği 300.000,00.-TL  
Özel Gelir 300.000,00.-TL  
Eklene Ödenek 600.000,00.-TL  
Toplam Ödenek 1.600.000,00.-TL  
Harcama 1.395.000,00.-TL  
Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 88  
Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100



#### 4. 2002H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, kampüs içinde ve çevre Yüksekokulu kampüslerinde yeni spor alanları yapıldı, mevcut spor alanlarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi yapıldı.

2008 yılı ödeneği	100.000,00.-TL dir.
ÖSHB Ödeneği	600.000,00.-TL
Toplam Ödenek	700.000,00.-TL
Harcama	677.000,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı:	%97
Fiziki Gerçekleşme Oranı:	%100

#### 5. 1998H030440 Merkezi Derslik İd. Blok + Kongre Merkezi

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi işimizde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Adana sağlık Meslek Yüksek Okulu 2007 yılı içinde tamamlanıp, hizmete açıldı. Yapımı 2009 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen, Kongre Merkezinin ödeneği özel gelirlerden karşılanmaktadır.

2008 yılı ödeneği	5.910.000,00.-TL dir.
Eklenen Ödenek	2.700.000,00.-TL
Toplam Ödeneği	8.610.000,00.-TL
Harcama	8.610.000,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı:	% 100
Fiziki Gerçekleşme Oranı:	% 75

#### 6. 2008I000310 Hastane Büyük Onarım

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi, mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapmak gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri yapılmıştır.

2008 yılı ödeneği	1.775.000,00.-TL dir.
Eklenen Ödenek	800.000,00.-TL
Toplam Ödenek	2.575.000,00.-TL
Harcama	2.549.000,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı:	% 99
Fiziki Gerçekleşme Oranı:	%100

#### 7. 2008I000310 Hastane Büyük Onarım

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapmak gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri yapılmıştır.

2008 yılı ödeneği	100.000,00.-TL
Harcama	88.000,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı:	%88
Fiziki Gerçekleşme Oranı:	%100

**D- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:**

1. **2008H031650 Yayın Alım Projesi:** Projenin 2008 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi: 2008 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 1.200.000,00 TL' dir. Yıl içinde 915.836,00 TL' si harcanmıştır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

ALIMIN ADI	MİKTARI	TUTAR (TL)
<b>Yurtiçi veYurt Dışı Kitap Alımı:</b>	3738	282.005,00
<b>Yurtdışı Süreli Yayın Alımı:</b>	210	311.723,00
<b>Veritabanı Aboneliği:</b>	36	322.108,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3984</b>	<b>915.836,00</b>

**2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 35000'e yükseltmek
Basılı Dergi Koleksiyonu	Basılı dergi aboneliğini 220'e indirmek
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 5000 adet kitap satın almak
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloqlama	3000 adet kitabın kataloglanması
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloqlama	5000 adet kitabın kataloglanması
Geriye Dönük Kataloqlama	3000 adet bibliyografik kaydın sisteme aktarılması





### 2008 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 35.000'e yükselmiştir.
Basılı Dergi Koleksiyonu	Basılı dergi aboneliği 308'e inmiştir.
Kitap Koleksiyonu	6.377 adet kitap koleksiyona eklenmiştir.
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloqlama	2.500 adet kitap kataloglanmıştır.
E-kitap Koleksiyonununun Geliştirilmesi	25.160 elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir.
Kataloqlama	5.731 adet kitap kataloglanmıştır.
Geriye Dönük Kataloqlama	3.500 bibliyografik kayıt sisteme aktarılmıştır

### 2008 Yılı ULAKBİM EKUAL Veritabanları

No	Veritabanı Adı
1	BMJ Clinical Evidence
2	BMJ Journals Online
3	CAB Abstracts
4*	EbscoHost - Academic Search Complete
5*	EbscoHost - Business Source Complete
6	Engineering Village 2
7	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
8	ISI Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
9	Journal Citation Reports (JCR)
10*	OVID Journals
11	Science Direct
12*	Taylor & Francis Online Journals (Informa)

\* 2008 yılı yeni abonelik



**2008 Yılı Veritabanları (ANKOS, Firma)**

No	Veritabanı Adı	Fiyatı (USD)	Nereden Alındığı
1	ACS (American Chemical Society)	10.610\$	ANKOS
2	AMS+Article Linker+Central Search	15.745\$	ANKOS
3	AIP (American Institute of Physics)	11.997\$	ANKOS
4	Blackwell Synergy	24.572\$	ANKOS
5	Cambridge Journals Online	4.336\$	ANKOS
6	CINAHL With Fulltext	5.751\$	FİRMA (Ebsco)
7	EBRARY	14.396\$	ANKOS
8*	Ebrary Online Sheet Music	1.925\$	FİRMA (ProQuest)
9*	EconLit with Fulltext	6.255\$	FİRMA (Ebsco)
10	Engnetbase	6.690\$	FİRMA (Info Tech)
11	Foodnetbase	4.350\$	FİRMA (Info Tech)
12	Institute of Physics	7.089\$	ANKOS
13	JSTOR	5.175\$	ANKOS
14	Math Science Net	3.889\$	ANKOS
15	MD Consult	15.690\$	ANKOS
16	Oxford Online Journals	7.828\$	ANKOS
17	ProQuest Agricola Plus Text	3.739\$	ANKOS
18	ProQuest Dissertations and Thesis	18.899\$	ANKOS
19	ProQuest Medical and Health Package	9.513\$	ANKOS
20	Referex	13.750\$	FİRMA (Info Tech)
21	SAGE Journals Online	13.915\$	ANKOS
22	Scientific & Medical Art Image	8.775\$	FİRMA (Ebsco)
23	SIAM Journals Online	2.805\$	ANKOS
24	Sport Discus With Fulltext	7.290\$	FİRMA (Ebsco)
25	Springer Link	11.751\$	ANKOS
26**	Springer - Biomedical & Life Sciences E-Books	yok	ANKOS
27**	Springer - Engineering E-Books	yok	ANKOS
28*	UpToDate	8.360\$	FİRMA (UpToDate)
29	Wiley InterScience	14.101\$	ANKOS

\* 2008 yılında ilk kez abone olundu

\*\*2007 yılında satın alındı.Satın alma modeli olduğu için 2007 yılında bir defalık fiyat ödendi



### **Kütüphanemiz İçin Geleceğe Yönelik Beklentilerimiz**

- Üniversite kütüphaneleri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğitimin ayrılmaz, olmazsa olmaz parçası ve akademik bir birim olarak kabul edilmesi,
- Mesleki ve idari personel sayısının artırılması,
- Çalışan personelin sürekliliğinin göz önünde tutulması,
- Bütçenin artırılması,
- Kütüphane içinde wireless (kablosuz internet) sisteminin kurulması,
- Personel ve öğrenci bilgisayarlarının yenilenmesi ve öğrenci bilgisayarlarının sayısının artırılması,
- Elektrik ve internet kesintileri sorunlarının giderilmesi (jeneratör ve güç kaynakları)
- Raf, vestiyer ve oturma kapasitesinin artırılması konusunda gerekli malzemelerin temini,

### **E- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:**

#### **1- 2008H031640 Makine Teçhizat Alımları Projesi**

Yatırım programında bu proje için 1.500.000,00- TL ödenek yer almaktayken; bu ödeneğin 318.000.-TL'si özgelirlerden karşılanmak üzere ödeneğe eklenmiş ayrıca yıl içerisinde 75.000,00.- TL deha eklenerek 1.893.000.- TL ödeneğe ulaşmış ve 1.654.000,00.- TL sı harcanmıştır.

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşmesi

2008 yılı ödeneği	1.818.000,00.-TL dir.
Eklene	75.000,00.-TL
Toplam Ödenek	1.893.000,00.-TL
Harcama	1.654.000,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı:	% 98
Fiziki Gerçekleşme Oranı:	% 100

#### **2- 2008H031650 Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi**

Yatırım programında bu proje için 200.000,- TL ödenek yer almakta olup yılı içerisinde bu ödeneğin tamamı Eğitim Öğretim Hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Projenin 2008 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşmesi

Toplam Ödeneği	200.000 TL
2008 Yılı Harcaması	200.000 TL
Gerçekleşme Oranı:	% 100

2.093.000.-TL'lik Toplu Projenin Detay Programı üst yöneticinin onayı ile belirlenmiş olup yapılan harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.



SATINALINAN BİRİM	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Split Klima	5 Kalem	104.326,16
Ziraat Fakültesi	Mikroskop Alımı	2 Kalem	106.920,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Bilgisayar Yazıcı Projeksiyon	3 Kalem	177.598,26
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Split Klima	4 Kalem	64.015,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Yazıcı Alımları	1 Kalem	28.787,28
Adana Meslek Yüksekokulu	Görüntü Sistemleri	5 Kalem	13.059,00
Beden Eğitimi Ve Spor YO.	Donatım Ve Tefriş Malzemeleri	3 Kalem	6.962,00
Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO	Maket Alımı	3 Kalem	1.929,00
Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO	Lab. Devri Motoru	1 Kalem	17.190,00
Devlet Konservatuarı	Konturbas	4 Kalem	9.717,00
Devlet Konservatuarı	Piyano	9 Kalem	20.237,00
Eğitim Fakültesi	Fotokopi Makinesi	1 Kalem	6.018,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Etüv - Derin Dondurucu	3 Kalem	19.529,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Akım Ve Güç Kaynağı	7 Kalem	10.998,00
Karaisalı MYO	Freze Tezgâhı	1 Kalem	11.800,00
Kozan MYO	Optik Okuyucu	1 Kalem	7.481,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Kuyruklu Piyano	1 Kalem	27.661,00
Beden Eğitimi Ve Spor YO	Öğrenci Sırası	1 Kalem	35.022,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Bilgisayar	1 Kalem	4.572,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Güç Kaynağı	1 Kalem	25.606,00
Su Ürünleri Fakültesi	Dizel Tekne Motoru	1 Kalem	26.939,00
Yumurtalık MYO	Ups	1 Kalem	5.487,00
Yumurtalık MYO	Buz Makinesi	1 Kalem	2.492,00
Yumurtalık MYO	Kurtarma Ve Eğitim Seti	1 Kalem	1.593,00
Yumurtalık MYO	Jeneratör	1 Kalem	22.538,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Split Klima	4 Kalem	25.016,00
Ziraat Fakültesi	Baskı Makinesi	1 Kalem	8.850,00
Ziraat Fakültesi	Derin Dondurucu	3 Kalem	27.889,00
Beden Eğitimi Ve Spor YO	Donatım Ve Tefriş Malzemeleri	4 Kalem	10.827,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Donatım Ve Tefriş Malzemeleri	1 Kalem	11.434,00
Yabancı Diller Öğretimi Arş.	Öğrenci Sırası	1 Kalem	26.266,00
Ziraat Fakültesi	TV DVD	2 Kalem	4.613,00
Adana Sağlık YO	Baskı Makinesi	1 Kalem	5.500,00
Ceyhan Meslek MYO	Çim Bıçme Traktörü	1 Kalem	7.250,00
Fen Bilimleri Enstitüsü	Fotokopi Makinesi	1 Kalem	5.475,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Kütüphane Güvenlik Sistemi	1 Kalem	20.650,00
Ziraat Fakültesi	Pişirme Soğutma Kazanı	1 Kalem	17.700,00
Yumurtalık MYO	Çamaşır Makinesi	1 Kalem	1.125,00
İktisadi Ve İdari Bilimler Fak	Fotokopi Makinesi	1 Kalem	3.203,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Split Klima	2 Kalem	26.514,00
Adana Sağlık YO	Telefon Santralı	1 Kalem	1.041,00



Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Renkli Termal Kimlik Makinesi	1 Kalem	6.165,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Fotokopi Makinesi	1 Kalem	5.310,00
İlahiyat Fakültesi	Barkod Yazıcı	1 Kalem	1.368,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü	Dijital Fotokopi Makinesi	1 Kalem	6.018,00
Adana Meslek Yüksekokulu	Ses Ve Görüntü Sistemi	1 Kalem	13.047,00
Yumurtalık MYO	Eğitim Ve Kurtarma Mankeni	1 Kalem	1.593,00
Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO	Beyin Kalp Modeli	1 Kalem	1.929,00
Mühendislik Ve Mimarlık Fak	Etüv Hassas Terazi	2 Kalem	3.499,00
Tıp Fakültesi	Mikrosantifrj	1 Kalem	3.115,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Terazi Kül Fırını Isıtıcı	2 Kalem	23.482,00
Güzel Sanatlar Fakültesi	El Dokuma Makinesi	1 Kalem	7.316,00
Devlet Konservatuarı	Prospot	1 Kalem	32.627,00
Fen Edebiyat Fakültesi	Eğitim Setleri	4 Kalem	10.997,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Halı Yıkama Mak. Elekt. Süpürge	2 Kalem	10.333,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Renkli Plotter	1 Kalem	27.199,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Kesintisiz Güç Kaynağı	1 Kalem	28.556,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Profesyonel Fotoğraf Mak	1 Kalem	7.118,00
Rektörlük Ve Bağlı Birimleri	Muhtelif Diğer Alımlar		702.493,30
<b>TOPLAM</b>			<b>1.854.000,00</b>

#### **4. Öneriler:**

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

İhtiyaçları karşılamada yetersiz olan, yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.

Sağlık hizmetlerinin, çağın gerektirdiği kalitede, hızlı ve güvenilir sunulması için gelişen teknolojiyle donatılmış yeni cihazların, hazırlanacak yatırım projeleriyle temin edilmesine yönelik ödenek tahsislerinin yapılması gerekmektedir

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamakta, özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir.

Ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.

Yılı için öngörülen proje ödeneğinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmesi sebebiyle planlanan yatırım gerçekleştirilememektedir.



Teknolojik araştırma projelerinin ödeneklerinin tamamının ilk yıl tahsisi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.)

Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.

Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli sağlık, teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

Yapımına öngörülen sürelerde başlanamayan projelerin programdan çıkarılmalı, 10-15 yıl gibi gereğinden uzun süren projelerin geciktirilme nedenleri araştırılıp soruşturulmalı; gerekirse sürece yer alan ilgili kurumların tüm ilgililerinin sorumlu tutulmaları sağlanmalıdır.

İdarelerin üst yöneticilerine yatırım bütçelerinde yer alan ve %90’ı bitim aşamasına gelmiş bazı önemli projelerin tamamlanabilmesi için ek ödenek talebinde bulunma ve kullanma yetkisi verilmelidir.

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.



## ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama			2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	9		90.368			50.629			11.378			4.903			15.528
Sağlık	3		5.575			-			2.875			800			3.637
D.Kamu Hizm.	3		14.549			2.419			8.830			220			8.429
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>			<b>110.492</b>			<b>53.048</b>			<b>23.083</b>			<b>5.923</b>			<b>27.594</b>

**2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU**

**Kuruluş Adı** : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
**Sektör Adı** : EĞİTİM

**BİN  
(TL)**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut.Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	(+/-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
23656	420	2008H031620	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2008	Adana	0	150	99	0	0	150					150
23657	420	1977H030010	Kampüs Altyapıları	Özel Bütçe	2008	Adana,	0	34000	29535	0	0	400		1528			1927
23658	420	1998H030440	Merk.Ders.ve İdari Blok.+Kongre	Özel Bütçe	2009	Adana,	0	48500	18502	0	0	5910		2700			8610
23659	420	2008H031630	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2008	Adana,	0	1000	474	0	0	1000		600			1394
23660	420	2008H031640	Makine ve Teçhizat Alımı	Özel Bütçe	2008	Adana,	0	1818	529	0	0	1818		75			1654
23661	420	2008H031650	Yayın Alımı	Döner Ser.	2008	Adana,	0	1200	800	0	0	1200					916
23662	420	2008H031660	Bilgi Teknolojileri	Özel Bütçe	2008	Adana	0	200	220	0	0	200					200
23663	420	2008H031670	Taşıt Alımı	Özel Bütçe	2008	Adana,	0	213	0	0	0	213					
23586	420	2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2009	Adana,	0	3500	2592	0	0	100					77
23587	420	2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2009	Adana,	0	0	0	0	0	600					600
<b>TOPLAM</b>							0	90581	52751	0	0	11378		4903			15528



## 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
Sektör Adı : SAĞLIK

BİN  
(TL)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut.Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	( +/- ) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
23025	420	2008I000300	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2008	Adana	0	100	0	0	0	100					88	
23027	420	2008I000310	Hastane Büyük Onarım	Döner Sermaye	2008	Adana	0	0	0	0	0	2000						
23026	420	2008I000310	Hastane Büyük Onarım	Özel Bütçe	2008	Adana	0	3775	581	0	0	1775	800				2549	
23029	420	2008I000320	Hastane Makine ve Teçhizat Al.	Döner Sermaye	2008	Adana	0	0	0	0	0	700						
23028	420	2008I000320	Hastane Makine ve Teçhizat Al.	Özel Bütçe	2008	Adana	0	1700	123	0	0	1000					1000	
<b>TOPLAM</b>							0	5575	704			2875	800					3637

## 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
Sektör Adı : DKH

BİN  
(TL)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut.Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	(+/-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
22378	420	2003K120320	İleri Arştırma Projeleri	Özel Bütçe	2008	Adana	0	349	319	0	0	30					30
22379	420		Tercihli Yemlemenin Farklı Çağd.	Özel Bütçe	2008	Adana	0	349	319	0	0						
22380	420	2007K120690	Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma	Özel Bütçe	2009	Adana	0	8400	2100	0	0	3000		(+)-641 (-)-500			3137
22381	420	2008K120540	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	Özel Bütçe	2008	Adana	0	5800	0	0	0	5800		79			5262
<b>TOPLAM</b>							0	9098	2738	0	0	8830		220			8429
