

2009

# 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği

ADANA  
15/03/2010





<b>2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU</b>	<b>2</b>
<b>1. Yönetici Özeti</b>	<b>2</b>
<b>2. Genel Değerlendirme</b>	<b>3</b>
• Kuruluşun Vizyonu:	3
• Kuruluşun Misyonu:	3
• Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:	3
• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:	4
• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Yasal Dayanakları:	4
• Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:	6
• 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:	7
• 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:	8
- Genel Yatırım Uygulama Durumu:	8
- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	8
<b>3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:</b>	<b>10</b>
<b>A- DPT İleri Araştırma Projeleri:</b>	<b>10</b>
1) 2007K120690 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi:	10
<b>B- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:</b>	<b>11</b>
1) 2009K120560 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:	11
<b>C- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:</b>	<b>14</b>
1) 2009H030830 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:	14
2) 1977H030010 Kampüs Altyapıları Projeleri:	15
3) 2002H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	16
4) 1998H030440 Merkezi Derslik İd. Blok + Kongre Merkezi Projeleri:	17
5) 2009I000300 Hastane Büyük Onarım Projesi:	18
6) 2009H030840 Büyük Onarım Projesi:	19
<b>D- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:</b>	<b>20</b>
1) 2008H031650 Yayın Alım Projesi:	20
<b>E- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:</b>	<b>24</b>
1) 2009H030840 Makina ve Techizat Alımı	24
<b>4. Öneriler:</b>	<b>26</b>



## 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlama sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

Yatırım karakterli ileri araştırma projeleri ile araştırma alt yapı geliştirme projelerinin, planlanarak desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi, desteklenmesi DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) plan ve programlarına uygun ve de eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi, proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entelektüel birikim ve gelişimi, ahlaki sorumlulukla özdeşleştirmek, sosyal sorumluluk ögesini kültürel ve ekonomik iyileştirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi'nin vizyonu bilginin keşfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. Yapısal dönüşüm sürecini geçmişten beri yüreklilikle yaşama ve yaşatma geleneğine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  
Rektör

## 2. Genel Değerlendirme

### • Kuruluşun Vizyonu:

Artan küreselleşmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barışına katkıda bulunmak.

Yetişmiş insan gücü talebi ve uluslararası ilişkiler karşısında daha gelişmiş AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliştirerek ülkemizin ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden biri olmak.

### • Kuruluşun Misyonu:

İletişim teknolojileri ile donanmış, AR-GE'yi güçlendiren, paydaşlarla işbirliği yapan ve alternatif öğretim tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak.

Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleştirel düşüncenin gereksinimlerini karşılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak.

### • Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

- 1- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecek,
- 2- Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirilecek,
- 3- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek,
- 4- Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak,
- 5- Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir.
- 6- Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüştür.
- 7- Araştırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır.

## • Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
  - a) Hazine Yardımı
  - b) Öz Gelirler
    - 1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
    - 2) Kira Gelirleri
    - 3) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
    - 4) Öğrenci Harçları
    - 5) Yaz Okulu Gelirleri
    - 6) İkinci Öğretim Gelirleri
    - 7) Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
  - a) TÜBİTAK
  - b) SAN-TEZ
  - c) AB
  - d) Şartlı Bağışlar dan oluşmaktadır.


## • Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Yasal Dayanakları:

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “...Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

Üniversitemiz 2009 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları

EKO KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	SERBEST	ÖDENEK GÖND.	HARCAMA	Harcama/ Serbest Oranı
06.1	Mamul Mal Alımları	9.850.000,00	2.691.287,00	1.900.000,00	1.752.163,55	65%
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000,00	176.659,55	126.659,55	0,00	0%
06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.700.000,00	14.294.990,35	14.294.990,35	9.114.286,75	64%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	900.000,00	1.172.796,66	1.172.796,66	1.078.901,81	92%
<b>GENEL TOPLAM</b>		21.550.000,00	18.335.733,56	17.494.446,56	11.945.352,11	65%

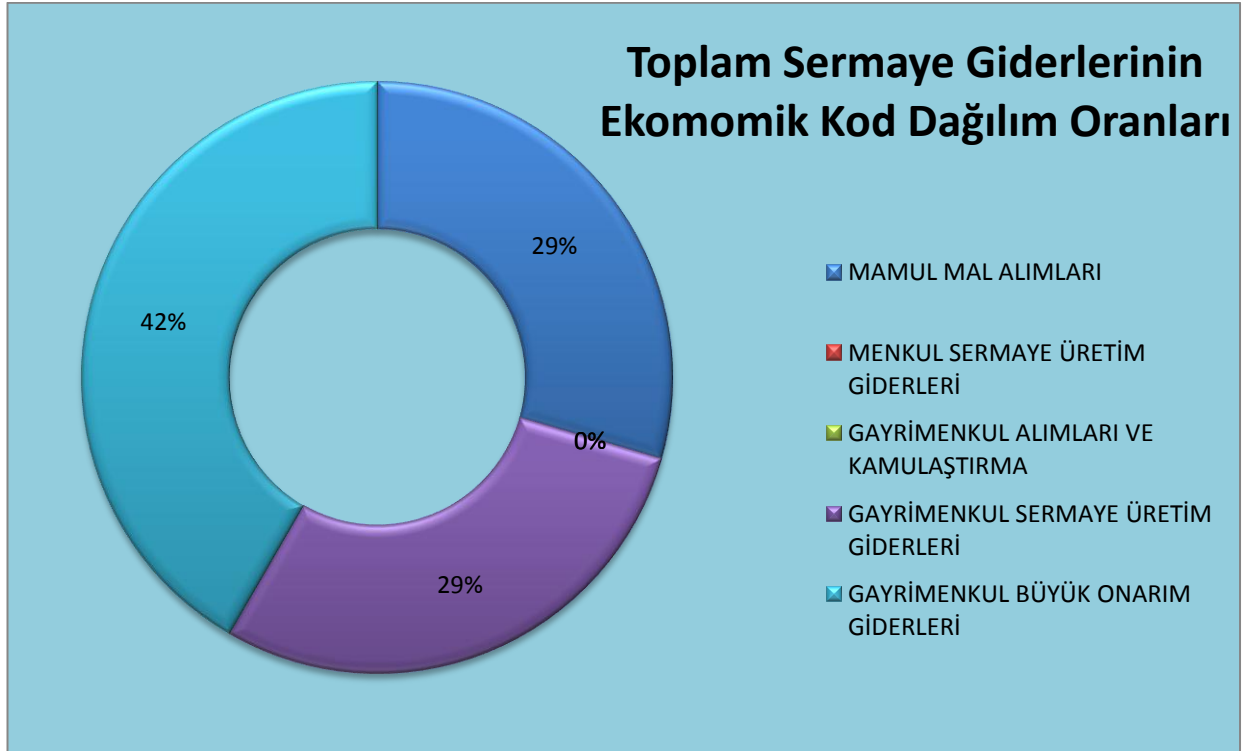

## • Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Çukurova Üniversitesi, 12 Fakülte, 4 Yüksek Okulu, 8 Meslek Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 23 Araştırma Uygulama Merkezi ile Eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Çukurova Üniversitesi'nde 3 enstitüde 161 lisansüstü, 12 fakültede 76 lisans, devlet konservatuarında 2 lisans, 4 yüksekokulda 7 lisans programı ve 8 meslek yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Yüreğir İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında toplam 2265 hektar arazi üzerine kurulmuştur.

Yerleşke alanının, yaklaşık 60 hektarı kapalı alanlar için, 35 hektarı aktif yeşil alan ve otoparklar, yaklaşık 100 hektarı ise eğitim amaçlı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geriye kalan araziler ise ormanlık, çalılık ve fundalık alanlardır.

Yerleşkede yönetim ve eğitim- öğretim birimlerinin yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, açık ve kapalı spor tesisleri, lojmanlar ve sosyal tesisler yer almaktadır.

Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizen Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği nüfus büyüklüğüne (öğrenci sayısına ) göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilen plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır.

Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır.

Üniversitemiz ~23.000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. ~750.000 m2 kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır. 2008-2009 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans eğitimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 34.832 öğrenci vardır. Üniversitemizde 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 1942 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Bunların 405'i profesör, 167'si doçent, 285'i yardımcı doçent, 181'i öğretim görevlisi, 134'ü okutman,697'si araştırma görevlisi, 73'ü uzmandır.



Üniversitemiz 2009 Yılı Akademik Personel Sayıları

AKADEMİK PERSONEL	2009
Profesör	405
Doçent	167
Yard. Doçent	285
Öğretim Görevlisi	181
Okutman	134
Araştırma Görevlisi	697
Uzman	73
<b>TOPLAM</b>	<b>1942</b>

Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

• **2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Merkezi Derslik Projesi kapsamında inşası sürdürülen 3. blok inşaatı işi hizmete açılmıştır. Adana Sağlık Yüksekokulunun inşaatı tamamlanmış, hizmete açılmıştır. Ç.Ü. Mithat Özsan Amfi I ve II Nolu Derslik ile Müh. Fak. İnş. Bölümü Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Süt Ürünleri Üretim Tesisleri Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Zootekni Bölümlerinin Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Y4,Y5,Y6 Bloklarından K2 Bloğunun İklimlendirilmesi İle Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Radyasyon Onkoloji Binası Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Mültidisiplin ve Parazitoloji Laboratuvarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Yanık ve Yara Bakım Ünitesi Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Kampus İçi Havai Hatların Yeraltına Alınması, Ç.Ü. Karataş Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Spor Tesisleri Yapılması, Ç.Ü. Kozan MYO Spor Alanları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Binaları İle Kampus İçi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Kampus İçi Muhtelif Yol, Otopark ve Çevre Düzenlemesi, Ç.Ü. Kampusu Muhtelif Trafo Binalarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fak. Ve Balcalı Hastanesi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Tıp Fak. İle Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği Çeşitli Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Merkezi Kütüphane, Öğrenci ve İdari Mali İşler Dairesi WC'leri İle Zir. Fak. Bitki Koruma Laboratuvarı Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Göl Pompaları Boru Hattının Kısmi Değişimi İle Karaisalı MYO Depo, Nizamiye Binası, Su Deposu Yapılması, Ç.Ü. İletişim Fakültesi Binası İnşaatı, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryum Laboratuvarı, Ç.Ü. Rektörlük Göl Sulama Pompaları Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İle Kampus İçi Muhtelif Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Rektörlüğü Biyoteknoloji Laboratuvarı İkmal İnşaatı, Ç.Ü. Atletizm Pisti Açık Türbin Yapılması İle Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tadilat Onarım, Ç.Ü. Ana Isı Merkezi İle Ziraat Fakültesi Muhtelif Bölümleri Arası Galeri Tesisatı ve Muhtelif Su Depolarının Tadilat ve Onarım, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Acil Bölümü Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alım, Ç.Ü. Yumurtalı MYO Binası Statik (B.A), Mimari Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekanik Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alım, Ç.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Uygulama, Sistem Detay Projeleri, Mekanik, Elk.-Elektronik Tesisat Projeleri ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması işlerinin ihaleleri yapılmıştır.





Ayrıca, Adana İli ve bölgenin önemli bir eksiğinin giderilmesi amacıyla projeleri tamamlanan 20.000 m2 kapalı alana sahip Çukurova Bölgesi Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının proje ve inşaat ihalesi yapıp, inşaatına başlanmıştır. 2010 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmiştir.

Rektörlük Büyük Onarım, Sağlık Birimleri Büyük Onarım ve Altyapı ödenekleri ile yaşlanma sürecine girmiş bulunan Üniversitemiz binalarından Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müh. Mim. Fakültesi, Adana MYO, Ziraat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıştır

### • 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:

#### - Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2009 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2009 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunmaktadır.

#### - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi,

Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT'den yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.

Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.

Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inşaat maliyetleri artmakta ve iş bitim süreleri uzamaktadır.

Yapım işleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. İmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içerisinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım işinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir.

Gerçek ihtiyaçları karşılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir.



Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3'er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.

Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır.



### 3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:

#### A- DPT İleri Araştırma Projeleri:

2009 mali yılında Devlet Planlama Teşkilatının desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 1 proje bulunmakta olup; para aktarımı dönemler halinde yapılmaktadır. Bu ödeneklerde Ocak – Haziran döneminde projeden harcama yapılmamıştır.

Proje No	2007K120690		
Projenin Adı	<b>Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Bilimsel Araştırma Projeler Birimi</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>2.000,00</b>		
Harcama	<b>2.000,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>0,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>100,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Karbondioksitli İnkübatör	1	14.750,00	
Digital Görüntüleme ve Analiz Sistemli Stereo Mikroskop	1	22.410,00	
Azot/protein tayin cihazı	1	24.636,00	
Yağ tayin cihazı	1	29.823,00	
Bilgisayar kontrollü İlaçlama Aleti (Kulesi)	1	31.034,00	
İklimlendirme Sistemleri	1	31.860,00	
Faz kontrast ataşmanlı trinoküler ve dijital kameralı stereozoom laboratuvar mikroskop seti	1	35.636,00	
Mikroplate okuyucu cihazı	1	35.990,00	
Soğuk muhafaza sistemi	1	34.465,00	
Nem ve sıcaklık kontrollü kabin	1	37.760,00	
Fizyolojik çalışma sistemi	1	38.055,00	
Vakum konsantratörü	1	38.822,00	
Biyoreaktör (5 L Hacimli)	1	71.980,00	
İnkübatör orbital çalkalayıcı (Soğutmalı)	1	82.428,00	
Flow Cytometry	1	128.520,00	
Buhar Sterilizatörü (400-500 L Hacim)	1	159.300,00	
Gaz kromatografi ve gaz kromatografi kütle spektrometre sistemi	1	266.680,00	
Yüksek hızlı sıvı kromatografisi/sıralı kütle spektrometresi (LC-MS/MS)	1	690.300,00	
Diğer Açıklamalar :			
<b>Tezgahların yapımı yeni tamamlandığından cihazların kurulumu 2010 mart ve nisan aylarında yapılıp mayıs ayından itibaren kullanıma geçecektir.</b>			

#### 1) 2007K120690 Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi:

2009 yılı Ocak ayında hazırlanmış olan Ayrıntılı Harcama Programı ve Ayrıntılı Finansman Programları doğrultusunda planlanmış olan aylık gelirlerimiz DÖSE gelirleri ödenek kaydı

yapılarak proje ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Proje harcamalarında herhangi bir problem görülmemektedir.

### B- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

Proje No	2009K120560		
Projenin Adı	<b>Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Bilimsel Araştırma Projeler Birimi</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>5.159,00</b>		
Harcama	<b>2.306,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>2.853,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>45,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
<b>Enerji Dağılımlı X-ışını Floresan Spektrometre (XRF) Cihazı</b>	1	117.500,00	
<b>Damla Sula Malzeme Alımı ve Kurulumu</b>	1	185.000,00	
<b>Primer(3.000 bp)</b>	1	11.000,00	
<b>Jel Görüntüleme Sistemi</b>	1	28.000,00	
<b>Bilgisayar</b>	1	1.300,00	
<b>2xPCR Master Mix 100 Reaksiyon</b>	1	1.200,00	
<b>Kesintisiz Güç kaynağı</b>	1	2.000,00	
<b>Sıvı Azot Taşıma Tankı</b>	1	10.000,00	
<b>Sunucu Bilgisayar</b>	10	44.000,00	
Diğer Açıklamalar : <b>IMRT Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı alımı çalışmalarına başlanmış ancak yıl sonuna olması nedeniyle akreditif işlemlerinin yetişmeyeceği anlaşıldığında alım sonraki yıla kalmıştır.</b>			

#### 1) 2009K120560 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

##### 1.1. 2007K120670-20 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağının Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi:

Prof.Dr.Semih TANGOLAR 34.000. TL



2007 yılında 75.000 TL ile desteklenen proje 2009 yılında kalan 34.000 TL ödeneği kullanılarak Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağının Geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

**1.2. 2008K120540-1 Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu Projesi:**

Prof.Dr.Bilgin YÜKSEL 550.000. TL

2008 yılında kabul edilen projede 2009 yılında proje bütçe olanakları nedeniyle harcama yapılmamıştır.

**1.3. 2008K120540-6 Parazitoloji Anabilim Dalı Rutin ve Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Destekleme Projesi:**

Prof.Dr.i.Soner KOLDAŞ 33.000. TL

2008 yılında 143.000TL ile desteklenen proje 2009 yılında kalan 33.000TL ödeneği de kullanarak tamamlamıştır.

**1.4. 2008K120540-9 Pozantı-Karsanlı (Aladağ) Kromit Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Yönden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Projesi:**

Prof.Dr.Mesut ANIL 118.000.TL

2008 yılında 118.000TL ile desteklenen proje 2009 yılında 117.500. TL harcanmıştır ve tamamlanmıştır.

**1.5. 2008K120540-11 Çukurova Bölgesinde Turunçgillere Alternatif Meyvecilik Geliştirme Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Ayzin KÜDEN 189.000. TL

2008 yılında 189.000TL ile desteklenen proje 2009 yılında 185.000. TL harcanarak tamamlanmıştır.

**1.6. 2009120560-1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi:**

Prof.Dr.Alper AKINOĞLU 5.950000. TL

a- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (556 Adet)

b- Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (900 Adet)

2009 yılında kabul edilmiş olup; Bireysel, Katılımlı, Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık projelerinin ihtiyaçları için 1.798.000TL kullanılmıştır.

**1.7. 2009120560-2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Ayzin KÜDEN 63.150. TL

2009 yılında kabul edilmiş olup bütçe olanakları çerçevesinde harcamaların seneye yapılacağı planlanmıştır.

**1.8. 2009120560-3 İleri Moleküler Tanı Laboratuvarı Alt Yapı Projesi:**

Prof.Dr.Fatih KÖKSAL 40.000. TL



2009 yılında kabul edilmiş olup İleri Moleküler Laboratuvarına Primer ve Jel Görüntüleme Sistemi alınarak proje tamamlanmıştır.

**1.9. 2009120560-4 Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Sadullah SAKALLIOĞLU 650.000. TL.

2009 yılında kabul edilmiş olup bütçe olanakları nedeniyle harcamaların seneye yapılacağı planlanmıştır.

**1.10. 2009120560-5 Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Sadullah SAKALLIOĞLU 730.300. TL.

2009 yılında kabul edilmiş olup; 56.000TL ile Kesin Güç Kaynağı ve Sunucu Bilgisayar alınmıştır. Kalan 674.00TL'nin sonraki yıllarda kullanılması planlanmıştır.

**1.11. 2009120560-6 UZAYMER Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Aysun AKYÜZ 70.100. TL.

2009 yılında kabul edilmiş olup; Gözlem evi Kubbesi ve Gözlem evi için hareketli alımı yapılmış olup ödemesi yapılamadığı için 70.100TL harcanması ve projenin tamamlanması sonraki yıla kalmıştır.

**1.12. 2009120560-7 Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme (Onkolojik Hastaların Tedavisinde IMRT'nin Rolü) Projesi:**

Prof.Dr.Candaş TUNALI 2.500.000. TL.

2009 yılında kabul edilmiş olup; IMRT Uyumlu Linear Akseleratör cihazı alımı yılsonuna gelmesi nedeniyle yapılamadığı için cihazın alımı ve projenin tamamlanması sonraki yıla kalmıştır.

**1.13. 2009120560-8 Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı Altyapı Projesi:**

Prof.Dr.Kadir AYDIN 350.000. TL

2009 yılında kabul edilmiş olup; 42.000 TL harcanmış kalan 308.000TL'nin sonraki yılda harcanması planlanmıştır.



**C- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:**

1) 2009H030830 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030830		
Projenin Adı	<b>Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>100.000,00</b>		
Harcama	<b>0,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>100.000,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>0,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
<b>Diğer Açıklamalar :</b>			
<b>Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde,</b>			
<b>2009 Yılı Ödeneği 100.000,00.- TL dir</b>			
<b>Harcama 000.000,00.-TL</b>			
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0</b>			
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 0</b>			

## 2) 1977H030010 Kampüs Altyapıları Projeleri:

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	1977H030010		
Projenin Adı	<b>Kampüs Altyapıları</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>300.000,00</b>		
Harcama	<b>300.000,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>0,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>100,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Ç.Ü. Isı Merkezi İle Muhtelif Galeri Tadilat ve Onarım	<b>1</b>	<b>78.706,00</b>	
Ç.Ü.Rektörlüğü Üst Yönetim Binası Fan-Coil Tesisatı Tadilat ve Onarım	<b>1</b>	<b>92.379,00</b>	
Ç.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Uygulama, Sistem Detay Projeleri, Mekanik, Elk.-Elektronik Tesisat Projeleri		<b>128.915,00</b>	
<b>Diğer Açıklamalar :</b>			
<b>Üniversitemiz yatırım programında devam etmekte olan Kampüs Altyapısı Projesi işimizde, Ç.Ü. Isı Merkezi ile Muhtelif Galeri Tadilat ve Onarım ile Ç.Ü.Rektörlüğü Üst Yönetim Binası Fan-Coil Tesisatı Tadilat ve Onarım işleri ve çeşitli tadilat ve onarımlar yapılmıştır.</b>			
<b>2009 Yılı Ödeneği 300.000,00.- TL dir.</b>			
<b>Harcama 300.000,00.-TL</b>			
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100</b>			
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100</b>			





3) 2002H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2002H050040		
Projenin Adı	<b>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>200.000,00</b>		
Harcama	<b>111.510,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>88.490,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>56,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Ç.Ü.Rektörlüğü Sakıp Sabancı Kapalı Spor Salonuna Tırmanma Duvarı Yapılması	<b>1</b>	<b>111.510,00</b>	
<b>Diğer Açıklamalar :</b>			
<b>Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, Ç.Ü.Rektörlüğü Sakıp Sabancı Kapalı Spor Salonuna tırmanma duvarı yapılması işi yapılmıştır.</b>			
<b>2009 yılı Ödeneği 200.000,00.-TL</b>			
<b>Harcama 111.510,00.-TL</b>			
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: %56</b>			
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100</b>			



4) 1998H030440 Merkezi Derslik İd. Blok + Kongre Merkezi Projeleri:

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	1998H030440		
Projenin Adı	<b>Merkezi Derslik ve İdari Blok</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>10.200.000,00 + 3.550.000,00 =13.750.000,00</b>		
Harcama	<b>8.803.000,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>4.947.000,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>65,00</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Diş Hek.Fak.(Merkezi Derslik Alt Projesi)	<b>1</b>	<b>5.100.000,00</b>	
Kongre Merkezi (Merkezi Derslik Alt Projesi)	<b>1</b>	<b>2.602.896,00</b>	
İletişim Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi)	<b>1</b>	<b>1.000.000,00</b>	
Yumurtalık MYO (Merkezi Derslik Alt Projesi)	<b>1</b>	<b>0,00</b>	
Adana Teknik Bilimler MYO (Merkezi Derslik Alt Projesi)	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	
Diğer Açıklamalar :			
<p><b>Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi işimizde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı devam etmektedir. Kongre ve Kültür Merkezi İkmal İnşaatının İhalesi yapılmıştır.</b></p>			
<b>2009 yılı ödeneği</b>	<b>10.200.000,00.-TL dir.</b>		
<b>Eklenen Ödenek</b>	<b>3.550.000,00.-TL</b>		
<b>Harcama</b>	<b>8.803.000,00.-TL</b>		
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: %</b>	<b>100</b>		
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: %</b>	<b>75</b>		



5) 2009I000300 Hastane Büyük Onarım Projesi:

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi :

Proje No	2009I000300		
Projenin Adı	<b>Muhtelif İşler</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>400.000,00</b>		
Harcama	<b>399.373,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>627,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>99,84</b>		
İşin Adı	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Muhtelif Bölümlerin Tadilat ve Onarım	<b>1</b>	<b>256.495,28</b>	
Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Katli Otopark Batı ve Güney Dış Cephe Kaplaması ve Pencerelerinin Yapılması	<b>1</b>	<b>111.607,70</b>	
Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Yanık Ünitesi İhale Odası Tadilatı ile Çiller Grubu Soğuk Su Besleme Deposu Yapılması	<b>1</b>	<b>31.270,00</b>	
<b>Diğer Açıklamalar :</b>			
<b>Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Muhtelif Bölümlerin Tadilat ve Onarım işi ve Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Katli Otopark Batı ve Güney Dış Cephe Kaplaması ve Pencerelerinin Yapılması işleri yapılmıştır.</b>			
<b>2009 yılı ödeneği 400.000,00.-TL dir.</b>			
<b>Harcanan 400.000,00.-TL</b>			
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100</b>			
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100</b>			



6) 2009H030840 Büyük Onarım Projesi:

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030840		
Projenin Adı	<b>Muhtelif İşler</b>		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>2.400.000,00</b>		
Harcama	<b>2.317.000,00</b>		
Kalan Ödenek	<b>83.000,00</b>		
Gerçekleşme Oranı %	<b>96,00</b>		
<b>İşin Adı</b>	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>	
Tadilat Onarım İşleri	<b>1</b>	<b>417.000,00</b>	
Yayın Alımı	<b>1</b>	<b>1.100.000,00</b>	
Makine Techizat	<b>1</b>	<b>500.000,00</b>	
Bilgi Teknolojileri	<b>1</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Diğer Açıklamalar :</b>			
<p>Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi işimizde, çeşitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı. Ç.Ü.Rektörlüğü Anaokulu İlave Sınıf Yapılması ve Tadilat Onarım işi, Ç.Ü. Biyoteknoloji Laboratuvarı Çeker Ocak ve Tezgahların Yapılması İş, Ç.Ü.Uzaymer Binası, Araştırma Görevlileri Binaları ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar Bölümü Muhtelif Tadilat ve Onarım İşleri Yapılması İş, Ç.Ü. Kampüsü ve Ceyhan M.Y.O. Muhtelif Tadilat ve Onarım İşleri yapılmıştır.</p> <p>Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapmak gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri yapılmıştır.</p> <p><b>2009 Yılı Ödeneği</b></p> <p><b>ÖSHB</b> 300.000,00.-TL</p> <p><b>Özel Gelir</b> 200.000,00.-TL</p> <p><b>Harcama</b> 417.000,00.-TL</p> <p><b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 83</b></p> <p><b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100</b></p> <p><b>Sağlık Kültür 06.1 Tertibinde 121.579,08.-TL Harcamıştır.</b></p>			



#### D- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:

##### 1) 2008H031650 Yayın Alım Projesi:

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi: 2009 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 1.100.000,00 TL' dir. Yıl içinde 1.099.985,00' si harcanmıştır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Proje No	2009H030840	
Projenin Adı	<b>Muhtelif İşler</b>	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	<b>Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı</b>	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	<b>1.100.000,00</b>	
Harcama	<b>1.099.985,00</b>	
Kalan Ödenek	<b>15,00</b>	
Gerçekleşme Oranı %	<b>% 99,9</b>	
İşin Adı		
	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>
<b>Basılı Kitap Alımı</b>	2339	113.621,00
<b>Basılı Süreli Yayın Alımı</b>	136	192.676,00
<b>Elektronik Dergi Veritabanı</b>	38	616.545,00
<b>Elektronik Kitap Veritabanı</b>	4	177.143,00
Diğer Açıklamalar :		
<b>2009 Yılı Ödeneği</b>	<b>1.100.000,00.- TL.</b>	
<b>Harcama</b>	<b>1.099.985,00.- TL</b>	
<b>Kalan</b>	<b>15,00.- TL</b>	
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 100</b>		
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 100</b>		



## 2009 Yılı Veritabanları (ANKOS, FİRMA)

No	Veritabanı Adı	Tutarı(TL)	Nereden Alındığı
1	ACS (American Chemical Society)	16.783	ANKOS
2	AGRICOLA (ProQuest)	ücretsiz	ANKOS
3	AMS+Article Linker+Central Search	26.134	ANKOS
4	AIP (American Institute of Physics)	22.197	ANKOS
5	Annual Reviews*	19.388	ANKOS
6	Cambridge Journals Online	6.837	ANKOS
7	CINAHL With Fulltext	50.842	FİRMA (Ebsco)
8	EBRARY	25.328	ANKOS
9	Ebrary Online Sheet Music	3.387	FİRMA (ProQuest)
10	EconLit with Fulltext		FİRMA (Ebsco)
11	Elsevier E-Books*	127.379	ANKOS
12	Engnetbase	21.047	FİRMA (Info Tech)
13	Foodnetbase		FİRMA (Info Tech)
14	Hukuk Türk*	1.170	ANKOS
15	Institute of Physics	11.176	ANKOS
16	JSTOR	7.772	ANKOS
17	Karger*	27.718	ANKOS
18	Knovel*	35.710	ANKOS
19	Math Science Net	6.269	ANKOS
20	MD Consult	27.733	ANKOS
21	Oxford Online Journals	15.331	ANKOS
22	Pharmaceutical News Index (ProQuest)	ücretsiz	ANKOS
23	ProQuest Agricola Plus Text		ANKOS
24	ProQuest Dissertations and Thesis	31.368	ANKOS
25	ProQuest Medical and Health Package	21.995	ANKOS
26	Referex	24.191	FİRMA (Info Tech)
27	SAGE Journals Online	17.488	ANKOS
28	Scientific & Medical Art Image		FİRMA (Ebsco)
29	SIAM Journals Online	5.262	ANKOS
30	SourceOECD*	28.408	ANKOS
31	Sport Discus With Fulltext		FİRMA (Ebsco)
32	Springer Link	63.657	ANKOS
33	Springer - Biomedical & Life Sciences E-Books*	Yok	ANKOS
34	Springer - Engineering E-Books*	Yok	ANKOS
35	Thieme*	17.721	ANKOS
36	UpToDate	20.813	FİRMA (UpToDate)
37	Wiley InterScience (Blacwell veritabanıyla birleşti)	110.620	ANKOS
	Toplam	793.724	
	* 2009 yılında ilk kez abone olundu		
	*2007 yılında satın alındı.Ödemesi bir defa yapıldı.		



**2009 Yılı Veritabanları (ULAKBİM, EKUAL)**

No	Veritabanı Adı
1	BMJ Clinical Evidence
2	BMJ Journals Online
3	CAB Abstracts
4*	EbscoHost - Academic Search Complete
5	EbscoHost - Business Source Complete
6	Engineering Village 2
7	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
8	ISI Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
9	Journal Citation Reports (JCR)
10	OVID Journals
11	Science Direct
12	Taylor & Francis Online Journals (Informa)

\* Ebsco firması 2009 yılı için aşağıdaki ürünleri de ücretsiz olarak üniversitemiz erişimine açmıştır.

No	Veritabanı Adı
1	Book Index with Reviews
2	Computers and Applied Science Complete
3	Dynamed
4	Environment Complete
5	ERIC
6	GreenFILE
7	Health Source:Nursing/Academic Edition
8	History Reference Center
9	Humanities International Complete
10	Legal Collection
11	Library, Information Science and Technology Abstracts with Fulltext
12	Masterfile Premier
13	Medline
14	Newspaper Source
15	Psychology and Behavioral Sciences Collection
16	Regional Business News
17	Religion and Philosophy Collection
18	Serials Directory

### 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 35000'e yükseltmek
Basılı Dergi Koleksiyonu	Basılı dergi aboneliğini 220'e indirmek
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 5000 adet kitap satın almak
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloqlama	3000 adet kitabın kataloglanması
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloqlama	5000 adet kitabın kataloglanması
Geriye Dönük Kataloqlama	3000 adet bibliyografik kaydın sisteme aktarılması

### 2009 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 40.748'e yükselmiştir.
Basılı Dergi Koleksiyonu	Basılı dergi aboneliği 276'e inmiştir.
Kitap Koleksiyonu	6.377 adet kitap koleksiyona eklenmiştir.
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloqlama	2.500 adet kitap kataloglanmıştır.
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	48.170 elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir.
Kataloqlama	6.557 adet kitap kataloglanmıştır.
Geriye Dönük Kataloqlama	3.500 bibliyografik kayıt sisteme aktarılmıştır





**E- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırım Projeleri:**

1) 2009H030840 Makina ve Techizat Alımı

Projenin 2009 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Proje No	2009H030840		
Projenin Adı	Muhtelif İşler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	540.000,00		
Harcama	530.598,72		
Kalan Ödenek	9.401,28		
Gerçekleşme Oranı %	% 98.26		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Salon Tipi Klima	6	12.390,00	
Split Klima	6	3.540,00	
Split Klima	10	5.500,00	
Telefon Santrali	1	2.466,20	
Laser Yazıcı	1	5.499,36	
Cim Biçme Ve İlaçlama Makinası	4	2.880,00	
Ana Server	1	22.567,50	
Metro Swich	1	10.364,72	
Monitör Ve İnce İşlemci	46	13.165,20	
Jenaratör	1	133.806,10	
Portatif Jenaratör	1	1.649,64	
Yakıt Analiz Cihazı	1	135.700,00	
Sürücü Diskleri 300 Gb	12	21.806,40	
Jenaratör	2	117.999,00	
Masa Üstü Bilgisayar	32	29.264,00	
Split Klima	15	12.000,60	
Diğer Açıklamalar :			
2009 yılı ödeneği 540.000,00.- TL			
Harcama 530.597,72.- TL			
Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 98,26			
Fiziki Gerçekleşme Oranı: %98,26			

Üniversitemize 2009 yılında 06 Sermaye Giderleri'ne toplam 21.550.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 17.94.446,56 TL ödenek gönderilmiş ve bunun 11.95.352.11 TL si harcanmıştır. Buna ilişkin detay aşağıdaki tabloda birimler bazında gösterilmiştir.

# 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



BİRİM	TERTİP	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
	<b>Çukurova Üniversitesi</b>	<b>17.494.446,56</b>	<b>11.945.352,11</b>	<b>5.549.094,45</b>
251	<b>Diş Hekimliği Fakültesi</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.099.881,23</b>	<b>118,77</b>
	38.21.33.34-09.4.1.00-2-06.5	5.100.000,00	5.099.881,23	118,77
	38.21.33.34-09.4.1.00-2-06.5.7.01		5.099.881,23	
591	<b>Uygulama ve Araştırma Hast.</b>	<b>520.000,00</b>	<b>519.372,99</b>	<b>627,01</b>
	38.21.38.30-07.3.1.00-2-06.7	400.000,00	399.372,99	627,01
	38.21.38.30-07.3.1.00-2-06.7.7.01		399.372,99	
	38.21.38.30-09.4.1.11-8-06.7	120.000,00	120.000,00	0,00
	38.21.38.30-09.4.1.11-8-06.7.7.01		120.000,00	
807	<b>Yumurtalık MYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	38.21.46.47-09.4.1.00-2-06.5	0,00	0,00	0,00
902	<b>Özel Kalem (Rektörlük)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	38.21.00.02-09.4.1.09-2-06.1	0,00	0,00	0,00
	38.21.00.02-09.8.8.00-2-06.1	0,00	0,00	0,00
	38.21.00.02-09.8.8.01-2-06.1	0,00	0,00	0,00
904	<b>İdari ve Mali İşler Daire Bşk.</b>	<b>540.000,00</b>	<b>530.598,54</b>	<b>9.401,46</b>
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1	540.000,00	530.598,54	9.401,46
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.2.01		7.965,56	
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.2.02		97.167,82	
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.2.04		135.700,00	
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.2.05		21.430,00	
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.2.90		265.455,16	
	38.21.02.04-01.3.9.06-2-06.1.3.05		2.880,00	
907	<b>Kütüphane ve Dok. Daire Bşk</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.099.985,93</b>	<b>14,07</b>
	38.21.02.07-08.2.0.00-2-06.1	1.100.000,00	1.099.985,93	14,07
	38.21.02.07-08.2.0.00-2-06.1.6.01		306.297,42	
	38.21.02.07-08.2.0.00-2-06.1.6.04		793.688,51	
909	<b>SKS Daire Başkanlığı</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>3.053.785,43</b>	<b>5.356.214,57</b>
	38.21.02.09-09.6.0.00-2-06.5	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	38.21.02.09-09.6.0.06-2-06.5	200.000,00	111.510,00	88.490,00
	38.21.02.09-09.6.0.06-2-06.5.7.01		111.510,00	
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.1	260.000,00	121.579,08	138.420,92
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.1.2.02		14.715,20	
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.1.2.90		52.520,48	
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.1.4.40		54.343,40	
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.5	5.450.000,00	2.602.895,53	2.847.104,47
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.5.7.01		2.602.895,53	
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.7	300.000,00	217.800,82	82.199,18
	38.21.02.09-09.6.0.07-2-06.7.7.01		217.800,82	
911	<b>Yapı İşl. ve Tek.Daire Bşk.</b>	<b>1.824.446,56</b>	<b>1.641.727,99</b>	<b>182.718,57</b>
	38.21.02.11-01.3.9.06-2-06.2	50.000,00	0,00	50.000,00
	38.21.02.11-01.3.9.06-2-06.5	36.284,00	0,00	36.284,00
	38.21.02.11-01.3.9.06-2-06.7	200.000,00	199.833,00	167,00
	38.21.02.11-01.3.9.06-2-06.7.7.01		199.833,00	
	38.21.02.11-09.4.1.00-2-06.5	1.300.000,00	1.299.999,99	0,01
	38.21.02.11-09.4.1.00-2-06.5.7.01		1.299.999,99	
	38.21.02.11-09.4.1.11-8-06.2	76.659,55	0,00	76.659,55
	38.21.02.11-09.4.1.11-8-06.5	8.706,35	0,00	8.706,35
	38.21.02.11-09.4.1.11-8-06.7	152.796,66	141.895,00	10.901,66
	38.21.02.11-09.4.1.11-8-06.7.7.01		141.895,00	

## 4. Öneriler:

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

İhtiyaçları karşılamada yetersiz olan, yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.

Sağlık hizmetlerinin, çağın gerektirdiği kalitede, hızlı ve güvenilir sunulması için gelişen teknolojiyle donatılmış yeni cihazların, hazırlanacak yatırım projeleriyle temin edilmesine yönelik ödenek tahsislerinin yapılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 ayrı dilim halinde serbest bırakılması sebebiyle, ödenekler verimli kullanılamamakta, özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir.

Yapım işlerinin ödenekleri topluca Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı altında gösterilmelidir.

Teknolojik araştırma projelerinde, harcama yetkililiğinin proje yürütücüsüne verilmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlar çoğunlukla çözülecektir.

Yapımına öngörülen sürelerde başlanamayan projelerin programdan çıkarılmalı, 10-15 yıl gibi gereğinden uzun süren projelerin geciktirilme nedenleri araştırılıp soruşturulmalı; gerekirse süreçte yer alan ilgili kurumların tüm ilgililerinin sorumlu tutulmaları sağlanmalıdır.

İdarelerin üst yöneticilerine yatırım bütçelerinde yer alan ve %90'ı bitim aşamasına gelmiş bazı önemli projelerin tamamlanabilmesi için ek ödenek talebinde bulunma ve kullanma yetkisi verilmelidir.

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.

**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**  
**2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**

EK - 3

BÜTÇE TÜRÜ :

**2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		82.331			58.347			13.200			3.550		11.532	
Sağlık	3		2.400			0			2.400			0		400	
D. Kamu Hizm.	2		14.980			5.483			7.950			0		6.361	
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>99.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>18.293</b>	

**2009 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)**

EK - 4

**KURULUŞ ADI : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**  
**SEKTÖR ADI : EĞİTİM**

2009 Kümülatif Nakdi

BİM NO (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	BÜTÇE TÜRÜ (5)	BİTİŞ YILI (6)	YERİ (7)	PROJE TUTARI		2008 KÜMÜLATİF (10)	2009 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)	
5522	420	2009H030830	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2009	Adana		100	0			100						0
5523	420	1977H030010	Kampüs Altyapıları	ÖZEL BÜTÇE	2010	Adana		35.000	29.935			300						300
5524	420	1998H030440	Merkezi Derslik ve İdari Blok	ÖZEL BÜTÇE	2011	Adana		40.000	24.412			10.200	3.550					8.803
5526	420	2009H030840	Muhtelif İşler	DİĞERLERİ	2009	Adana		0	0			(331)						(531)
5525	420		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Adana		2.731	0			2.400						2.317
6017	420	2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2010	Adana		0	0	0	0	200						112
6017	420		Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2010	Adana		4.500	4.000			0						0
<b>TOPLAM</b>								<b>82.331</b>	<b>58.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.532</b>

**SEKTÖR ADI : SAĞLIK**

BİM NO (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	BÜTÇE TÜRÜ (5)	BİTİŞ YILI (6)	YERİ (7)	PROJE TUTARI		2.007 KÜMÜLATİF (10)	2008 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA				
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)		
4605	420	2009I000290	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	DÖNER SERM	2009	Adana		100	0			100						0	
4607	420	2009I00030	Muhtelif İşler	DÖNER SERM	2009	Adana		0	0			1.900						0	
4606	420		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Adana		2.300	0			400						400	
<b>TOPLAM</b>								<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

**SEKTÖR ADI : DKH**

BİM NO (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	BÜTÇE TÜRÜ (5)	BİTİŞ YILI (6)	YERİ (7)	PROJE TUTARI		2.007 KÜMÜLATİF (10)	2008 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA				
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)		
6118	420	2007K120690	Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma	ÖZEL BÜTÇE	2010	Adana		9.030	5.483			2.000						2.000	
6119	420	2009K120560	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2009	Adana		5.950	0			5.950						4.361	
<b>TOPLAM</b>								<b>14.980</b>	<b>5.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.361</b>

<b>GENEL TOPLAM</b>								<b>99.711</b>	<b>63.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.550</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.293</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	--------------	----------	----------	----------	---------------
