



# **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**



## **2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**





*Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.*

*Mustafa Kemal Atatürk*



## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	iv
1-GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	1
1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	2
1.3. 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	5
1.4. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	6
2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ.....	7
2.1.1. Etüt-Proje İşleri.....	7
2.1.2. Devam Eden Projeler.....	7
2.1.3. Yeni Projeler.....	17
2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ.....	18
2.2.1. Devam Eden Projeler.....	18
2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	19
2.3.1.Devam Eden Projeler.....	19
2.3.2.Yeni Projeler.....	22
2.4.DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ.....	22
2.4.1. Devam Eden Projeler.....	22
2.4.2. Yeni Projeler.....	23
3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU.....	24
<i>Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....</i>	<i>29</i>

## 1-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

- A- Özel Bütçe
  - a- Hazine Yardımı
  - b- Öz Gelirler
    - Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
    - Kira Gelirleri
    - SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
    - Öğrenci Harçları
    - İkinci Öğretim Gelirleri
    - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
    - Uzaktan Öğretim Gelirleri
  - c- Şartlı Bağış ve Yardımlar
- B- Döner Sermaye
- C- Bütçe Dışı Kaynak
  - a- TÜBİTAK Projeleri kaynağı
  - b- SAN-TEZ Projeleri kaynağı
  - c- AB Projeleri kaynağı
  - d- Diğer Proje kaynağı

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralınması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların

eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerini gelirlerimize yasal dayanak olarak sayabiliriz.

## 1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Üniversite'nin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversite'nin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

2016 yılında Çukurova Üniversitesi, 17 Fakülte, 12 Meslek Yüksek Okulu, 4 Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı ve 35 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, akademik personel lojmanları ve 4.000 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşkenin içerisinde yer almaktadır.

Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizmiştir. Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır. Ulaşım, şehir ile yerleşke arasında düzenli olarak çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır.

Yerleşke dışında, şehir merkezinde bulunan Adana Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

İlçelerde bulunan eğitim kurumları ise Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu,

Pozantı Meslek Yüksekokulu ile Tufanbeyli Meslek Yüksekokuludur. Ayrıca, Yumurtalık Araştırma İstasyonu ile Davudi dağında bulunan tesislerde de eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	KAPALI ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )
<b>Balcılı Kampüsü</b> (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	672.778
Adana MYO	9.771
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	2.678
Ceyhan MYO	9.375
Feke MYO	1.148
İmamoğlu MYO	3.366
Karaisalı MYO	5.560
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO	13.516
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)	6.990
Pozantı MYO	1.450
Teknik Bilimler MYO	1.284
Tufanbeyli MYO	649
POZMER	1.744
Aladağ MYO	948
Yumurtalık MYO	5.146
Sağlık Ocakları	5.494
Lojmanlar	1.550
<b>TOPLAM</b>	<b>743.447</b>



**Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcılı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.**

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m2)				AÇIKLAMA (*)
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	HAZİNE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	DİĞER (m <sup>2</sup> ) (*)	TOPLAM (m <sup>2</sup> )	
<b>Balcılı Kampüsü</b> (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	12.645.315	4.358.008	1.041.427	18.044.750	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			20.923	Üniversiteye ait
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	158.109	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	114.778	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	2.845	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	841	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			75.965	Üniversiteye ait
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO		102.729		102.729	Hazine arazisi
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)		441.738		441.738	Hazine arazisi
Pozantı MYO			1.756	1.756	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Teknik Bilimler MYO			16.196	16.196	Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Tufanbeyli MYO			22.451	22.451	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	683.185			683.185	Üniversiteye ait
Aladağ MYO		1.257		1.257	Hazine arazisi
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	458.244	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	56.134	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar	1.550			1.550	Şehir Merkezinde
<b>TOPLAM</b>	<b>13.780.927</b>	<b>5.152.616</b>	<b>1.269.908</b>	<b>20.203.451</b>	

2015-2016 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 52.157 öğrenci ile öğrenimini sürdürmektedir.

Üniversitemizde 2.188 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 489'u profesör, 210'u doçent, 313'i yardımcı doçent, 211'i öğretim görevlisi, 144'ü okutman, 764'ü araştırma görevlisi ve 73'ü uzmandır.

Üniversitemizde 2.461 idari personel, 139 sözleşmeli personel, 151 işçi ve 61 geçici işçi olmak üzere toplam 2.812 personel görev yapmaktadır.

2016 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜNVANI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Profesör	489	19	508
Doçent	210	8	218
Yrd. Doçent	313	92	389
Öğretim Görevlisi	211	49	260
Araştırma Görevlisi	764	177	941
Okutman	144	15	159
Uzman	73	16	89
<b>TOPLAM</b>	<b>2.188</b>	<b>376</b>	<b>2.564</b>

### 1.3. 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %100 oranında, Kampüs Altyapısı Projesinin 2015 yılı uygulaması %94 oranında, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2015 yılı uygulamasında Yumurtalık MYO ve Hukuk Fakültesi inşaatı %95 oranında, Anaokulu, Dış İlişkiler Binası ve Güvenlik Binası inşaatı %100 oranında, Tıp Fakültesi Amfi Binası inşaatı % 60 oranında, Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) ve Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi % 100 oranında, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri % 100 oranında, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi % 40 oranında tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında, binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sıhhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santrali ve telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampüs giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

2015 Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, CD writer, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım alımı, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile her türlü cihazlar, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz alımı, telefon santrali ve teçhizatı, park bahçe düzenlemeleri için tarımsal alet, traktör

teçhizatı, ısı merkezi için brülör, pompa sistem ve ekipmanları, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, buzdolabı, yer ocakları, hesap makinesi, jeneratör, fotokopi makinesi, faks cihazı, su pompası makine ve motorları, hidrofor, soğutma üniteleri ve kompresör alımları yapılmıştır.

2015 yılı yatırımları hedeflenen düzeyin üzerinde gerçekleşerek üniversitemiz eğitiminde kapasite artışı sağlanmıştır.

#### 1.4. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Kamu Hizmetleri (BAP) olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

2015 yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan 58.520.000 TL yatırım ödeneğine 33.295.603 TL eklemeye yapılarak toplam ödenek 91.815.603 TL ye çıkarılmıştır. Söz konusu ödeneğin ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda görüleceği üzere 91.094.303 TL si harcanılmıştır.

#### Çukurova Üniversitesi Proje Bazlı Yatırım Bütçesi

Sektör	Proje Numarası	KBÖ	Eklene	Harcama	Kalan
Eğitim	1997H030010	4.500.000	0	3.808.000	692.000
	1998H030440	17.398.000	16.834.037	34.232.037	0
	2015H030980	100.000	0	70.700	29.300
	2015H030990	5.000.000	6.022.790	11.022.790	0
	2015H031000	1.000.000	449.955	1.449.955	0
Spor	2014H050060	1.800.000	899.561	2.699.561	0
Sağlık	2014I000150	0	4.500.000	0	4.500.000
	2014I000160	18.000.000	7.811.274	25.811.274	0
	2015I000150	0	0	0	0
Bilimsel Araştırma	2014K120260	3.500.000	1.247.986	4.747.986	0
	2015K120210	7.222.000	30.000	7.252.000	0

## 2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

#### 2.1.1. Etüt-Proje İşleri

##### 2015H030980 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje için bütçeye 100.000 TL ödenek konulmuş olup proje süresi 2015 yılını kapsamaktadır. Yılı içerisinde Proje için 70.700 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Sağlık Hizmetleri MYO Binası Uygulama Projeleri ve İhale dökümanları hazırlanması İş, Tıpdam Binası Uygulama Projeleri ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması İş yaptırılmıştır.

#### 2.1.2. Devam Eden Projeler

##### 1997H030010 Kampüs Altyapısı Projesi

Proje için bütçeye 4.500.000 TL ödenek konulmuş olup proje 2015 yılından sonraya devam etmektedir. Proje kapsamında; Kampüs Muhtelif Kanalizasyon Drenaj Hattı Yapım ve Onarım İş, Kampüs İçi Muhtelif Ağ Panoları Tadilat Ve Onarım İş, Ana Isı Merkezi Ve Balcalı Hastanesi Isı Merkezi Doğalgaz Dönüşüm İş, Muhtelif Yerlerde Doğalgaz projesi Yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1997H030010
Projenin Adı	Kampüs Altyapısı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2015 Ödeneği	4.500.000 TL
Harcama	3.808.000 TL
Kalan Ödenek	692.000 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	85
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	94

**1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

Proje için bütçeye 17.398.000 TL ödenek konulmuş olup proje 2015 yılından sonraya devam etmektedir. Proje kapsamında, İletişim Fakültesi Stüdyo Binası(3.500m<sup>2</sup>), Yumurtalık MYO(8.500m<sup>2</sup>), Hukuk Fakültesi(10.500m<sup>2</sup>), TIPDAM Binası(5.000 m<sup>2</sup>), Mühendislik Otomatik Laboratuvarı Binası(4.000m<sup>2</sup>), Kuzey Çarşı Projesi(4.500m<sup>2</sup>), Tıp Fakültesi Amfi Binası(2.000m<sup>2</sup>), Tömer Binası(3.400m<sup>2</sup>), OSGB Binası(1.200 m<sup>2</sup>) ve Sağlık Hizmetleri MYO(6.000m<sup>2</sup>) yapım işleri yürütülmektedir. Söz konusu işlerin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1998H030440
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2015 Ödeneği	17.398.000 TL
Eklenen	16.834.037 TL
Harcama	34.232.037 TL
Kalan Ödenek	0,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	70

**Projeye ait bilgi ve görseller****İletişim Fakültesi Stüdyo Binası İnşaatı**

Söz konusu işe ait ihale 12.11.2012 tarihinde yapılmış olup ihale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



### **Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı**

Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı Yapım İşi A1, A2, B ve C blok olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. İşin ihalesi 18.10.2012 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında blokların Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır.



**Hukuk fakültesi İnşaatı**

Hukuk Fakültesi İnşaatı Yapım ihalesi 17.12.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

**Dış İlişkiler Binası İnşaatı**

Dış İlişkiler Binası İnşaatı ihalesi 12.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Proje 2015 yılında tamamlanarak bina kullanıma açılmıştır.





### Güvenlik Binası Yapım İşi

Güvenlik Binası bodrum + zemin kattan oluşmakta olup toplam brüt kapalı alanı 532 m<sup>2</sup> dir. Bina batı cephesi önüne yaklaşık 160 m<sup>2</sup>'lik üstü kapalı otopark yapılması planlanmaktadır. Proje 2015 yılında tamamlanarak bina kullanıma açılmıştır.







### **Anaokulu Binası**

Anaokulu İnşaatı Yapım işi ihalesi 05.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. 10 Adet sınıfı 1 adet yemekhanesi 1 adet sanat atölyesi bulunmakta olup 1 katlıdır. Proje 2015 yılında tamamlanmıştır.



**Otomotiv Laboratuvarı Yapım İşi**

Söz konusu işe ait ihale 14.04.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Toplam yapı alanı 4.500 m<sup>2</sup> dir. Proje 2016 yılında tamamlanacaktır.

**Şoförler Odası Binası Yapım İşi**

Söz konusu işe ait ihale 18.04.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Proje 2015 yılında tamamlanarak bina kullanımına açılmıştır.



### Kuzey Çarşı Projesi Yapım İşi

Toplam kapalı alan 3000 m<sup>2</sup> proje kapsamında dükkânlar, sinema salonları, sosyal donatılar mescit bulunmaktadır. Proje kapsamında 23 adet dükkân, 1 adet sinema salonu, 9 adet kafeterya, 1 adet postane, 1 adet sergi salonu, 1 adet saat koleksiyonu, 1 adet mescit, 19 adet WC, 3 adet engelli WC ve 7 adet ATM bulunmaktadır. İşin 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.



**Tıp Fakültesi Amfi Binası Yapım İşi**

Söz konusu işe ait ihale 24.11.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



**Tömer Binası Yapım İşi**

Söz konusu işe ait ihale 15.01.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Projenin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

**OSGB Binası Yapım İşi**

Söz konusu işe ait ihale 28.01.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



### Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapımı İşi

Sağlık hizmetleri MYO binası Yapım İşi ihalesi 05.05.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



### 2.1.3. Yeni Projeler

#### 2015H030990 Muhtelif İşler

Proje için bütçeye 5.000.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 6.022.790 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılı içerisinde Proje için konulan ödenek ve eklenen ödenek toplamı 11.022.790 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yerleşke içi binaların bakım onarım ve tadilatı, makine teçhizat alımı, donanım yazılım bakımı ve yayın alımı işleri yapılmıştır.

#### 2015H031000 Yayın Alımı

Proje için bütçeye 1.000.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 449.955 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 1.449.955 TL ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü harcanılmıştır. Bu proje kapsamında 2015 yılında toplam 61 adet veri tabanı aboneliği yapılmıştır. Söz konusu veri tabanlarının 35 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla, 22 adedine TÜBİTAK EKUAL (TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığıyla, 4 adedine ise satın alma yoluyla erişim sağlanmıştır. Ayrıca 2015 yılında, kütüphanemize 2.078 adet satın alma ve 490 adet bağış yolu ile olmak üzere toplam 2.568 adet basılı kitap kazandırılmıştır.

## 2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 2.2.1. Devam Eden Projeler

#### 2014H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

06.08.2014 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Fitness Salonu, Sukuaj salonu, koşu pisti, ağırlık kaldırma merkezi ve fizik tedavi odaları bulunmaktadır. Söz konusu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni imalatları bulunmaktadır. Projenin diğer kısmı olan Açık spor tesisi yapım işi için ise 2015 yılı içerisinde ihale yapılmış ve yapımına 2016 yılında başlanılmıştır. Her iki kısma ait yapım işinin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014H050060
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı/Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
2015 Ödeneği	1.800.000 TL
Ek Ödenek	899.561 TL
Harcama	2.699.561 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	40

## Projeye Ait Görsel



## 2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.3.1.Devam Eden Projeler

#### 2014I000160 Muhtelif İşler

Proje kapsamında Balcalı hastane binası bakım onarım ve tadilat işi, makine teçhizat alımı ve Balcalı Hastanesi Ameliyathane Yapım Bakım ve Onarım işi yapılmaktadır.


Proje kapsamında yaptırılan Ameliyathane yapım işi ihalesi 13.10.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Toplam Yapı Alanı 5000 m<sup>2</sup> dir. Söz konusu iş kapsamında 32 adet Ameliyathane, 10 adet Anestezi Hoca Odası, 4 adet Ofis, 1 adet Tıbbi Malzeme Odası, 4 adet Yatak Odası(Bay-Bayan), 3 adet Temizlik Odası, 2 adet Robotik-Transplant Odası, 1 adet Cihaz Odası, 1 adet Postop Ünitesi Odası, 3 adet Dinlenme Odası, 3 adet Depo, 1 adet Otomasyon Odası, 3 adet WC Grubu ve Duş, 3 adet Derslik, 1 adet Mescit ve Abdesthane, 1 adet Kantin, 1 adet Mutfak, 4 adet Oksijen Merkezi, 4 adet Elektrik Odası, 6 adet Asansör, 4 adet Giyinme Odası (Bay-Bayan), 1 adet Frozen Odası, 2 adet Pre-op Odası(Yetişkin-Çocuk) ve 1 adet İlaç hazırlama odası bulunmaktadır.

Söz konusu projenin 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.



Proje No	2014I000160
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
2015 Ödeneği	18.000.000 TL
Yıl İçerisinde Eklenen	7.811.274 TL
Harcama	25.811.274 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	50

### Projeye Ait Görseller

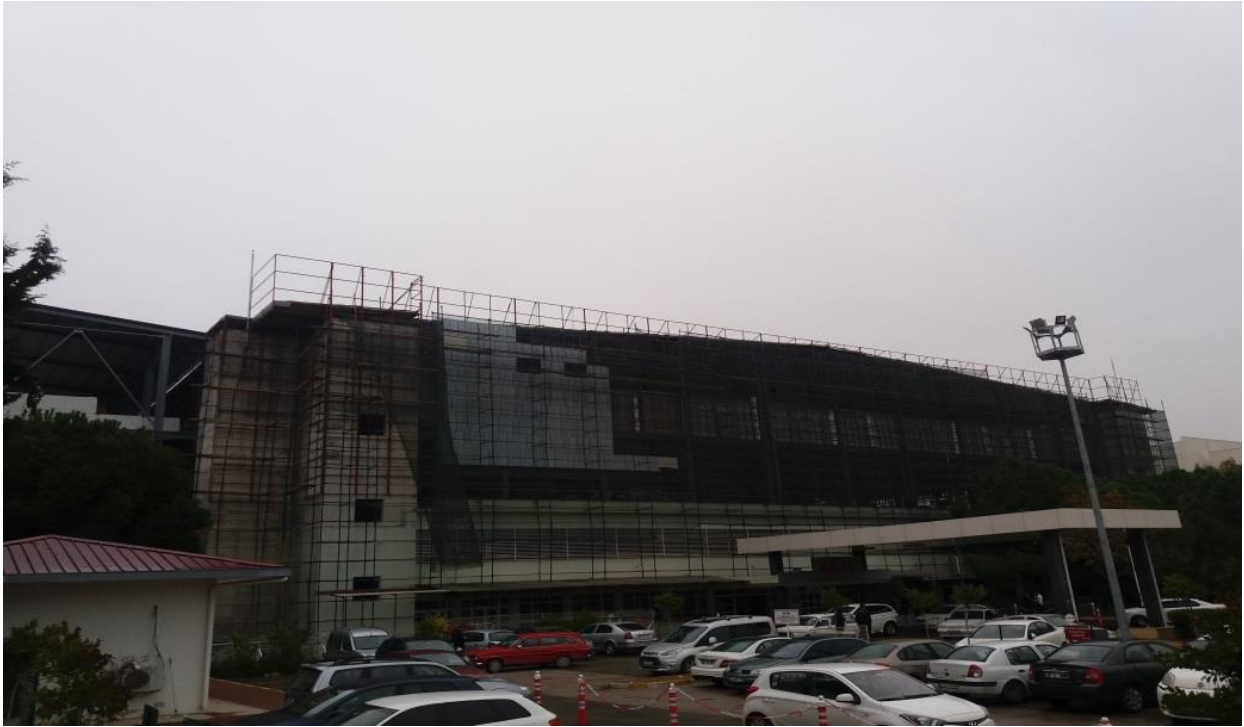



#### 2014I000150 Onkoloji Hastanesi

2015 yılı yatırım programında yer alan Onkoloji Hastanesi Yapım İşi 2014 yılında programa alınmış, 30.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İhaleye ilişkin itiraz ve itirazın şikayet başvuruları sonuçlandırılmış ve 2016 yılı içerisinde yer teslimi yapılmıştır.

Proje No	2014I000150
Projenin Adı	Onkoloji Hastanesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
2015 Hazine Ödeneği	0 TL
2015 Hibe Ödeneği	4.500.000 TL
Harcama	0 TL
Kalan Ödenek	4.500.000 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0

## Projeye Ait Görsel



### 2.3.2.Yeni Projeler

#### 2015I000150 İdari Bina

2015 yılı Yatırım Programında yer alan proje 2016 yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. Projeye ilişkin 2015 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmamıştır.

## 2.4.DKH- SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

### 2.4.1. Devam Eden Projeler

2015 yılı yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi 2014 yılında programa alınmış olup 25.11.2014 tarihinde söz konusu projenin yapım ihalesi yapılmıştır. Projenin 2016 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. İhale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014K120260
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2015 Ödeneği	3.500.000 TL
Yıl İçerisinde Eklenen	1.247.986 TL
Harcama	4.747.986 TL
Kalan Ödenek	0,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	80

### Projeye Ait Görsel



### 2.4.2. Yeni Projeler

#### 2015K120210 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje için bütçeye 7.222.000,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 30.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 7.252.000,00 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü bütçe gideri yapılarak BAP hesabına aktarılmıştır. Bu proje kapsamında büro makineleri alımı, bilgisayar alımı, tıbbi cihaz alımı, laboratuvar cihazı alımı, diğer makine ve teçhizat alımı, laboratuvar gereçleri alımı ve hareketli iş makinaları alımı yapılmıştır.

## 3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU

## 2015H030980 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2015H030980					
Proje Adı :	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Alt sektör:	EĞİTİM – YÜKSEK ÖĞRETİM					
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.					
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2015-2015					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		100.000			100.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)						
2015		70.700			70.700	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2015H031000 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2015H031000					
Proje Adı :	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör: Eğitim Sektörü	EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM					
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2015-2015					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.000.000			1.449.955	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)						
2015		1.449.955			1.449.955	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2015I000150 İdari Bina

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2015I000150					
Proje Adı : İdari Bina	İdari Bina (Tıbbi Atık + Mutfak)(Döner Sermaye)					
Sektör/Alt sektör:	Sağlık Sektörü					
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	İnşaat					
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2015-2015					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
(Döner Sermaye)		3.500.000			3.500.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)						
2015		0,00			0,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2015K120210 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2015K120210					
Proje Adı :	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Alt sektör:	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	İleri Arş., Mak.Teç.					
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2015-2015					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		7.222.000			7.252.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)						
2015		7.252.000			7.252.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.



#### 4-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde, rekabetin sağlanabilmesi için özellikle teknolojik yatırımlara önem verilmelidir.

Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

2015 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		258.738			208.904			29.798			54.004			53.283
Sağlık	3		86.582			11.810			18.000			25.811			25.811
D.Kamu Hizm.	2		19.782						10.722			12.000			12.000
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>		<b>365.102</b>			<b>220.714</b>			<b>58.520</b>			<b>91.815</b>			<b>91.094</b>
