

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.

Gayi m. Kemal

İÇİNDEKİLER

1- GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	1
1.3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	9
1.4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	14
2- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	16
2.1. Devam Eden Projeler	16
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri	16
2.2. Tamamlanan Projeler	20
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi	20
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu	21
3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER	28

TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı	2
Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar	3
Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar	3
Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları	4
Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları	5
Tablo 6 2024 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler	9
Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı	14
Tablo 8 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı	14
Tablo 9 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı	15
Tablo 10 2024 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı	15
Tablo 11 2024 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı	16
Tablo 12 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi	20
Şekil 1 2024 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı	1
Şekil 2 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı	15

EKLER

Ek 1 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	29
--	----


1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemizin, 2024 Yılı Yatırım Programında 14 adet projesi bulunmakta olup, bu projelerin finansman kaynağını; Hazine Yardımı, Öz Gelir (İkinci Öğretim Gelirleri, Uzaktan Öğretim Gelirleri, Kira Gelirleri, Araştırma projeleri gelir payı) ve Şartlı Bağış ve Yardımlar oluşturmuştur. Projeler için 769.832.617 TL Hazine Yardımı, 32.503.000 TL Öz Gelir ve 2.713.925 TL Şartlı Bağış ve Yardımlar olmak üzere toplam 805.049.542 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Şekil 1 2024 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı

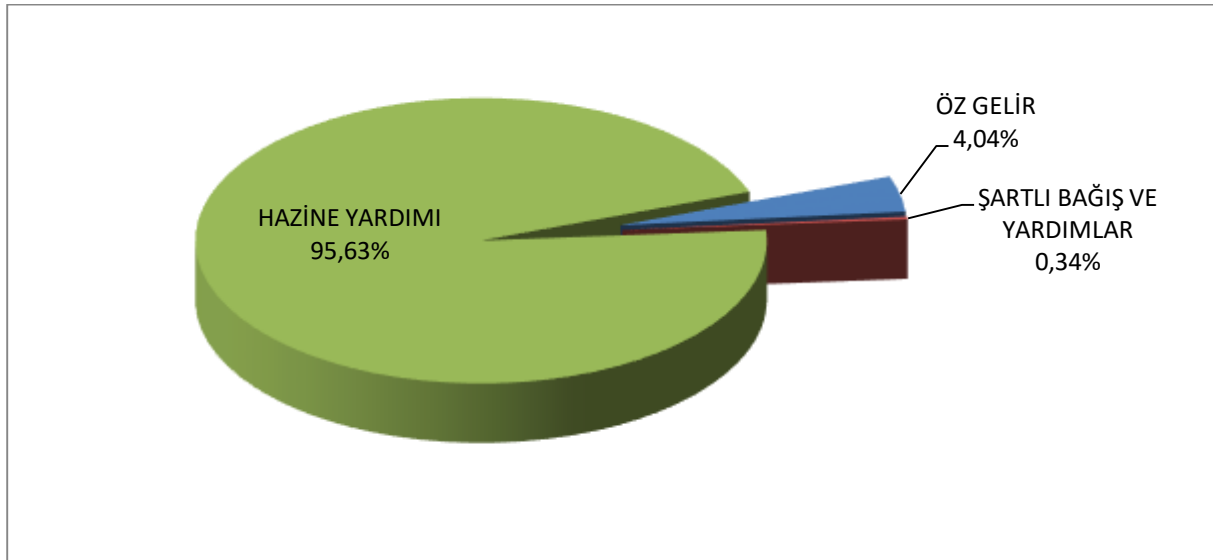

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemizde 19 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu'nda hizmet verilmektedir. Üniversitemiz toplamda 17.513.647 m² açık alana 677.021 m² kapalı alana sahiptir.

Balcalı Yerleşkesi'nde idari binalar, eğitim binaları, tam teşekküllü üniversite hastanesi, merkezi kütüphane, personel ve öğrenci yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, kayıkhanesi, botanik bahçesi, laboratuvarlar, kongre merkezi, kongre ve toplantıların yapılabileceği farklı kapasitelerde amfiterenler, açık hava amfi tiyatrosu, kuzey çarşısı, anaokulu, personel lojmanları, banka şubeleri ve ATM'leri, süpermarket, çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Ayrıca

Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin araştırma projeleri ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yürütüldüğü yaklaşık 7.000 dekar arazi varlığına sahip Araştırma ve Uygulama Çiftliği Balcalı kampüsü içerisinde bulunmaktadır.

Yerleşke dışında ise il merkezinde; Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; ilçelerde Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ve Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir.

Üniversitemiz kapalı alanının sunulan hizmet türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1 Kapalı alanların dağılımı

AÇIKLAMA	KAPALI ALAN MİKTARI (m ²)
Eğitim Alanları	277.653
Araştırma Alanları	8.561
Sosyal Alanlar	27.777
Spor Alanları	36.100
İdari Alanlar	60.608
Sağlık Alanları	146.036
Kütüphane Alanları	17.816
Barınma Alanları	37.752
Toplantı ve Konferans Alanları	28.615
Diğer Alanlar	36.103
TOPLAM	677.021

Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymaları, enerjilerini bu yönde kullanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösteren spor dalları; Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, Basketbol, Futbol, Salon Futbolu, Voleybol, Hentbol, Güreş, Kürek, Kano, Tekvando, Karate, Bilek Güreşi, Bisiklet, Boks, Spor Tırmanışı, Kick Boks ve Korumalı Futbol branşlarını kapsamaktadır.

Spor Müdürlüğümüz bünyesinde üniversitemiz de her yıl düzenlenen Ünilig müsabakaları Fakülte ve Yüksekokul ile Meslek Yüksekokulları arasında Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis branşlarında yapılmaktadır. Ayrıca Üniversiteler arasında her yıl yapılmakta olan Ünilig müsabakalarına üniversitemizi temsilen okul takımlarımız branşlarına göre katılım sağlamaktadır. Sakıp Sabancı ve Spor Sergi Sarayı her yıl düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Spor Tesislerimizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sabancı Vakfı tarafından kontrol edilen Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitimi ve Rehabilitasyon Derneğinin (TOSSD) işbirliği ile Adana ili ve çevresinde bulunan yedi ilden gelen engelli çocuklara tesislerimizde sağlık taramaları yapılmakta ve Basketbol, Atletizm, Futbol ile Yüzme branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi müsabakasına ev sahipliği yapılmaktadır.

Üniversitemizin mevcut bilgi ve teknolojik kaynakları ile yazılım alt yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2 Bilgi ve teknolojik kaynaklar

Taşınır Kod Listesi	ADET
Masaüstü Bilgisayarlar (Masaüstü Bil., Server Bil., Thin Client ve Kasa+Ekran)	7.923
Dizüstü Bilgisayarlar	2.026
Tablet Bilgisayarlar	300
Cep Bilgisayarları	8
Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar	615
Blade Sunucular	1
Raf Sunucular	5
Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	50
Yazıcılar ve Okuyucular	4.412
Tarayıcılar	472
Yedekleme Cihazları (Harici Yedekleme Üniteleri)	2.085
Fotokopi Makineleri	168
Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	148
Swichler (Anahtarlar)	597
Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	138
İletişim Ağ Cihazları	38
Firewall Cihazları	3
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	1.342
Tepegözler (Slayt Cihazları)	44
Fotoğraf Makineleri	313

Tablo 3 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar

Yazılım	Yazılım Edinim Şekli			
	Bilgi İşlem	Satın Alma	Kiralama	Kamu Kurumu
Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)		X		
Ansys Akademik Lisans		X		
Autocad Akademik Lisans			X	
Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi				X
Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS)	X			
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)				X
Program Bütçe (Bütçe Takip)				X
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EOBS)	X			
Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)		X		
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)				X
EndNote Akademik Lisans			X	
Hizmet Takip Programı (HİTAP)				X
Akademisyen Bilgi Sistemi (ABS)	X			
İşçi ve Sözleşmeli Maaş Programı	X			
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)				X
Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS)		X		
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)				X
Matlab Akademik Lisans			X	
MDAEMON Mail Yazılımı		X		
Yükseköğretim Mekanları Envanter Sistemi (YMESS)				X
Microsoft Akademik Lisans			X	
Netcad Akademik Lisans		X		
Online Sınav Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			
OSKA Yazılım			X	
Personel Özlük İşleri Programı	X			
Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS)		X		
SPSS Akademik Lisans		X		
Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-SGB)				X

Yazılım	Yazılım Edinim Şekli			
	Bilgi İşlem	Satın Alma	Kiralama	Kamu Kurumu
Kalite Yönetim Sistemi (KYBS)	X			
VM Ware Sunucu Sanallaştırma İşletim Sistemi		X		
Windows Office Paketleri			X	
Akademik Başvuru Sistemi (ABSİS)	X			
Adobe Creative Cloud			X	
Etkinlik Yönetim Sistemi (EVENTS)	X			
Çukurova Mobil APP	X			
Kütüphane Otomasyon Ssitemi (LIBRA)		X		
Kitap Takip Sistemi (KİTS)				X
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			

Üniversitemizde kullanılan taşıtların cinsi ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4 Taşıtlarının cinsi ve sayıları

TAŞITIN CİNSİ	MEVCUT TAŞIT SAYISI	HİZMET ALIMIYLA KULLANILAN TAŞIT SAYISI
Binek otomobil	15	6
Station-Wagon	11	0
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik)	12	0
Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik)	14	0
Panel	5	0
Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	0
Otobüs (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik)	3	0
Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)	3	0
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	5	0
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	2	0
Ambulans (Tıbbi donanımlı)	2	0
Motosiklet (En fazla 600 cc. lik)	2	0
Motosiklet (En az 601 cc. lik)	1	0
TOPLAM	76	6

Araştırma ve eğitimin en önemli destek birimi olan Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, 8.000 m²'lik kapalı alanı bulunan binasında aynı anda 850 okuyucunun yararlanabileceği 4 okuma ve çalışma salonları, 1 sergi, 1 engelli okuma salonu, 1 konferans salonu yer almaktadır. Kütüphanemizde 217.786 basılı ve 982.920 elektronik kitaba ulaşılabilmektedir. Kütüphanemizde 2024 yılı itibarıyla 1.494 kalem basılı süreli yayın arşivi ile 64.918 adet elektronik süreli yayınıımız bulunmaktadır. Online olarak erişim yapılabilen tez sayısı 3.885.000 adet üzerinde olmakla birlikte elektronik kaynaklardan yaklaşık 722.000 adet yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirmesi gerçekleştirilmiştir. Eski yıllara ait dergiler de, süreli yayınlar bölümü görevlilerince okuyucunun istifadesine sunulmaktadır. Nadir Eserler Bölümü'nde 70 adet el yazması, 849 adet eski harfli basma eser bulunmaktadır.

İnternet aracılığıyla kütüphanemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM) erişilebilmektedir.

Kütüphanemiz, 2024 yılında toplam 78 adet veritabanına abone olmakla birlikte bu veritabanlarının 20 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla, 49 adedine TÜBİTAK EKUAL, TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

aracılığıyla, 9 adedine ise doğrudan firmalardan satın alınma yöntemiyle erişim sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinin abone olduğu veri tabanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
1	Academic Search Ultimate
2	Akademisyen Online Veritabanı (AOV)
3	AMA Journals
4	Annual Reviews
5	Applied Science & Business Periodicals Reprospective
6	Applied Science & Technology Index Reprospective
7	Art Index Retrospective
8	AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Mrk.)
9	BMJ Journals
10	Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
11	Business Source Ultimate
12	CAB Abstracts
13	Cambridge Journals Online
14	Central & Eastern European Academic Source
15	Clinical Key
16	Dynamed
17	EBSCO Discovery Services
18	Ebook Central Open Access Collection
19	EBSCO E-Book Super Collection
20	Education Index Retrospective 1929-1983
21	Elsevier E-Books
22	Emerald
23	Emerald Social Sciences e-Book Collection
24	ERIC
25	Essencial Science Indicators
26	European Views of the Americas: 1493-1750
27	GreenFILE
28	Hein Online
29	Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
30	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
31	İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı
32	İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı
33	InCites Benchmarking& Analytics
34	İktisat İşletme Finans Dergisi
35	İntihal.net
36	IThenticate
37	Journal Citation Reports (JCR)
38	JSTOR
39	Legal Online Veritabanı
40	Library, Information Science & Technology Abstracts
41	Lexpera
42	MasterFILE Complete
43	MasterFILE Reference eBook Collection (EBSCOhost)
44	Math Science Net
45	Medline
46	Mendeley
47	Military Big Data (MILDATA)
48	Nature Academic Journals
49	Nature Journals
50	Newspaper Source Plus
51	Newswires
52	Open Dissertations
53	OVID Journals

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
54	Oxford Online Journals
55	Palgrave Macmillan Journals
56	Pooltext Report
57	ProQuest Agricultural Science Collection
58	Proquest Dissertations and Thesis
59	Regional Business News
60	SAGE Journals Online
61	Science Direct
62	Scopus
63	SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
64	Social Sciences Index Retrospective: 1907 - 1983
65	Springer Biomedical & Life Sciences E-Books
66	Springer Engineering E-Books
67	Springer Link
68	Taylor & Francis Online Journals
69	Teacher Reference Center
70	The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCOhost)
71	Wiley Online Library
72	Thieme (2018 ve öncesi erişim)
73	TR Dizin (ULAKBİM Platformu)
74	Turnitin
75	UpToDate
76	Web News
77	Web of Science(SCI, SSCI, AHCI)
78	Wiley E-Books

Üniversitemizde 2.889 kişilik akademik personel kadrosu olup, bu kadrolardan 2.057'si doludur. Ayrıca 28 kişi sözleşmeli akademik personel olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında İdari personel için 4.439 kişilik kadro tahsis edilmiş olup, bunlardan 2.551'i doludur. Ayrıca, 181 sözleşmeli idari personel, 2.169 işçi ve 32 geçici işçi bulunmaktadır.

Üniversitemiz akademik ve idari personel kadrosu ile 43.208 I. Öğretim öğrencisi, 4.150 II. Öğretim öğrencisi ve 1.509 Uzaktan Öğretim öğrencisi olmak üzere toplam 48.867 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlardan 3.473 öğrenci Tezli Yüksek Lisans, 657 öğrenci Tezsiz Yüksek Lisans ve 1.464 öğrenci Doktora programlarında eğitim-öğretim hizmeti almaktadır.

Üniversitemiz Tarım ve Gıda, Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimler, Enerji ve Çevre ve Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik gibi öncelikli alanlara yönelerek çalışmalarına bu yönde devam etmektedir. Öncelikli alanlara yönelik hizmet veren uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere Üniversitemizde toplam 38 adet araştırma ve uygulama merkezi faaliyet göstermektedir. Merkezler dışında güçlü ve deneyimli kadroya sahip akademik birimlerle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Araştırma ve Geliştirme Stratejileri Koordinatörlüğü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Çukurova Teknokent A.Ş. araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve hizmet vermektedir.

Üniversitemiz araştırma faaliyetleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından koordine edilmektedir. BAP, Üniversitemizdeki araştırma projelerinin idari ve mali süreçlerini web tabanlı bir yazılım (BAPSİS) ile yürütmektedir. Üniversitemiz iç kaynaklı proje türlerinden Genel Amaçlı Projeler (GAP), Tez Projeleri (TEZ), İş Birlikli Projeler (İBP) ve Tohum Projeler (TP) olmak üzere 4 grup altında desteklenmektedir. Üniversitemiz araştırma-geliştirme altyapısının önemli kısmı birimlerin ilgili laboratuvarlarında bulunmaktadır. Ayrıca

en yeni teknolojilerle donatılmış, tüm birimler ve üniversite dışı kurumlara destek veren ÇÜMERLAB, Subtropik Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Biyoteknoloji), Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarı öğretim elemanlarımıza önemli altyapı desteği sunmaktadır.

Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunumu Balcalı Hastanesi, Medikososyal Merkezi ve Dış Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Balcalı Hastanemizde; 1 Acil Servis, 52 Poliklinik, 10 Yoğun Bakım Ünitesi, 35 Ameliyathane, 47 Klinik, 7 Laboratuvar, 1 Radyoloji Alanı, 2 Nükleer Tıp Alanı, 1 Onkoloji Ek Hizmet Binası, 1 Kan Merkezi, 1 Yanık Ünitesi, 4 Sterilizasyon Alanı, 1 Eczane, 1 Hemodiyaliz, 1 Çamaşırhane ve 6 Teknik Servis bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 77 Anabilim dalında bilimsel araştırma ve uygulama yapılmakta ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Hastanemizin idari yapısı 1 Başhekim, 6 Başhekim Yardımcısı ve 1 Hastane Başmüdürü, 1 Hastane Müdürü, 5 Hastane Müdür Yardımcısı, 1 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, 2 Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Eczacılık Hizmetleri, Teknik Koordinatörlük ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetleri ve idari hizmetler bu idari teşkilat ve bu birimlerde görev yapan personel ile yerine getirilmektedir.

Hastanemizin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler neticesinde hasar alması sebebiyle 2024 yılında acil servis yatak sayısı 17, yoğun bakım yatak sayısı 109, klinik yatak kapasitesi 652'ye düşmüştür. Bunun yanı sıra Hastanemizde 2.486 Acil Servis Hizmetleri, 4.999 Yoğun Bakım, 40.375 Klinik, 48.020 Ameliyat, 502.086 Poliklinik, 262.681 Laboratuvar Hizmetleri, 152.292 Radyoloji Ünitesi Hizmetleri, 13.202 Nükleer Tıp Hizmeti verilmiştir. Deprem dolayısıyla bazı birimlerimiz geçici olarak yeşil alanlarımızda bulunan konteynerler ile Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Veterinerlik Fakültesi Binası ve Yüreğir Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda hizmet vermeye devam etmektedir.

Sağlık hizmetlerinin en zor ve ileri aşaması yoğun bakım hizmetleridir. Hastanemiz, ülkemizin en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden birisidir. Modern ünitelerde her türlü yoğun bakım hastası izlenebilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Hastanemiz merkez laboratuvarı, gelişmiş ülkelerin sağlık akreditasyonu olarak kabul ettiği JCI akreditasyonuna sahiptir. Bölgenin en büyük ve kapsamlılarından olan Kan Merkezimiz, 24 saat hizmet vermektedir. Tetkik örnekleri, pnömatik sistem (vakumlu hava ile taşıma) aracılığı ile laboratuvarlara iletilmektedir. Radyoloji bölümünde modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Hastanemizde tüm cerrahi alanlarda son teknoloji ile donatılmış cihazları ve alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile her türlü ameliyat yapılmaktadır. Hastanemizde 2024 yılında 1.029.141 hastaya sağlık hizmeti verilmiş, 48.020 adet ameliyat yapılmıştır.

Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezinde, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik tedavilerinin yapılmasının yanında; personel ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de tedavileri yapılabilmektedir.

Merkezimizde 2 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Polikliniği, 1 Psikiyatri ve 1 Dahiliye Polikliniği, 1 Cildiye Polikliniği, 1 Beslenme ve Diyet Polikliniği, 1 Diş Polikliniği, 3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Polikliniği olmak üzere toplam; 10 Poliklinikte hizmet verilmektedir.

Merkezimizde, 2024 yılında eğitim öğretim gören 591 öğrenciye psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, 2.277 öğrenciye Dâhiliye, Cildiye, Beslenme ve Diyet ve Psikiyatri hizmetleri, 473 öğrenciye diş polikliniği hizmeti, 4.190 öğrenciye Kurum İçi Eğitim, Danışmanlık, Hemşirelik Hizmeti, Sağlık Eğitim Hizmeti verilmiştir. Merkezimizde çoğunluğu öğrenci olmak üzere toplam 17.402 hastaya da sağlık hizmeti verilmiştir. Ayrıca Merkezde oluşturulan sağlık ekiplerince ayda bir Üniversitemiz Anaokulu çocuklarının sağlık taraması yapılmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültemiz, 141 diş ünitesi ile günde ortalama 800 hastaya hizmet vermektedir. Diş Hekimliği Fakültemiz 2024 yılında 279.240 hastaya sağlık hizmeti vermiş, 70.946 adet tetkik yapmıştır. Fakültemiz, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini tüm bölümleriyle alarak devlet üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesinde 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bunun yanında üniversitemizde engelli öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi tarafından, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen ve ihtiyacı olan tüm çocuklara protez ve kapsamlı rehabilitasyon sağlanması, uzuv kaybı yaşayan çocuklara özel bir Rehabilitasyon Merkezinin inşa edilmesi ve işletilmesi, Türkiye’de uzuv kaybı yaşayan çocuklar için çocuk rehabilitasyon alanında bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması olmak üzere kısa, orta ve uzun vadede ulaşılması öngörülen üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere Çocuk İyilik Merkezi (ÇÖİM) kurulmuştur.

1.3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Tablo 6 2024 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2024H03-232979	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje İşlerinin Yapılması	Yılı içerisinde proje kapsamında su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %20'si harcanmıştır.
Eğitim	2024H03-232971	Kampüs Altyapısı	-Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin Yapılması	Bakım İşletme Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacı mal alım işi, mekanik altyapı tadilat yapılması işi, kampüs içi çevre güvenlik imalatları yapım işi, Halk Sağlığı Binası kanalizasyon ve drenaj yenilenmesi işi, Kuzey Çarşı ve muhtelif yerlerde yol aydınlatılması yapılması işi, kampüs muhtelif yerlerde tadilat yapılması işi, altyapı tadilat ve onarım yapım işi, muhtelif mekanik altyapı işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi, galeri ve kazan dairelerinde altyapı ve onarım yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde elektrik tadilatlarının yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlere kamera ve alarm tesisatı yapılması işi, su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi, göl pompası kurulumu yapılması işi, Ziraat Fakültesi galeriler ve muhtelif kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, Tıp Fakültesi Dekanlığının ana ısı merkezinden ısıtılması işi, Balcalı Hastanesi acil girişi yol genişletilmesi işi gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %90'ı harcanmış olup, projenin 2024 yılı için planlanan işlerinin fiziki gerçekleşme oranı %100'dür. Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin yapılması ile kampüs altyapısında iyileşme ve daha kaliteli hizmet sunumu sağlanmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2024H03-232983	Yayın Alımı	- Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2024 yılında içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 78 adet olup, yıl içerisinde 14 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 585 adet basılı kitap alınmıştır.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanmıştır. Yapılan alımlarla; 982.920 adet elektronik kitap, 64.918 elektronik dergi sayısına ulaşılmıştır.
Eğitim	2024H03-232946	Muhtelif İşler	-Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-5 (1 adet) Alımı	Kongre Merkezi ve Amfideki arızalı hoparlörlerin bakım ve onarımı işi, İlahiyat Fakültesi tadilat ve onarım işi, Rektörlük Makam odaları ahşap yüzeylerin boya yapılması yapım işi, Rektörlük Dinlenme Odası WC tadilat yapılması işi, Rektörlük Makam Odaları parke yapılması işi, Açık Amfi Tiyatro ile Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO besleme hattı tadilat işi, muhtelif galeriler ve kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, muhtelif jeneratörlerin periyodik bakım ve onarım işi, İletişim Fakültesi merkezi iklimlendirme onarım işi, hizmet binaları muhtelif tadilat ve onarım işi, muhtelif yerlerde merkezi iklimlendirme sistemi onarımı yapılması işi, R1, R2, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Su Ürünleri Fakültesi binaları tadilat ve onarım işi, Mithat Özsan Amfi parke tadilat işi, Adana MYO A Blok tadilat işi, güvenlik binası yapım işi, SABİDAM Binası havalandırma ve iklimlendirme yapım işi, İktisadi Ve İdari Birimler Fakültesi 1. Blok tadilat işi, Kütüphane Binası tadilat ve onarım işi, Karaisalı MYO dış cephe tadilatı işi, muhtelif yerlerdeki içme suyu kazan dairesi ve soğutma grubu alanlarının bakım ve kontrollerinin yapılması işi, kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılmak üzere boya alımı işi, muhtelif jeneratörlerin arıza-onarım işlerine yönelik mal alım işi, Bakım İşletme Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacı mal alım işi, Halk Sağlığı Binası güçlendirme, tadilat ve onarım işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi, muhtelif büro makineleri yedek parça, muhtelif büro mefruşat, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, muhtelif bilgisayar yardımcı parçaları, klima, tarayıcı, lazer yazıcı, network kayıt cihazı, projeksiyon cihazı, televizyon, cep telefonu, dış cephe temizleme makinesi, elektrikli süpürge, yedekleme ünitesi, muhtelif elektrik-elektronik ve aydınlatma malzemeleri, midibüs araç, telefon santrali, yedek parça ve muhtelif telefon, beslenme ve mutfak cihazları, hasta simülasyon sistemi ve merkez vakum sistemi alımları gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %84'ü harcanmıştır. Eğitim kalitesinin artırılması, derslik alanlarının iyileştirilmesi amacıyla büro mefruşat, büro makineleri, bilgisayar ve yazılım alımları vb. ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca idari işlerde kullanılmak üzere 1 adet midibüs alınmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2022H03-187403	Derslik ve Merkezi Birimler	-Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	Eğitim Binası Yapımı (20.000 m ²)	Proje kapsamında etüd-proje işlemlerine başlanılmıştır.	Projeye ait ödeneğin %5,i harcanmıştır.
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor-	2024H05-232985	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	- Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat Alımı	Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu trafosuna kompanzasyon panosu yapım işi gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğin %18'i harcanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de iyileşme sağlanmıştır.
Sağlık	2022I00-190075	Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina	,	Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina Yapımı (3.600 m ²)	Proje kapsamında yapılan yemekhane binasının kaba inşaatı, elektrik, mimari ve mekanik imalat işleri tamamlanmış olup, son hakediş ve kesin hesap ödemeleri 2025 yılına sarkmıştır.	Projeye ait ödeneğin %69'u harcanmış olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı %90'dır. Hastanemiz beslenme ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanması ve çocuk infüzyon kliniğinin çocuk hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla projeye ait son hakediş ve kesin hesap ödemeleri 2025 yılında tamamlanacaktır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Sağlık	2024100-224830	Deprem Muhtelif İşler	-Makine Teçhizat	Makine-Teçhizat Alımı	Proje kapsamında C kollu röntgen cihazı, renkli doppler usg cihazı, KBB endovizyon görüntüleme sistemi, argon lazer cihazı, operatif plazma kinetik rezekteskop seti, kuvöz, lazer yazıcı, ultrasonografi sistemi, termosifon, televizyon, muhtelif mefruşat ve tefrişat malzeme, laparoskopik kayıt sistemi, ekran, klima, lineer eus probu, led ışık kaynağı ve fiber optik kablo, üst düzey ameliyat mikroskobu, diyet lazer cihazı, cerrahi duman tahliye cihazı, yıkama dezenfeksiyon kurutma makinesi, hidrojen peroksit düşük ısı sterilizatörü, sinir monitörü, dijital röntgen cihazı, sabit renkli doppler ultrasonografi cihazı, rektoskop cihazı ve yüksek güçlü holmium lazer cihazı alımları gerçekleştirilmiştir.	Projeye ait ödeneğinin %100'ü harcanmış olup, sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve alet alımları tamamlanmıştır.
Sağlık	2022100-185710	Deprem Çocuk Hastanesi	,	Etüt-Proje İşlerinin Yapılması, Hastane Binası Yapımı (250 yatak, 51.000 m ²)	Proje kapsamında etüd-proje işlerine başlanılmıştır.	Projeye ait ödeneğinin %28'i harcanmış olup, ilgili proje yapım aşamasına başlanmadan 2024 yılında sonlanmıştır.
Sağlık	2023100-216793	Deprem Hastane İnşaatı	,	Etüt-Proje İşlerinin Yapılması, Hastane İnşaatı Yapımı (80.000 m ² , 400 yatak)	Proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihaleye çıkmış olup, 400 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi uygulama projeleri ile ihale dosyası hazırlanması işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğinin %14'ü harcanmış olup, ilgili proje yapım aşamasına başlanmadan 2024 yılında sonlanmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Sağlık	2023100-231525	Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme	-Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme -A Blok Deprem Güçlendirme -B Blok Deprem Güçlendirme	Büyük Onarım (91.500 m ²)	Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında Ç.Ü. Balcalı Hastanesi poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve onarım işi tamamlanmış olup, son hakediş ve kesin hesap ödemeleri 2025 yılına sarkmıştır. B Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında ihaleye çıkılmış ve güçlendirme işine (fiziki gerçekleştirme oranı %30) başlanmıştır. Ayrıca Ç.Ü. Balcalı Hastanesi (A-B-Poliklinik, bağlantı 1 ve bağlantı 2 blokları) deprem tahkik ve/veya güçlendirilmesi ve/veya nitelikli hale getirilmesine ait uygulama projeleri ve ihale dokümanı hazırlama işi tamamlanmıştır. Bunun yanında A Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında ise ihaleye çıkılmış ve güçlendirme işine (fiziki gerçekleştirme oranı %5) başlanmıştır.	Projeye ait yılı ödeneğin %47'si harcanmıştır. 2025 yılında poliklinik bloğu deprem güçlendirme işine ait son hakediş ve kesin hesap ödemeleri yapılarak projenin A ve B Blok deprem güçlendirme, tadilat ve onarım işlerine devam edilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal- Teknolojik Araştırma	2024K12-234024	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	,	Proje Desteği Sağlanması	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından proje kapsamında özel hesap ödeneklerinden Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen 334 adet projeye destek verilmiş, ultramikrotom cihazı ve çok fonksiyonlu tribometre alımı gerçekleştirilmiştir.	Özel hesapta geçen yıllardan kalan ödenekler kullandığından projeye ait yılı ödeneği özel hesaba aktarılmamıştır. Proje kapsamında gerek verilen desteklerle gerekse de alınan makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi sağlanmış, makine-teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir.

1.4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde 12 adet proje yürütülmüş olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 442.227.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 362.822.542 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 805.049.542 TL'ye yükselmiştir. Yatırım başlangıç ödeneğimiz bir önceki yıla göre %154,02, yılsonu toplam ödeneği ise % 175,24 artmıştır.

Üniversitemiz bütçesinden 2024 yılında yapılan toplam yatırım giderleri bir önceki yıla göre % 173,84 oranında artarak 407.694.817 TL olmuştur. Yatırım giderlerinde, başlangıç ödeneğine göre %92,19 oranında, yılsonu toplam ödeneğe göre %50,64 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 7 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı

Yıl	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yılsonu Toplam Ödenek (TL)	Toplam Harcama (TL)
2023	287.129.000	459.385.588	234.518.628
2024	442.227.000	805.049.542	407.694.817

2024 yılında eğitim sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 123.700.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 151.000.000 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için toplam 87.190.921 TL harcanmıştır.


2024 yılında sağlık sektöründe 5 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 292.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 613.622.542 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için toplam 320.503.896 TL harcanmıştır.

2024 yılında diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 26.527.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 40.427.000 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki proje için yılı yatırım bütçesinden harcama yapılmamıştır.

Tablo 8 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	6	123.700.000	27.300.000	0	151.000.000	87.190.921
Sağlık	5	292.000.000	318.908.617	2.713.925	613.622.542	320.503.896
Diğer Kamu Hizmetleri	1	26.527.000	13.900.000	0	40.427.000	0
TOPLAM	12	442.227.000	360.108.617	2.713.925	805.049.542	407.694.817

Şekil 2 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı

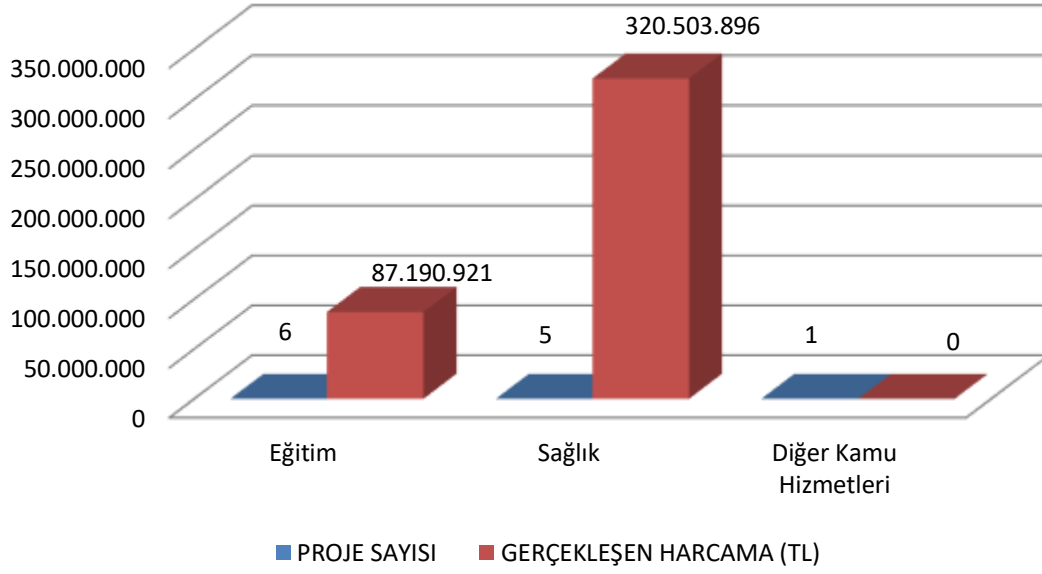

Tablo 9 2024 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.000.000	0	0	0	2.000.000	396.000
	Kampüs Altyapısı	25.000.000	0	0	0	25.000.000	22.455.839
	Yayın Alımı	9.200.000	0	1.182.000	0	8.018.000	8.017.011
	Muhtelif İşler	35.000.000	28.482.000	0	0	63.482.000	53.250.624
	Derslik ve Merkezi Birimler	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.629.847
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000	0	0	0	2.500.000	441.600
Sağlık	Deprem Çocuk Hastanesi	84.000.000	0	79.000.000	0	5.000.000	1.419.694
	Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina	11.000.000	42.000.000	0	1.275.000	54.275.000	37.694.038
	Deprem Hastane İnşaatı	1.000.000	19.400.000	0	0	20.400.000	2.825.000
	Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme	158.000.000	326.888.000	0	0	484.888.000	229.511.024
	Deprem Muhtelif İşler	38.000.000	9.620.617	0	1.438.925	49.059.542	49.054.139
Diğer Kamu Hizmetleri	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	26.527.000	13.900.000	0	0	40.427.000	0
TOPLAM		442.227.000	440.290.617	80.182.000	2.713.925	805.049.542	407.694.817

Tablo 10 2024 yılı yatırım ödeneklerinin program bazında dağılımı

PROGRAM / ALT PROGRAM / FAALİYET	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ ÖDENEK (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	26.527.000	40.427.000	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	26.527.000	40.427.000	0
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma	26.527.000	40.427.000	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	292.000.000	613.622.542	320.503.896
TEDAVİ HİZMETLERİ	292.000.000	613.622.542	320.503.896
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	292.000.000	613.622.542	320.503.896
YÜKSEKÖĞRETİM	112.524.000	139.704.000	78.224.067
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	112.524.000	139.704.000	78.224.067
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	9.200.000	8.018.000	8.017.011
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	101.824.000	126.886.000	66.328.551
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	1.500.000	4.800.000	3.878.504
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.176.000	11.296.000	8.966.854
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	11.176.000	11.296.000	8.966.854
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	2.500.000	2.500.000	2.480.816
Genel Destek Hizmetleri	5.000.000	5.120.000	5.051.324
Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler	1.176.000	1.176.000	993.114
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	2.500.000	2.500.000	441.600
PROGRAMLAR TOPLAMI	442.227.000	805.049.542	407.694.817

Tablo 11 2024 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı

EKONOMİK KODU	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ ÖDENEK (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)
06.01 Mamul Mal Alımları	92.727.000	129.986.542	79.389.807
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000	1.000.000	523.676
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	221.000.000	137.675.000	59.606.634
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	3.742.000	2.732.227
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	127.500.000	532.646.000	265.442.473
TOPLAM	442.227.000	805.049.542	407.694.817

2- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

1. 2024H03-232971 Kampüs Altyapısı Projesi

Projenin amacı, Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs altyapısına kavuşması için gerekli projeleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) tamamlamaktır.

2024 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 25.000.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2026 yılında tamamlanması planlanmıştır. Proje için 22.455.839 TL harcama yapılmıştır. Projeye ait ödeneğin %90'ı harcanmış olup, projenin 2024 yılı için planlanan işlerinin fiziki gerçekleşme oranı %100'dür.

Proje kapsamında; Bakım İşletme Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacı mal alım işi, mekanik altyapı tadilat yapılması işi, kampüs içi çevre güvenlik imalatları yapım işi, Halk Sağlığı Binası kanalizasyon ve drenaj yenilenmesi işi, Kuzey Çarşı ve muhtelif yerlerde yol aydınlatılması yapılması işi, kampüs muhtelif yerlerde tadilat yapılması işi, altyapı tadilat ve onarım yapım işi, muhtelif mekanik altyapı işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi, galeri ve kazan dairelerinde altyapı ve onarım yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde elektrik tadilatlarının yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlere kamera ve alarm tesisatı yapılması işi, su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi, göl pompası kurulumu yapılması işi, Ziraat Fakültesi galeriler ve muhtelif kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, Tıp Fakültesi Dekanlığının ana ısı merkezinden ısıtılması işi, Balcalı Hastanesi acil girişi yol genişletilmesi işi gerçekleştirilmiştir. Projeye 2025 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.

2. 2023I00-231525 Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme

06/02/2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle Üniversitemiz Hastanesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde Hastanemiz poliklinik, A ve B Blok binaları orta hasarlı çıkmıştır.

Projenin amacı, deprem nedeniyle 91.500 m² alana sahip poliklinik, A ve B Blok binalarında oluşan hasarların onarım ve tadilatlarının gerçekleştirilerek ayakta ve yatakta verilen sağlık hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde verilmesini sağlamaktır.

2024 yılında toplam 158.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde yapılan eklemeler ile revizeli toplam ödeneği 484.888.000 TL olmuştur. Projeye ait yılı ödeneğin %47'si harcanmış olup, projenin fiziki gerçekleşme oranı %75'dir.

Deprem Hastane Binaları Deprem Güçlendirme ana projesinin Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında Ç.Ü. Balcalı Hastanesi poliklinikleri güçlendirme, tadilat ve onarım işi tamamlanmış olup, son hakediş ve kesin hesap ödemeleri 2025 yılına sarkmıştır. B Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında ihaleye çıkılmış ve güçlendirme işine (fiziki gerçekleşme oranı %30) başlanmıştır. Ayrıca Ç.Ü. Balcalı Hastanesi (A-B-Poliklinik, bağlantı 1 ve bağlantı 2 blokları) deprem tahkik ve/veya güçlendirilmesi ve/veya nitelikli hale getirilmesine ait uygulama projeleri ve ihale dokümanı hazırlama işi tamamlanmıştır. Bunun

yanında A Blok Deprem Güçlendirme alt projesi kapsamında ise ihaleye çıkılmış ve güçlendirme işine (fiziki gerçekleşme oranı %5) başlanmıştır.



Poliklinik Bloğu Deprem Güçlendirme projesine ait görseller



B Blok Deprem Güçlendirme projesine ait görseller



A Blok Deprem Güçlendirme projesine ait görseller

3. 2022H03-187403 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin amacı, Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun, 20.000 m² kapalı alana sahip, Tıp Fakültesi Morfoloji hizmet binasının yapılması ve böylelikle öğrencilerimize daha modern ortamlarda eğitim ve öğretim sunumunun sağlanmasıdır.

2022 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 10.000.000 TL ödenek, 2023 yılında 60.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait 2022 ve 2023 yıllarında harcama yapılmamıştır. 2024 yılında ise toplam 50.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğin %5'i harcanmıştır.

Proje kapsamında etüd-proje işlemlerine ilişkin ihalesi yapılan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık binaları uygulama projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi devam etmektedir.

4. 2023I00-216793 Deprem Hastane İnşaatı

Projenin amacı, bölgede hastanemiz tarafından verilen 3. basamak sağlık hizmetlerinin aksamaması ve daha nitelikli hale getirilmesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulamalı eğitim öğretim faaliyetlerinin modern şartlarda yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı yeni standartlarına uygun, 80.000 m² alana sahip, 400 yatak kapasiteli yeni bir hastanenin kurulmasıdır. Proje, yapım süreci devam eden Çocuk Hastanesine entegre olacak şekilde yapılacaktır.

2023 yılında toplam 10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2024 yılında toplam 20.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğin %14'ü harcanmıştır.

Proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihaleye çıkmış olup, 400 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi uygulama projeleri ile ihale dosyası hazırlanması işi tamamlanmıştır. İlgili proje, yapım aşamasına başlanmadan 2024 yılında sonlandırılmıştır.

5. 2022I00-185710 Deprem Çocuk Hastanesi

Projenin amacı, 51.000 m² kapalı alan üzerine 250 yataklı sağlık alanında çocuk hasta grubuna çağın gereklerine uygun kaliteli hizmet sunan modern bir hastane yapmaktır.

2022 Yılı Yatırım Programının sağlık sektöründe olan proje için 2.000.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, yılı içerisinde 2.800.000 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 4.800.000 TL olmuştur. 2022 yılında projeye ait ödenekten harcama yapılmamıştır. 2023 yılında ise 407.421 TL'si şartlı bağış olmak üzere toplam 5.407.421 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2024 yılında ise revizyonlu toplam 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, projeye ait yılı ödeneğin %28'i harcanmıştır.

2024 yılında proje kapsamında etüd-proje işlerine ilişkin ihalesi yapılan Çocuk Hastanesi uygulama projelerinin ve ihale dokümanları hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alım işi tamamlanmıştır. İlgili proje, yapım aşamasına başlanmadan 2024 yılında sonlandırılmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 12 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi

SIRA NO	PROJE SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1	Eğitim	2024H03-232979	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
2		2024H03-232983	Yayın Alımı	Ç.Ü. Kütüphane ve Dok. DB
3		2024H03-232946	Muhtelif İşler	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB / Ç.Ü. İdari ve Mali İşler DB
4		2024H05-232985	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
5	Sağlık	2024I00-224830	Deprem Muhtelif İşler	Ç.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
6		2022I00-190075	Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik DB
7	Diğer Kamu Hizmetleri	2024K12-234024	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

1. 2024H03-232979 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2024H03-232979					
Proje Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Üniversitemizin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapılarının planlanarak etüd-proje hazırlıklarının yapılması.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Etüd-Proje					
Fiziki Hedefi:	Hizmet alımı					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		2.000			2.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		396			396	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üstyapıların yapım işlerine başlanabilmesi için etüd-proje hazırlıklarının tamamlanması beklenmektedir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacı doğrultusunda eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek, bunun neticesinde eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilerek eğitim kalitesinin artırılması, hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi açısından sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapının yapılması için gerekli olan etüd-proje ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yılı içerisinde proje kapsamında su şebekesinin içme suyu ve sulama suyu olarak ayrıştırılması işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. Ayrıca hizmet alımı yoluyla yaptırılan etüd-proje çalışmalarının zamanında teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmelerde yer alan cezai şartlar daha caydırıcı olmalıdır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2. 2024H03-232983 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2024H03-232983					
Proje Adı:	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Yayın koleksiyonunun geliştirilerek, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi:	1.000 basılı kitap, 900.000 elektronik kitap, 60.000 elektronik dergi					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		9.200			8.018	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		8.017			8.017	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim elemanlarına, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacına ilişkin belirlenen bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek hedefi doğrultusunda yapılan yayın alımları ile basılı ve elektronik kaynak sayısına önemli katkıda bulunmuştur. 2024 yılı için öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın hedefi 21,10 olup, yapılan yayın alımları ile öğrenci başına düşen yayın sayısı 25,67 olarak gerçekleşmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi bünyesinde 2024 yılında içerisinde toplamda abone olunan veri tabanı sayısı 78 adet olup, yıl içerisinde 14 adet elektronik yayın (veri tabanı) alımına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca proje kapsamında 585 adet basılı kitap alınmıştır. 2024 yılında yapılan alımlarla; 982.920 adet elektronik kitap, 64.918 elektronik dergi sayısına ulaşılmıştır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ödeneğe ait ödemelerin büyük bir kısmının yurt dışına döviz olarak yapılması ve kurlardaki artış nedeniyle yayın alımları istenen seviyede gerçekleştirilememiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Döviz kurlarındaki dengesiz ve ani yükselmeler nedeniyle kütüphanenin yayın alımları ödeneğinin Üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak artırılması.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. 2024H03-232946 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri					Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No:	2024H03-232946					
Proje Adı:	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat ve binek otomobil alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-5.					
Fiziki Hedefi:	Makine-teçhizat ve T-5 binek otomobil alımları, bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		35.000			63.482	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		53.251			53.251	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinin muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini artırılması beklenmektedir. Bu nedenle büro mefruşat, büro makineleri, bilgisayar vs. alımları ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının A.5 Kurumsal Kapasiteyi Kalite Standartları Doğrultusunda Geliştirmek amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen fiziki kapasiteyi iyileştirmek, bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Eğitime yönelik olarak yapılan yatırımın çıktılarında olan sınıf iyileştirme sayısı; öğrenci memnuniyetinin artırılmasına yapılan katkı olarak görülmekte ve eğitimin kalitesinde bir artışa sebep olmaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Kongre Merkezi ve Amfideki arızalı hoparlörlerin bakım ve onarımı işi, İlahiyat Fakültesi tadilat ve onarım işi, Rektörlük Makam odaları ahşap yüzeylerin boya yapılması yapım işi, Rektörlük Dinlenme Odası WC tadilat yapılması işi, Rektörlük Makam Odaları parke yapılması işi, Açık Amfi Tiyatro ile Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO besleme hattı tadilat işi, muhtelif galeriler ve kazan dairelerinde tadilat ve onarım işi, muhtelif jeneratörlerin periyodik bakım ve onarım işi, İletişim Fakültesi merkezi iklimlendirme onarım işi, hizmet binaları muhtelif tadilat ve onarım işi, muhtelif yerlerde merkezi iklimlendirme sistemi onarımı yapılması işi, R1, R2, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Su Ürünleri Fakültesi binaları tadilat ve onarım işi, Mithat Özsan Amfi parke tadilat işi, Adana MYO A Blok tadilat işi, güvenlik binası yapım işi, SABİDAM Binası havalandırma ve iklimlendirme yapım işi, İktisadi Ve İdari Birimler Fakültesi 1. Blok tadilat işi, Kütüphane Binası tadilat ve onarım işi, Karaisalı MYO dış cephe tadilatı işi, muhtelif yerlerdeki içme suyu kazan daireleri ve soğutma grubu alanlarının bakım ve kontrollerinin yapılması işi, kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılmak üzere boya alımı işi, muhtelif jeneratörlerin arıza-onarım işlerine yönelik mal alım işi, Bakım İşletme Müdürlüğü 2024 yılı ihtiyacı mal alım işi, Halk Sağlığı Binası güçlendirme, tadilat ve onarım işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım işi, kampüs içi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi, muhtelif büro makineleri yedek parça, muhtelif büro mefruşat, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, muhtelif bilgisayar yardımcı parçaları, klima, tarayıcı, lazer yazıcı, network kayıt cihazı, projeksiyon cihazı, televizyon, cep telefonu, dış cephe temizleme makinesi, elektrikli süpürge, yedekleme ünitesi, muhtelif elektrik-elektronik ve aydınlatma malzemeleri, midibüs araç, telefon santrali, yedek parça ve muhtelif telefon, beslenme ve mutfak cihazları, hasta simülasyon sistemi ve merkez vakum sistemi alımları gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

4. 2024H05-232985 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2024H05-232985					
Proje Adı:	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor					
Proje Amacı:	Üniversitemiz spor tesislerinin gerekli bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek ve sunulan spor hizmetlerinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi:	Bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		2.500			2.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		442			442	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de iyileşme sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.2 Eğitimi Sürdürülebilir Bir Anlayışla Çağın Sürekli Gelişen Koşullarına Uyumlu İçerik, Yöntem ve Olanaklarla Donanmış Bir Hale Getirmek amacına ulaşmak için belirlenen öğrencilerimizin yerleşke içi yaşam kalitesini artırmak hedefine katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu trafosuna kompanzasyon panosu yapım işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje kapsamında yapılacak işlerin zamanı, eğitim-öğretim dönemini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

5. 2024I00-224830 Deprem Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2024I00-224830					
Proje Adı:	Deprem Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Sağlık					
Proje Amacı:	Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletlerin alımını gerçekleştirmek sağlık hizmetinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi:	Makine-teçhizat alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		38.000			49.060	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		49.054			49.054	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler alınmış ve tıbbi cihaz ekipman ve donanım anlamında sağlıkta ileri teknolojik imkanlarla hem sağlık hizmeti sunumunun kalitesinde hem de sağlık hizmeti sunulan kişi sayısında artış sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.3 Üretilen Bilgi ve Hizmetleri Erişilebilir, Nitelikli, Yenilenebilir ve Evrensel Değerler Kapsamında Toplum ve Kamu Yararına Sunmak amacına ulaşmak için belirlenen sağlık hizmetlerini etkili, erişilebilir, uluslararası ve kalite standartlarına uygun bir şekilde toplum yararına sunmak hedefine katkı sağlamaktadır. Ayrıca; -Sağlık hizmet sunumu ile güncel tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi, -Teknolojik imkânların tedavi yöntemlerine uygulanması, -Tedavi yöntemlerinin ilgili sağlık ve tedavi edici programlarında aktif olarak kullanılması, -Sağlık hizmetinin ulaşılabilirlik ve tedavi yöntemlerinin sağlık sektöründe en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlanmıştır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında C kollu röntgen cihazı, renkli doppler usg cihazı, KBB endovizyon görüntüleme sistemi, argon lazer cihazı, operatif plazma kinetik rezekteskop seti, kuvöz, lazer yazıcı, ultrasonografi sistemi, termosifon, televizyon, muhtelif mefruşat ve tefrişat malzeme, laparoskopik kayıt sistemi, ekran, klima, lineer eus probu, led ışık kaynağı ve fiber optik kablo, üst düzey ameliyat mikroskobu, diyet lazer cihazı, cerrahi duman tahliye cihazı, yıkama dezenfeksiyon kurutma makinesi, hidrojen peroksit düşük ısı sterilizatörü, sinir monitörü, dijital röntgen cihazı, sabit renkli doppler ultrasonografi cihazı, rektoskop cihazı ve yüksek güçlü holmium lazer cihazı alımları gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat Depremleri sonrası Ana Binaların hasarlı olması ve hizmete kapatılması ve hizmetin farklı binalarda bölünmüş olarak yürütülmesi nedeniyle hesapta olmayan ihtiyaçlar ve tıbbi cihazların montaj aşamalarında ve kurulumlarında bina yapısı nedeni ile altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Deprem sonrası öncelik acil ihtiyaçlara verilmiş ve sağlık hizmetinin bölünmüş binalarda yürütülmesine yönelik planlama yapılarak sorunlar çözülmüştür.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

6. 2022I00-190075 Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2022I00-190075					
Proje Adı:	Deprem Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina					
Sektör/Alt sektör:	Sağlık					
Proje Amacı:	Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin çocuk hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesini sağlamaktır.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Hastane Ek Binası (3.600 m ²)					
Fiziki Hedefi:	Hastane Ek Binası yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2022-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		61.300			76.768	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)		53			135	
2023		26.330			38.939	
2024		37.694			37.694	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Hastanemiz personellerinin ve sağlık hizmeti alan hastalarımızın beslenme ihtiyacının daha düzenli ve hijyenik bir ortamda karşılanmasını ve çocuk infüzyon kliniğinin çocuk hastaların yanında ağır, yaşlı ve engelli hastalara da kaliteli sağlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.3 Üretilen Bilgi ve Hizmetleri Erişilebilir, Nitelikli, Yenilenebilir ve Evrensel Değerler Kapsamında Toplum ve Kamu Yararına Sunmak amacına ulaşmak için belirlenen sağlık hizmetlerini etkili, erişilebilir, uluslararası ve kalite standartlarına uygun bir şekilde toplum yararına sunmak hedefine katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında yapılan yemekhane binasının kaba inşaatı, elektrik, mimari ve mekanik imalat işleri tamamlanmış olup, son hakediş ve kesin hesap ödemeleri 2025 yılına sarkmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır. İhale sonrası imzalanan sözleşmelerde hakediş ödemelerinin Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenek serbest bırakma tutarlarına göre yapılacağı belirtilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

7. 2024K12-234024 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2024K12-234024					
Proje Adı:	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Alt sektör:	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal					
Proje Amacı:	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerine destek vermek.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Proje Desteği					
Fiziki Hedefi:	Makine-Teçhizat alımı, Mal alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2024-31.12.2024					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		26.527			40.427	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında gerek verilen desteklerle gerekse de alınan makine-teçhizatlar ile Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi sağlanmış, makine-teçhizat altyapısı güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında yer alan A.1 Araştırma-Geliştirme ve Girişimcilik Kapasitesini Artırmak amacına ulaşmak için belirlenen iç ve dış kaynaklı proje sayısı ile yayın sayısını her yıl düzenli olarak artırmak hedefine katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Özel hesapta geçen yıllardan kalan ödenekler nedeniyle projeye ait yılı ödeneği özel hesaba aktarılmamıştır. Projelerde kullanılmak üzere geçmiş yıllardan kalan özel hesap ödeneklerinden ultramikrotom cihazı ve çok fonksiyonlu tribometre alımı gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Makine-teçhizat alımları yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmalıdır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2024 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle idarelerimizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşulların ve gerekliliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Ek 1 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Kurum/Birim Adı : Çukurova Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2024 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		772.000			0			123.700			151.000			87.191
Sağlık*	5		3.872.933			116.312			292.000			613.623			320.504
Diğer Kamu Hizmetleri	1		40.427			0			26.527			40.427			0
-İktisadi															
-Sosyal	1		40.427			0			26.527			40.427			0
TOPLAM	12		4.685.360			116.312			442.227			805.050			407.695

(*) Sektör içerisindeki Hastane Yemekhanesi ve Ek Bina projesine 1.275.000 TL, Deprem Muhtelif İşler projesine 1.438.925,10 TL şartlı bağış eklemesi yapılmıştır.
