

# ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



## 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu





*Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.*

*Mustafa Kemal Atatürk*

**İÇİNDEKİLER**

1- GENEL DEĞERLENDİRME .....	1
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları .....	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi .....	1
1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme ....	11
1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları .....	15
2- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	17
2.1. Devam Eden Projeler .....	17
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	17
2.2. Tamamlanan Projeler .....	22
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi .....	22
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu .....	23
3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER.....	29

**TABLolar VE ŞEKİLLER**

Tablo 1 Taşınmazların yerleşkeye göre açık alan dağılımı.....	2
Tablo 2 Kapalı alanların dağılımı.....	3
Tablo 3 Açık spor sahalarının türüne göre dağılımı.....	4
Tablo 4 Bilgi ve teknolojik kaynaklar .....	4
Tablo 5 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar.....	5
Tablo 6 Taşıtlarının cinsi ve sayıları .....	6
Tablo 7 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları.....	7
Tablo 8 2018 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler .....	11
Tablo 9 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı .....	15
Tablo 10 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı.....	15
Tablo 11 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı .....	16
Tablo 12 2018 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı .....	16
Tablo 13 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi.....	22
Şekil 1 2018 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı.....	1
Şekil 2 Taşınmazların yerleşkeye göre açık alan dağılımı .....	3
Şekil 3 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı .....	16

**EKLER**

Ek 1 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU .....	30
--	----


## 1- GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, Özel Bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında toplam 10 adet proje yürütülmüş olup, bu projeler için finansman kaynağı olarak başta Hazine Yardımı olmak üzere Öz Gelir (ikinci Öğretim Gelirleri, Uzaktan Öğretim Gelirleri, Kira Gelirleri, Sağlık, Kültür ve Spor Gelirleri, Öğrenci Harçları), Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri, Şartlı Bağış ve Yardımlar ile YÖK tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan Meslek Yüksekokullarına gönderilen Eğitim Desteği Geliri kullanılmıştır. Projeler için 106.474.700 TL Hazine Yardımı, 6.419.444 TL Öz Gelir, 5.843.201 TL Şartlı Bağış ve Yardımlar, 13.066.503 TL Bilimsel Araştırma Proje Geliri ve 104.000 TL YÖK Eğitim Desteği Geliri olmak üzere toplam 131.907.848 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğin finansman kaynağına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil 1 2018 Yılı Yatırım Programı ödeneklerinin finansman kaynağına göre dağılımı

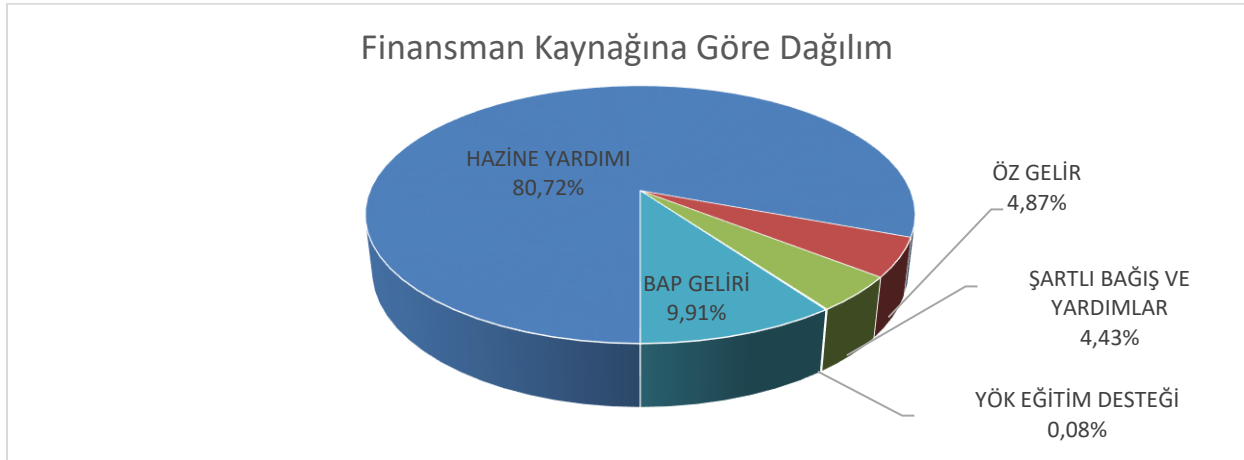

### 1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekar alanı kaplamaktadır. Üniversitemizin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversitemizin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar ve personel lojmanları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşke

içerisinde bulunmaktadır.


Üniversitemiz yerleşkesinin gelişim çerçevesinin çizilmesi amacıyla 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. İmar planının dönem dönem güncellemeleri yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Master Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Üniversitemizin gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır. Ana yerleşkemiz olan Balcalı yerleşkesi ulaşımı, şehir ile yerleşke arasında çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır.

Balcalı yerleşkesi dışında; şehir merkezinde Adana Meslek Yüksekokulu ve Adana OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ilçelerde ise Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ile Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemiz, 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu ve 38 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

**Tablo 1 Taşınmazların yerleşkeye göre açık alan dağılımı**

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )				AÇIKLAMA
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	HAZİNE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	DİĞER (m <sup>2</sup> )	TOPLAM (m <sup>2</sup> )	
Balcalı Kampüsü	12.634.715	4.358.008	1.041.427	<b>18.034.150</b>	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			<b>20.923</b>	
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	<b>158.109</b>	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	<b>114.778</b>	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	<b>2.845</b>	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	<b>841</b>	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			<b>75.965</b>	
Karataş Turizm İşl. ve Otel. YO		102.759		<b>102.759</b>	
Kozan MYO-(Kozan İşletme Fak.)		441.738		<b>441.738</b>	
Pozantı MYO			1.756	<b>1.756</b>	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Adana OSB Teknik Bilimler MYO			15.816	<b>15.816</b>	Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Tufanbeyli MYO			8.296	<b>8.296</b>	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	664.839			<b>664.839</b>	
Aladağ MYO		1.257		<b>1.257</b>	
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	<b>458.244</b>	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	<b>56.134</b>	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar (Kampüs Dışı)	1.550			<b>1.550</b>	
<b>TOPLAM</b>	<b>13.751.981</b>	<b>5.152.646</b>	<b>1.255.373</b>	<b>20.160.000</b>	

Şekil 2 Taşınmazların yerleşkeye göre açık alan dağılımı

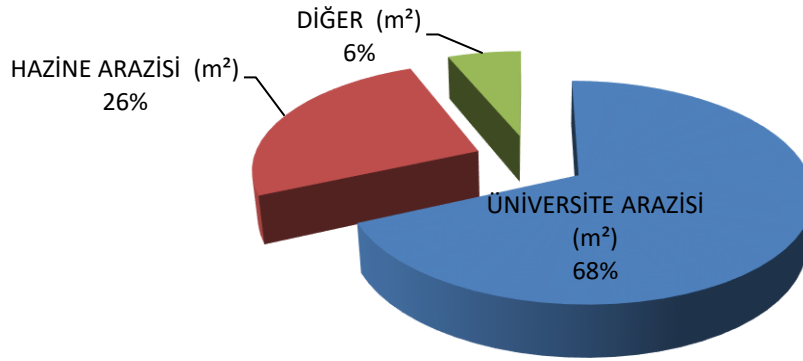

Tablo 2 Kapalı alanların dağılımı

AÇIKLAMA	KAPALI ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )
Eğitim Alanları (Derslik ve Laboratuvar)	112.809
Sosyal Alanlar	71.327
Yemekhane	15.350
Kantin / Kafeterya	5.570
Lojman	24.857
Misafirhane	25.550
Kapalı Spor Alanları	45.474
İdari Alanlar	273.190
Sağlık Alanları	201.201
Diğer Alanlar	69.316
<b>TOPLAM</b>	<b>773.317</b>

Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymaları, enerjilerini bu yönde kullanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösterilen spor dalları; Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, Basketbol, Futbol, Salon Futbolu, Voleybol, Hentbol, Güreş, Kürek, Kano, Tekvando, Karate, Badminton, Bilek Güreşi, Bisiklet, Boks, Muay Thai ve Spor Tırmanışı branşlarını kapsamaktadır.

Spor Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında Üniliğ adı altında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları arasında Basketbol, Voleybol, Futbol, Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında akademik ve idari personeller ile öğrencilerimizden oluşan yaklaşık 3.000 kişiye spor yapma imkânı sağlanmıştır. Bu imkânlar sayesinde Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi sağlanmış ve spor yapmaları teşvik edilmiştir. Spor Tesislerimizde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında dört yıldır Sabancı Vakfı tarafından kontrol edilen, Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitimi ve Rehabilitasyon Derneğinin (TOSSED) işbirliği ile Adana ili ve çevresinde bulunan yedi ilde engelli çocukların iki gün boyunca sağlık taramaları yapılmış ve Basketbol, Atletizm, Futbol ve Yüzme Branşlarında müsabakalar düzenlenmiştir. 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonlarının düzenlediği Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi müsabakası ile Sakıp Sabancı ve Spor Sergi Sarayında her yıl yapılan Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonasına, Üniversitemiz ev sahipliği yapmıştır. Spor Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerimizde sunulan spor hizmetlerinden Üniversitemiz

çalışanları, öğrencileri ve birçok genç ile çocuğa spor yapma imkânı sağlanmıştır.

**Tablo 3 Açık spor sahalarının türüne göre dağılımı**

SPOR SAHASI TÜRÜ	ADET
Çim Futbol Sahası	3
Basketbol sahası	9
Voleybol sahası	7
Tenis Kortu	5
Masa Tenisi Salonu	1
Kum Saha (Futbol, Hentbol, Voleybol)	4
Atletizm Parkuru ve Sahası	1

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, başta ağ cihazları ve fiber optik kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında Üniversitemize hizmet vermektedir. Üniversitemiz mevcut bilgi ve teknolojik alt yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

**Tablo 4 Bilgi ve teknolojik kaynaklar**

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	III. Düzey Kodu	IV. Düzey Kodu	Taşınır Kod Listesi	ADET
255	02	01	01	01	Masaüstü Bilgisayarlar	6.778
255	02	01	01	02	Dizüstü Bilgisayarlar	2.161
255	02	01	01	03	Tablet Bilgisayarlar	256
255	02	01	01	04	Cep Bilgisayarları	8
255	02	01	01	05	Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar	251
255	02	01	01	99	Diğer Bilgisayar Sunucu Kasaları ve Ekipmanları	722
255	02	01	02	02	Blade Sunucular	1
255	02	01	02	03	Raf Sunucular	5
255	02	01	02	04	Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	19
255	02	01	02	99	Diğer Bilgisayar Sunucu Kasaları ve Ekipmanları	216
255	02	02	01		Yazıcılar ve Okuyucular	4.493
255	02	02	02		Tarayıcılar	500
255	02	02	04		Yedekleme Cihazları (Harici Yedekleme Üniteleri)	2.015
255	02	03	01		Fotokopi Makineleri	198
255	02	04	01		Telefonlar	4.095
255	02	04	02		Faks Cihazları	82
255	02	04	03	01	Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	170
255	02	04	03	02	Swichler (Anahtarlar)	500
255	02	04	03	04	Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	113
255	02	04	03	05	İletişim Ağ Cihazları	49
255	02	04	03	06	Çok Fonksiyonlu Network Cihazları	1
255	02	04	03	07	İletişim Çeviricileri	1
255	02	04	03	08	Firewall Cihazları	1
255	02	04	03	99	Diğer Network Cihazları	41
255	02	05	01	01	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	1.379
255	02	05	01	02	Tepegözler (Slayt Cihazları)	147
255	02	05	02	01	Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları (Radyo, Kaset Çalar, Müzik Setleri vb.)	251
255	02	05	02	02	Televizyonlar	876
255	02	05	02	03	Videolar	85
255	02	05	04	01	Kameralar	649

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	III. Düzey Kodu	IV. Düzey Kodu	Taşınır Kod Listesi	ADET
255	02	05	04	02	Fotoğraf Makineleri	270
255	02	05	99		Diğer Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	108
255	02	99	01	01	Hesap Makineleri	188
255	02	99	04	01	Daktilolar	10
255	03	05	02	01	İnteraktif Yazı Tahtası	28
255	06	05			Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler (Tarihi Değeri Olan)	877
255	07	02	01		Kitaplar	117.382

Tablo 5 Üniversite hizmetine sunulan yazılımlar

Yazılım	Yazılım Edinim Şekli			
	Bilgi İşlem	Satın Alma	Kiralama	Kamu Kurumu
Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)		X		
Ansys Akademik Lisans		X		
Autocad Akademik Lisans			X	
Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi (YMS, KYS, MYS ve YBS)				X
Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS)	X			
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DMİS				X
E-Bütçe (Bütçe Takip)				X
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EOBS)	X			
Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (EBYS)		X		
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)				X
EndNote Akademik Lisans			X	
ERASNET		X		
Hizmet Takip Programı (HİTAP)				X
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)				X
Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS)		X		
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya)				X
Kaspersky Antivirüs Akademik Lisans		X		
Matlab Akademik Lisans			X	
MDAEMON Mail Yazılımı		X		
Mekan Yönetim Sistemi	X			
Microsoft Akademik Lisans			X	
Netcad Akademik Lisans		X		
Online Sınav Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			
OSKA Yazılım			X	
Personel Özlük İşleri Programı		X		
Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS)		X		
SPSS Akademik Lisans		X		
Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (E-SGB)				X
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Sonuç Sistemi	X			
Uzaktan Öğretim Platformu				X
VM Ware Sunucu Sanallaştırma İşletim Sistemi		X		
Windows Office Paketleri			X	
İşçi Sözleşmeli Maaş Programı	X			



Tablo 6 Taşıtlarının cinsi ve sayıları

(T) CETVELİ SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	MEVCUT TAŞIT SAYISI	HİZMET ALIMIYLA KULLANILAN TAŞIT SAYISI
T2-	Binek otomobil	17	7
T3-	Station-Wagon	15	0
T5-	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik)	16	0
T7-	Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik)	14	0
T9-	Panel	5	0
T10-	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	3	0
T11-a	Otobüs (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik)	2	0
T11-b	Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)	4	0
T12-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	5	0
T13-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	3	0
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	1	0
T18-	Motosiklet (En fazla 600 cc. lik)	2	0
T19-	Motosiklet (En az 601 cc. lik)	1	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>88</b>	<b>7</b>

Araştırma ve eğitimin en önemli destek birimi olan Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi, 10.000 metrekarelik kapalı alanı bulunan binasında aynı anda 800 okuyucunun yararlanabileceği okuma salonları, araştırma yapmak isteyenler için 30 özel oda ile 1 sergi, 1 konferans salonu ve öğrencilerin kullanımına açık 1 internet salonu ile hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 117.382 basılı ve 271.523 elektronik kitaba ulaşılabilmektedir. Kütüphanemizde 2018 yılı itibariyle 1.494 kalem basılı süreli yayın arşivi ile 44.827 adet elektronik süreli yayınıımız bulunmaktadır. Online olarak erişim yapılabilen tez sayısı 2.100.000 adet üzerinde olmakla birlikte elektronik kaynaklardan yaklaşık 690.000 adet yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirmesi gerçekleştirilmiştir. Eski yıllara ait dergiler de, süreli yayınlar bölümü görevlilerince okuyucunun istifadesine sunulmaktadır. Nadir Eserler Bölümü'nde 80 adet el yazması, 797 adet eski harfli basma eser bulunmaktadır. Bunun yanında İlahiyat Fakültemiz bünyesinde de 3.240 adet eski harfli basma eser mevcuttur.

İnternet aracılığıyla kütüphanemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM) erişilebilmektedir.

Üniversitemiz, Anadolu Üniversite Kütüphaneler Konsorsiyumu (ANKOS) kurucu üyesidir. Halen bir uzman kütüphanecimiz "Veri Tabanı Sorumlusu" ve "Veritabanı Değerlendirme Grubu Üyesi" görevleriyle konsorsiyumda gönüllü olarak görev yapmakta ve ülkemiz üniversite kütüphanelerine yeni veri tabanları kazandırmak için çalışmalara katılmaktadır. Kütüphanemiz, 2018 yılında toplam 74 adet veritabanına abone olmakla birlikte bu veritabanlarının 27 adedine ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 36

adedine TÜBİTAK EKUAL (TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığıyla ve 11 adedine ise firmalardan satın alma yoluyla erişim sağlanmaktadır.

**Tablo 7 Merkezi Kütüphanede abone olunan veri tabanları**

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
1	ACS (American Chemical Society)
2	AMA Journals
3	American Doctoral Dissertations, 1933-1955
4	Annual Reviews
5	Applied Science & Business Periodicals Reprospective
6	Applied Science & Technology Index Reprospective
7	APS (American Physical Society)
8	ASCE Research Library
9	ASME Digital Library
10	BMJ Journals Online
11	CAB Abstracts
12	Cambridge Journals Online
13	Clinical Key
14	Cochrane
15	Dynamed
16	EBSCO Discovery Services
17	EBSCO E-Book Academic Collection
18	EBSCOhost Academic Search Complete
19	EBSCOhost Business Source Complete
20	Education Index Retrospective 1929-1983
21	Elsevier E-Books
22	Emerald
23	Emerald Social Sciences e-Book Collection
24	EndNote
25	ERIC
26	ExpertPath
27	GreenFILE
28	Hein Online
29	HiperKitap
30	Hukuk Türk
31	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
32	IMF E-Library
33	InCites
34	Institute of Physics
35	ISI Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
36	İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı
37	İktisat İşletme Finans Dergisi
38	IThenticate
39	Journal Citation Reports (JCR)
40	JSTOR
41	Kazancı Hukuk Veritabanı
42	Library, Information Science & Technology Abstracts
43	MasterFILE Complete
44	Math Science Net
45	Medline
46	Mendeley
47	Nature Academic Journals
48	Nature Journals

SIRA NO	VERİ TABANI ADI
49	Newspaper Source Plus
50	OVID Journals
51	Oxford Online Journals
52	Palgrave Macmillan Journals
53	ProQuest Agricultural Science Collection
54	Proquest Dissertations and Thesis
55	Regional Business News
56	SAGE Journals Online
57	Science Direct
58	Scopus
59	Social Sciences Index Retrospective: 1907 - 1983
60	Springer Biomedical & Life Sciences E-Books
61	Springer Engineering E-Books
62	Springer Link
63	STATdx
64	Swisslex
65	Taylor & Francis Online Journals
66	Teacher Reference Center
67	Thieme
68	Turnitin
69	Tümer Altaş Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Veri Tabanı
70	Türkiye Atıf Dizini
71	Ulakbim Ulusal Veritabanları
72	UpToDate
73	Wiley E-Books
74	Wiley Online Library

Kütüphanemiz, Türkiye'deki 14 AB Dokümantasyon Merkezlerinden birisi olup, bu merkez kütüphane binası 2'nci katında kendine ayrılan mekânda hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Basımevinde basılan yayınlara ISSN ve ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) sağlama hizmetleri yürütülmektedir. Kütüphanemize, 2018 Yılında 672 adet satın alma ve 791 adet bağış yolu ile olmak üzere toplam 1.463 adet basılı kitap kazandırılmıştır.

Üniversitemizde 2.523 kişilik akademik personel kadrosu olup, bu kadrolardan 2.202'si doludur. Ayrıca 33 kişi sözleşmeli akademik personel olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında İdari personel için 3.729 kişilik kadro tahsis edilmiş olup, bunlardan 2.293'ü idari personel, 187'si sözleşmeli personel, 406'sı işçi ve 48'i geçici işçi olmak üzere toplam dolu idari kadro sayısı 2.934'tür.

Üniversitemiz akademik ve idari personel kadrosu ile 42.472 öğrenci I. Öğretim, 11.259 öğrenci II. Öğretim ve 1.041 öğrenci Uzaktan Öğretim olmak üzere toplam 54.772 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Bunlardan 5.475 öğrenci Tezli Yüksek Lisans, 877 öğrenci Tezsiz Yüksek Lisans ve 1.871 öğrenci Doktora programlarında eğitim-öğretim hizmeti almaktadır.

Üniversitemiz Enerji ve Çevre, Malzeme, Tarım ve Gıda, Sağlık ve Bölgesel Sosyo-Ekonomik konulu araştırmalara öncelikli alanlar olarak yönelerek çalışmalarına bu yönde devam etmektedir. Öncelikli alanlara yönelik hizmet veren uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere Üniversitemizde toplam 38 adet araştırma ve uygulama merkezi faaliyet

göstermektedir. Merkezler dışında güçlü ve deneyimli kadroya sahip akademik birimlerle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ve Çukurova Teknokent, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve hizmet vermektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Üniversitemizdeki araştırma projelerinin idari ve mali süreçlerini web tabanlı bir yazılım (BAPSİS) ile yürütmektedir. Koordinasyon Birimi tarafından Bireysel Araştırma Projeleri (BRP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ), Araştırma Alt Yapı Projeleri (AYP), Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP), Sanayi İşbirliği Projeleri (SAN), Öncelikli Alan Projeleri (OAP) ve Uluslararası Araştırma İşbirliği (UİP) başlıklı 7 farklı proje tipi desteklenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 747 adet proje desteklenmiştir.

Ayrıca Üniversitemiz 2017 yılında deneyimli akademik kadrosuna, araştırma alt yapısına ve kurumsal yapısına dayanarak senato kararı ile araştırma misyon farklılaşması niyet beyanında bulunmuş ve YÖK tarafından da aday "Araştırma Üniversitesi" olarak belirlenmiştir.

Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunumu Balcılı Hastanesi, Medikososyal Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Balcılı hastanemizde; 1 Acil Servis, 52 Poliklinik, 10 Yoğun Bakım Ünitesi, 22 Ameliyathane, 47 Klinik, 7 Laboratuvar, 1 Radyoloji, 1 Nükleer Tıp, 1 Hemodiyaliz, 1 Onkoloji Binası, 1 Kan Merkezi, 1 Yanık Ünitesi, 4 Sterilizasyon Ünitesi, 1 Eczane, 1 Mutfak, 1 Çamaşırhane ve 6 Teknik Servis bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 77 Anabilim dalında bilimsel araştırma ve uygulama yapılmakta ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

1.200 yatak kapasitesine sahip hastanemiz, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin önemli bir bölümüne (yaklaşık 20 milyon nüfusa) üst düzeyde sağlık hizmeti vermekte ve bölgenin önemli referans sağlık merkezi konumunda bulunmaktadır.

Hastanemizde günlük olarak ortalama 3.600 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastanemizde 2018 yılında 902.965 hastaya sağlık hizmeti verilmiş ve doluluk oranı %90 olmuştur. Sağlık hizmetlerinin en zor ve ileri aşaması yoğun bakım hizmetleridir. Hastanemiz, ülkemizin en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerden biridir. Modern üniteleri ile her türlü yoğun bakım hastası izlenebilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Hastanemiz merkez laboratuvarı, gelişmiş ülkelerin sağlık akreditasyonu olarak kabul ettiği JCI akreditasyonuna sahiptir. Bölgenin en büyük ve en kapsamlı olan Kan Merkezimiz, 24 saat hizmet vermektedir. Tetkik örnekleri, pnömatik sistem (vakumlu hava ile taşıma) aracılığı ile laboratuvarlara iletilmektedir. Radyoloji bölümünde modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Hastanemizde tüm cerrahi alanlarda son teknoloji ile donatılmış cihazları ve alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile her türlü ameliyat yapılmaktadır. Yıllık ameliyat sayısı 80.224' tür.

Mediko-Sosyal Merkezinde, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik tedavilerinin yapılmasının yanında; personel ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de tedavileri yapılabilmektedir.

Mediko-Sosyal Merkezimizde 3 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Polikliniği, 1 Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, 1 Eğitim ASM Polikliniği, 3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Polikliniği ve 1 Beslenme ve Diyet Polikliniği olmak üzere toplam 9 poliklinik hizmeti verilmektedir. Sağlık Eğitimi amaçlı söyleşi ve konferanslar düzenlenmektedir. Hepatit-A, Hepatit-B, 3K (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Suçiçeği ve Tetanoz risk gruplarına giren öğrencilerimize aşılama yapılmaktadır. Öğrenci ve personelimizi bilgilendirmek için sağlık eğitimi amaçlı broşürler basılmaktadır.

Aynı zamanda Mediko-Sosyal Merkezimizde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri de verilmektedir. Başvuran öğrencilerin Üniversitemize uyum, kişilik, aile, arkadaş, eğitim, barınma ve ekonomik güçlüklerinin giderilebilmesi amacıyla danışmanlık ve rehberlik yapılmakta, ekonomik güçlüğü olan öğrencilere burs sağlanmakta, ruhsal sorunu olan öğrencilere bireysel tedavi; grup veya aile terapileri verilmekte; gerektiğinde ise ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bunun yanında Gençlik Danışma Birimi tarafından gebelikten korunma yöntemleri sunumu ile üreme sağlığı, cinsel sağlık, psikolojik danışmanlık, gebelikten korunma, istenmeyen gebeliklere yaklaşım, kendi kendine meme ve testis muayenesi, sigara, alkol, madde bağımlılığından korunma, cinsel taciz ve şiddetle baş etme, beslenme ve hijyen gibi konularda hizmet sunulmaktadır. Ayrıca gençlerin madde bağımlılığını engellemek ve konuyla ilgili olarak eğitilmesini amaçlayan Madde Bağımlılığı Eğitim ve Araştırma Koordinasyon Birimi kurulmuştur.

Merkezimizde, 2018 yılında eğitim öğretim gören 725 öğrenciye psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, 383 öğrenciye sosyal sorunlara yönelik hizmetler, 2.694'ü öğrenci olmak üzere toplam 15.147 hastaya da sağlık hizmeti verilmiştir. Ayrıca Merkezde oluşturulan sağlık ekiplerince ayda bir Ç.Ü. Anaokulu çocuklarının sağlık taraması yapılmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültemiz, 121 diş ünitesi ile günde ortalama 900 hastaya hizmet vermektedir. Diş Hekimliği Fakültemiz 2018 yılında 208.329 hastaya sağlık hizmeti vermiş, 59.367 adet tetkik yapmıştır. Fakültemiz, 25 Nisan 2006 tarihinde muayene ve tedavi hizmetleri alanında ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini tüm bölümleriyle alarak devlet üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirmiştir.

Bunun yanında üniversitemizde engelli öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi tarafından, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak Üniversitedeki engelli mekânlar (engelli asansörü, tuvaleti ve rampası) uzman bir ekip tarafından tespit edilmiş, öğrencilerin yoğun kullandıkları mekânlar başta olmak üzere engelli mekan inşaatları tamamlanmıştır.

## 1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Tablo 8 2018 Yılı yatırımlarının hedeflenen ve gerçekleşen kapasite ve kalite artışı ile iyileşmeye ilişkin bilgiler

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2018H034560	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		Etüt-Proje İşlerinin Yapılması	Amfilerin (1-2-3-4 no'lu) yeni bina yapım uygulama projesi ile mevcut hemşire lojman binalarının Veteriner Fakültesi binasına dönüştürülmesi, güçlendirme ve renovasyon projesi işi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü binası yapımı uygulama projeleri, ihale işlem dosyasının hazırlanması ve proje hizmet alım işi, İletişim Fakültesi ile fakültenin derslik binası çevre düzenleme ve herkes için erişilebilir fiziksel çevre ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi ile Ziraat Fakültesi 200 Baş Süt Sığırcılığı Tesisi proje hizmet alım işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanarak proje tamamlanmıştır. 2018 yılı yatırım programındaki Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde bulunan Süt Sığırcılığı Tesisi yapımı için proje hizmet alımı işi tamamlanmış olmasına rağmen tesis yapımına başlanamamıştır. Bunun yanında gerçekleşen diğer işler 2019 yılı yatırım programına alınması planlanan projeler için yapılmış olup, söz konusu projeler 2019 yılı yatırım programına alınamamıştır.
Eğitim	1977H030010	Kampüs Altyapısı		Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin Yapılması	Yumurtalık MYO'nun altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi, muhtelif yerlerde fiber altyapı tesisi ve muhtelif tadilat yapılması işi, trafo binalarının modüllere dönüştürülmesi ve muhtelif elektrik tadilatları yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde mekanik ve elektrik altyapı tesisatı yapılması işi, kampüs içi içme ve kullanma suyu, çevre yangın tesisatı ve hidrant sistemi ile bahçe sulama projelerinin hazırlanarak mevcut sistemlere entegrasyonun yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde altyapı, otopark yapılması ve kanalizasyon yapım işi, İletişim Fakültesi muhtelif elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım yapılması işi, İletişim Fakültesi binası tadilat ve onarım işi, kampüs içi muhtelif binalara 13 adet engelli asansörü yapım işine ait proje hizmet alım işi ile Botanik Bahçe Uygulama ve Araştırma Merkezi binasına ait yapım işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %68'i harcanmıştır. Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı İşlerinin yapılması ile kampüs altyapısında iyileşme ve daha kaliteli hizmet sunumu sağlanmıştır. Projenin fiziki gerçekleştirilmesine 2019 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	1998H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Eczacılık Fakültesi	İnşaat Yapımı (16.000 m <sup>2</sup> )	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina yapımı ve TÖMER binası yapımı tamamlanmıştır. Eczacılık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri yapımı devam etmektedir.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanmıştır. Tamamlanan işler sonucunda Derslik ve Merkezi Birim olarak 9.400 m <sup>2</sup> eğitim alanında kapasite artışı sağlanmıştır. Ayrıca TÖMER binasının faaliyete geçmesi ile Üniversitemizi tercih edecek yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış sağlanacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi binasının fiziki gerçekleştirme oranı %50, Eczacılık Fakültesi binasının ise fiziki gerçekleştirme oranı %53 olup, hedeflerin gerçekleştirilmesine 2019 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.
			Güzel Sanatlar Fakültesi	İnşaat Yapımı (15.000 m <sup>2</sup> )		
			İİBF Binası	İnşaat Yapımı (6.000 m <sup>2</sup> )		
			TÖMER Binası	İnşaat Yapımı (3.400 m <sup>2</sup> )		
Eğitim	2018H031260	Yayın Alımı		Basılı Yayın Alımı (120.000), Elektronik Yayın Alımı (350.000)	672 adet basılı kitap, 50.675 adet elektronik kitap, 2.240 adet elektronik dergi alımı yapılmıştır.	Projeye ait ödeneğin %99'u harcanmıştır. Ödeneğe ait ödemelerin büyük bir kısmının yurt dışına döviz olarak yapılması ve kurlardaki artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulmuştur. Yeterli ödenek sağlanamadığı için hedeflerin gerçekleştirme oranı çok düşük kalmıştır.

Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Eğitim	2018H034550	Muhtelif İşler		Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat Alımı	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, güç kaynağı, haberleşme cihazları, kontrol ve güvenlik sistemleri, bilgisayar donanımı ve yazılımı, baskı makinesi, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile ilgili her türlü cihazlar, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, buzdolabı, hesap makinesi, fotokopi makinesi, evrak imha makinesi, projeksiyon, slayt makinesi, televizyon, masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri alımları ile Kuzey Çarşısı Yerleşkesi içerisinde yer alan Sanat Galerisi yapılması işi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi tadilat ve onarım yapılması işi, Ziraat Fakültesine ait muhtelif noktalarda tadilat ve onarım yapılması işi, Tıp Fakültesi Dekanlığı muhtelif noktalarda tadilat ve onarım işi, Merkezi Kafeterya tadilat ve onarım işi, Kozan İşletme Fakültesinin sınıf ve ofis tadilatları ve onarım işi, Rektörlük binası tadilat ve onarım işi ile kampüs içi muhtelif yerlerde (Amfi Tiyatro, Tropikal Hastalıklar Merkezi, İletişim Fakültesi, Kongre Merkezi Binası, Rektörlük, Fen Edebiyat Fakültesi, Laboratuvarlar, Kütüphane Binası, Anaokulu) tadilat ve onarım yapılması işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %79'u harcanmıştır. Eğitim kalitesinin artırılması, derslik alanlarının iyileştirilmesi amacıyla büro mefruşat, büro makinaları, bilgisayar ve yazılım alımları ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır.
Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor-	2018H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		Bakım Onarım	Ç.Ü. Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı binasının çatı tadilat ve onarım yapılması işi, Sosyal Tesislerdeki futbol sahasına himaye teli yapılması işi, Ç.Ü. Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu kazan dairesi bakım ve onarım işi tamamlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanarak sunulan spor hizmetinde hem kalite artışı hem de iyileşme sağlanmıştır.
Sağlık	2014I000150	Onkoloji Hastanesi	İnşaat	Hastane İnşaatı Yapımı (20.000 m <sup>2</sup> ), (190 yatak)	Onkoloji Hastanesi inşaat yapımına devam edilmektedir.	Projeye ait ödeneğin %87'si harcanmıştır. 2018 yılsonu fiziki gerçekleştirme oranı %45 olup, hedefin gerçekleştirilmesine 2019 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.



Proje Sektörü	Proje Numarası	Proje İsmi	Alt Proje İsmi	Hedeflenen	Gerçekleşen	Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme İle İlgili Açıklama
Sağlık	2017I000180	Muhtelif İşler		Büyük Onarım, Makine-Teçhizat Alımı	Tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletlerin (KBB Ünitesi Hasta İzleme Konsolu Ve Detectörü, KBB Poliklinik Görüntüleme Sistemi, Kalp Damar Cerrahi Elektrokoter, Cerrahi Alet Setleri, Teleskop, Üç Kanallı EMG Cihazı, Tek Kollu Esnek Cerrahi Tutucu Ve Pozisyonlama Sistemi, Tonopen, Tansiyon Aleti Ve Steteskop, Cerrahi Tanı Ve Girişim Seti, SİYOLA Endoskopi Sistemi, Alçı Kesme Motoru, Renkli Dopler Ultrasonografi Cihazı, Laparoskopik El Aletleri Seti, Tur Motoru Ve Mikrodebrider Sistem İçin Medtronic Mikrodebrider Elcek, Dijital Röntgen Cihazı, Yüksek Devirli Motor Elceği, Hasta Isıtma Blanketi, Yenidoğan Batın Seti Ve Mikrocerrahi Seti, Üroflometre Sistemi, Üst Düzey Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Cihazı, Kablosuz Şarj Edilebilir Dermatome Cihazı, Diode Lazer Cihazı, Flexible Nasofaringoskop Ve Otoloji Cerrahi Seti, Kemik Dokularının Makroskopik İncelenmesinde Kullanılacak Kesme Sistemi, Paslanmaz Çelik Hastane Donanımları, Spektrofluometre Cihazı, Ergonomik Mikroskop vb.) alımı ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi muhtelif yerlerindeki büyük onarım yapım işi yapılmıştır.	Projeye ait ödeneğin %74'ü harcanmıştır. Sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler alınmış ve hastanemizin büyük onarım yapım işleri yapılmıştır. Hedefin gerçekleştirilmesine 2019 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-	2014K120260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	inşaat	Makine-Teçhizat Alımı	Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 2018 yılında Infrared Spektroskopi (Ft-Ir) Cihazı, Uv-Vis Spektrofotometre, Phmetre, İletkenlik Ölçer, Termoreaktör, Boi Ölçüm Düzenegi, Soxhlet Cihazı, Türbidimetri, Dağılımlı Raman Spektrometresi, Icp/Ms, Partikül Boyut Ölçüm Cihazı, Atomik Kuvvet, Gaz Kromatografi, Glove Box, Uv Floresan Spektroskopi cihazlarının alımı yapılmıştır.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere gerekli cihazlar alınmıştır. 2018 yılında tamamlanması gereken proje tamamlanamamış, hedefin gerçekleştirilmesine 2019 yılı yatırım programı kapsamında devam edilecektir.
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-	2018K120490	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		Proje Desteği Sağlanması	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen 747 adet projeye destek sağlanmıştır.	Projeye ait ödeneğin %100'ü harcanmıştır.

#### 1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında üç sektörde on adet proje yürütülmüş olup, bu projelerin finansmanı amacıyla 82.540.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 49.367.848 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 131.907.848 TL'ye yükselmiştir. Yatırım başlangıç ödeneğimiz bir önceki yıla göre %7,86 azalmasına rağmen yılsonu toplam ödeneğe göre %24,20 artmıştır.

Üniversitemiz bütçesinden 2018 yılında yapılan toplam yatırım giderleri bir önceki yıla göre %66,91 oranında artarak 114.570.127 TL olmuştur. Yatırım giderlerinde başlangıç ödeneğine göre %138,80 oranında, yılsonu toplam ödeneğe göre %86,86 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Tablo 9 Yatırım bütçe ödeneği ve harcama durumunun yıllara göre dağılımı

Yıl	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yılsonu Toplam Ödenek (TL)	Toplam Harcama (TL)
2017	89.578.000	106.208.655	68.642.706
2018	82.540.000	131.907.848	114.570.127

2018 yılında eğitim sektöründe 6 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 31.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 60.716.433 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık olarak %52,99'unu oluşturmuştur.


2018 yılında sağlık sektöründe 2 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 41.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 39.287.191 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık olarak %34,29'unu oluşturmuştur.

2018 yılında diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 proje yürütülmüş olup, bu projeler için başlangıç ödeneğine 10.040.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi eklemelerle birlikte toplam 14.566.503 TL kaynak sağlanmıştır. Sektördeki projeler için yapılan harcamalar toplam yatırım harcamasının yaklaşık olarak %12,72'sini oluşturmuştur.

Tablo 10 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	6	31.000.000	34.768.144	552.832	66.320.976	60.716.433
Sağlık	2	41.500.000	4.230.000	5.290.369	51.020.369	39.287.191
Diğer Kamu Hizmetleri	2	10.040.000	4.526.503	0	14.566.503	14.566.503
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>82.540.000</b>	<b>43.524.647</b>	<b>5.843.201</b>	<b>131.907.848</b>	<b>114.570.127</b>

Şekil 3 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı

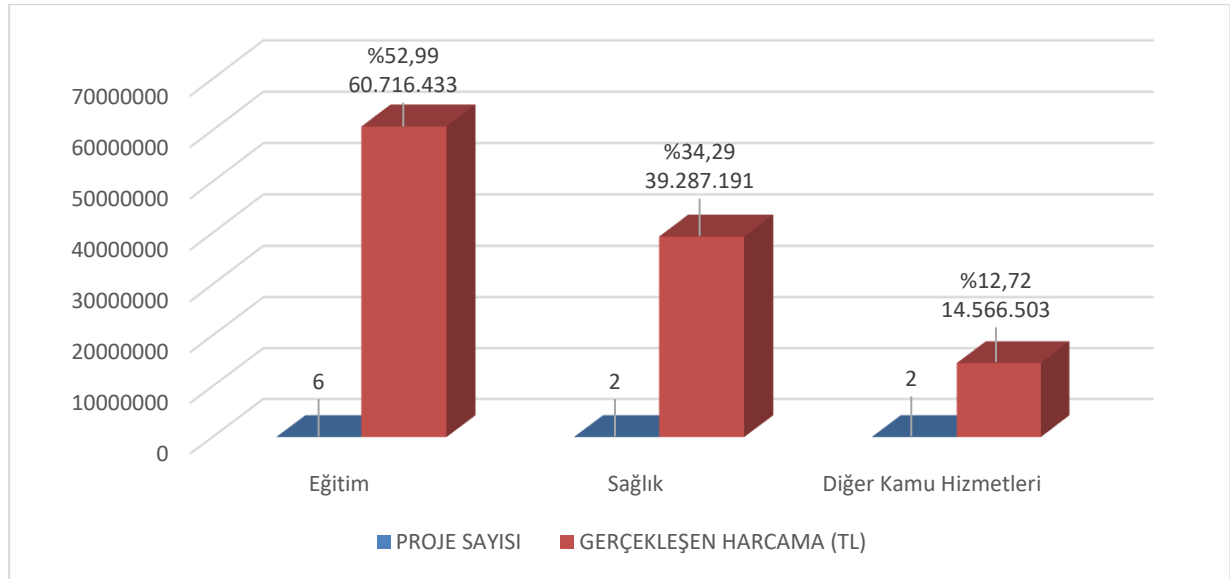

Tablo 11 2018 Yılı yatırım ödeneklerinin proje bazında dağılımı

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN ÖDENEK (TL)	HİBE (TL)	REVİZELİ TOPLAM ÖDENEK (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (TL)
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	230.000	0	330.000	329.696
	Kampüs Altyapısı	5.570.000	0	552.832	6.087.832	4.154.471
	Derslik ve Merkezi Birimler	17.150.000	21.872.000	0	39.022.000	39.015.409
	Yayın Alımı	1.750.000	175.000	0	1.925.000	1.910.280
	Muhtelif İşler	5.430.000	11.901.144	0	17.331.144	13.684.301
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	625.000	0	1.625.000	1.622.276
Sağlık	Onkoloji Hastanesi	1.500.000	3.930.000	5.290.369	10.720.369	9.317.586
	Muhtelif İşler	40.000.000	300.000	0	40.300.000	29.969.605
Diğer Kamu Hizmetleri	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	8.540.000	4.526.503	0	13.066.503	13.066.503
<b>TOPLAM</b>		<b>82.540.000</b>	<b>43.524.647</b>	<b>5.843.201</b>	<b>131.907.848</b>	<b>114.570.127</b>

Tablo 12 2018 yılı yatırım ödeneklerinin ekonomik koduna göre dağılımı

EKONOMİK KODU	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ ÖDENEK (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)
06.1 Mamul Mal Alımları	32.920.000	44.559.946	42.200.749
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	300.000	236.198
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.320.000	56.160.202	52.817.162
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	25.300.000	30.887.700	19.316.018
<b>TOPLAM</b>	<b>82.540.000</b>	<b>131.907.848</b>	<b>114.570.127</b>

## 2- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

##### 1. 1977H030010 Kampüs Altyapısı Projesi

2018 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 5.570.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yılı içerisinde 517.832 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 6.087.832 TL olmuştur. Proje için 4.154.471 TL harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %68,24, fiziki gerçekleşme oranı ise %80'dir.

Proje kapsamında; Yumurtalık MYO'nun altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi, muhtelif yerlerde fiber altyapı tesisi ve muhtelif tadilat yapılması işi, trafo binalarının modüllere dönüştürülmesi ve muhtelif elektrik tadilatları yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde mekanik ve elektrik altyapı tesisatı yapılması işi, kampüs içi içme ve kullanma suyu, çevre yangın tesisatı ve hidrant sistemi ile bahçe sulama projelerinin hazırlanarak mevcut sistemlere entegrasyonun yapılması işi, kampüs içi muhtelif yerlerde altyapı, otopark yapılması ve kanalizasyon yapım işi, İletişim Fakültesi muhtelif elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım yapılması işi, İletişim Fakültesi binası tadilat ve onarım işi, kampüs içi muhtelif binalara 13 adet engelli asansörü yapım işine ait proje hizmet alım işi ile Botanik Bahçe Uygulama ve Araştırma Merkezi binasına ait yapım işi gerçekleştirilmiştir.

##### 2. 1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2018 Yılı Yatırım Programının eğitim sektöründe olan proje için 17.150.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yılı içerisinde 21.872.000 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 39.022.000 TL olmuştur. Proje için 39.015.409 TL harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %99,98, alt projeleri kapsamında fiziki gerçekleşme oranları; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binası %100, TÖMER binası %100, Eczacılık Fakültesi binası %53 ve Güzel Sanatlar Fakültesi binası %50'dir.

Proje kapsamında; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina yapımı (6.000 m<sup>2</sup>) ve TÖMER binası yapımı (3.400m<sup>2</sup>) tamamlanmıştır. TÖMER binası yapımı projesinin amacı, yabancı öğrencilerin türkçe öğrenmesini sağlamaktır. TÖMER binası içerisinde 14 adet derslik, 10 adet okutman odası, 1 adet kütüphane, 1 adet konferans odası, 1 adet sığınak, 133 m<sup>2</sup> aktivite terası, 1 adet kafeterya, 2 adet mescit, 1 adet öğrenci işleri ve muhasebe odası, 2 adet çay ocağı, 1 adet mekanik oda, 1 adet toplantı odası, 1 adet sınav birimi, 11 adet WC grubu, 7 adet idari personel odası, 2 adet depo, 1 adet asansör ve 1 adet enerji odası santrali bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina yapımı projesinin amacı, derslik sayısının artırılmasıdır.

Tamamlanan işler sonucunda Derslik ve Merkezi Birimlerimizde 9.400 m<sup>2</sup> eğitim alanı olarak kapasite artışı sağlanmış, öğretim üyelerine ve öğrencilere daha kaliteli eğitim olanağı sunulmuştur. Ayrıca TÖMER binasının faaliyete geçmesi ile Üniversitemizi tercih edecek yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış sağlanacaktır.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Binasına Ait Görsel



TÖMER Binasına Ait Görsel

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz hizmet binası ihtiyacı için yapım işi ihalesi 2017 yılında yapılmış ve 08.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır ve yapımı kaba inşaat aşamasında olup, fiziki gerçekleşme oranı %53'tür. Yapımı 2019 yılında tamamlandığında 16.000 m<sup>2</sup> alanı ile bünyesinde 3 bölüm, 13 anabilim dalı ve 2 bilim dalını barındıracak, hem öğrenci kapasitesi arttırılmış hem de daha donanımlı eğitim ve öğretim verilererek Üniversitemiz gelişim sürecine katkı sağlanmış olacaktır.



Eczacılık Fakültesi Binası Yapımına Ait Görsel

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz hizmet binası ihtiyacı için yapım işi ihalesi 2017 yılında yapılmış ve 27.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır ve yapımı kaba inşaat aşamasında olup, fiziki gerçekleşme oranı %50'dir. Yapımı 2019 yılında tamamlandığında 15.000 m<sup>2</sup> alanı ile kendi hizmet binasına kavuşan fakültemizin hem öğrenci kapasitesi arttırılmış hem de daha donanımlı eğitim ve öğretim verilererek Üniversitemiz gelişim sürecine katkı sağlanmış olacaktır.





Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Yapımına Ait Görsel

### 3. 2014I000150 Onkoloji Hastanesi Projesi

2018 Yılı Yatırım Programının sağlık sektöründe olan proje için 1.500.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yılı içerisinde 5.290.369 TL şartlı bağış ve yardımlar olmak üzere toplam 9.220.369 TL ödenek eklemesi yapılarak revizeli yatırım ödeneği 10.720.369 TL olmuştur. Proje için 9.317.586 TL harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %85,24, fiziki gerçekleşme oranı ise %45'tir.

Onkoloji Hastanesi yapım işi ihalesi 2015 yılında yapılmış ve 30.03.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış ve yapımı kaba inşaat aşamasındadır. Yapımı 2019 yılında tamamlandığında 20.000 m<sup>2</sup> alana sahip 190 yatak kapasiteli hastane binası içerisinde 98 adet hasta odası, 9 adet yoğun bakım odası, 16 adet öğretim üyesi odası, 19 adet poliklinik, 9 adet uzman doktor odası, 4 adet intorn doktor odası, 11 adet hemşire odası, 2 adet laboratuvar, 4 adet özel oda, 4 adet izoleli oda, 15 adet depo, 4 adet iyot odası, 2 adet sığınak, 10 adet asansör, 4 adet ayakta tedavi odası, 5 adet WC grubu, 24 adet giyinme odası, 13 adet tıbbi müdahale odası, 8 adet toplantı odası, 3 adet dinlenme ve teknik oda, 2 adet arşiv, 1 adet çamaşırhane ve 9 adet mutfak bulunacaktır.

Projenin amacı, erişkin ve çocuk hasta grubu için hematoloji ve onkoloji bilim dallarında daha donanımlı ve kaliteli hizmet vermektir. Ayrıca 18 adedi kemik iliği nakli ünitesine ait olmak üzere toplam 190 hasta yatağına sahip sağlık alanında kaliteli hizmet sunmaktır.



Onkoloji Hastanesi Binası Yapımına Ait Görsel

#### 4. 2014K120260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2018 Yılı Yatırım Programının diğer kamu hizmetleri sektöründe olan proje için 1.500.000 TL yatırım ödeneği konulmuş olup, projenin 2019 yılında tamamlanmaktadır. Proje için 1.500.000 TL harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100, cihaz alımına ilişkin gerçekleşme oranı ise %95'tir.

Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası Yapımı, 2014 yılında yatırım programına alınmış ve 2016 yılında bina yapımı tamamlanmıştır. Aynı proje dahilinde 2017 yılında başlanılan cihaz alımları 2018 yılında da devam etmiştir.

Proje kapsamında; Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 2018 yılında İnfrared Spektroskopi (Ft-Ir) Cihazı, Uv-Vis Spektrofotometre, Phmetre, İletkenlik Ölçer, Termoreaktör, Boi Ölçüm Düzenegi, Soxhlet Cihazı, Türbidimetri, Dağımlı Raman Spektrometresi, Icp/Ms, Partikül Boyut Ölçüm Cihazı, Atomik Kuvvet, Gaz Kromotografi, Glove Box, Uv Floresan Spektroskopi cihazlarının alımı gerçekleştirilmiştir.



## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 13 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında tamamlanan projelerin listesi

SIRA NO	PROJE SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
1	Eğitim	2018H034560	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2		2018H031260	Yayın Alımı	Ç.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
3		2018H034550	Muhtelif İşler	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4		2018H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
5	Sağlık	2017I000180	Muhtelif İşler	Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı / Ç.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
6	Diğer Kamu Hizmetleri	2018K120490	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

## 2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

## 1. 2018H034560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2018H034560					
Proje Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Üniversitenin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapılarının planlanarak etüd-proje hazırlıklarının yapılması.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Etüd-Proje					
Fiziki Hedefi:	Hizmet alımı					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2018-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		100			330	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		330			330	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üstyapıların yapım işlerine başlanabilmesi için etüd-proje hazırlıklarının tamamlanması beklenmektedir. Planlanan tüm etüd-proje işleri tamamlanmış, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde bulunan Süt Sığırıcılığı Tesisi Yapımı İşi için tamamlanan proje hazırlığı sonucu, söz konusu yapım işi 2019 yılı yatırım programına alınmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının 5.0 Fiziksel Altyapıyı Güçlendirmek amacı doğrultusunda eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilerek eğitim kalitesinin artırılması, hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi açısından da sağlıklı, güvenli ve düzenli bir kampüs alt ve üstyapının yapılması için gerekli olan etüd-proje ihtiyaçları karşılanmıştır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Amfilerin (1-2-3-4 no'lu) yeni bina yapım uygulama projesi ile mevcut hemşire lojman binalarının Veteriner Fakültesi binasına dönüştürülmesi, güçlendirme ve renovasyon projesi işi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü binası yapılması uygulama projeleri, ihale işlem dosyasının hazırlanması ve proje hizmet alım işi, İletişim Fakültesi ile fakültenin derslik binası çevre düzenleme ve herkes için erişilebilir fiziksel çevre ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ait proje hizmet alım işi ile Ziraat Fakültesi 200 Baş Süt Sığırıcılığı Tesisi proje hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## 2. 2018H031260 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2018H031260					
Proje Adı:	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Yayın koleksiyonunun geliştirilerek, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi:	120.000 basılı, 300.000 elektronik kitap, 50.000 elektronik dergi alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2018-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.750			1.925	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		1.910			1.910	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yükseköğretim öğrenci ve öğretim üyelerine, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır. 2018 yılında merkezi kütüphanemiz kaynaklarından 14.881 adet kitap ödünç alınmış, yaklaşık 690.000 adet tam metin makale elektronik ortamda indirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin 2018 yılında Üniversitemizde üretilen ve uluslararası hakemli dergilerde, indexlerde yer alan 1.071 adet bilimsel yayının oluşmasında önemli katkısı olmuştur.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	672 adet basılı kitap, 50.675 adet elektronik kitap, 2.240 adet elektronik dergi alımı yapılmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar oluşturulmuş bilgilerin toplanmasını ve kullanıcıya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bilgi kaynakları son yıllarda çeşit olarak da değişmiş, kitap ve süreli yayınların yanında CD-ROM, DVD-ROM, görsel işitsel materyaller, Online veri tabanları, elektronik yayınlar kütüphane materyallerine eklenmiş ve kütüphanemiz bunları olanakları ölçüsünde sağlamıştır. Satın aldığımız kütüphane materyallerinin yaklaşık %95'i yabancı yayındır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları yayın alımı bütçesini olumsuz yönde etkilemektedir. Döviz kurları ve fiyat artışları sonucunda ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Kütüphanenin yayın alımları ödeneğinin Üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak artırılması. Ayrıca 2019 yılı başında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi oranları, tüm elektronik ortamda kullanılan yayınlar için %1'den %18'e çıkarılmıştır. Bu durum yayın alımları bütçesine çok büyük oranda olumsuz etki yapacaktır.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## 3. 2018H034550 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2018H034550					
Proje Adı:	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı:	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat.					
Fiziki Hedefi:	Makine-teçhizat ve hizmet alımı, bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2018-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		5.430			17.331	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		13.684			13.684	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinin muhtelif bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek, eğitim altyapısı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat alımlarını yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini artırılması beklenmektedir. Bu nedenle büro mefruşat, büro makinaları, bilgisayar ve yazılım alımları ile hizmet binalarının bakım onarımları tamamlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, güç kaynağı, haberleşme cihazları, kontrol ve güvenlik sistemleri, bilgisayar donanımı ve yazılımı, baskı makinesi, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile ilgili her türlü cihazlar, fiber optik kablolar sistemleri, güç trafosu, UPS, buzdolabı, hesap makinesi, fotokopi makinesi, evrak imha makinesi, projeksiyon, slayt makinesi, televizyon, masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri alımları ile Kuzey Çarşı Yerleşkesi içerisinde yer alan Sanat Galerisi yapılması işi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi tadilat ve onarım yapılması işi, Ziraat Fakültesine ait muhtelif noktalarda tadilat ve onarım yapılması işi, Tıp Fakültesi Dekanlığı muhtelif noktalarda tadilat ve onarım işi, Merkezi Kafeterya tadilat ve onarım işi, Kozan İşletme Fakültesinin sınıf ve ofis tadilatları ve onarım işi, Rektörlük binası tadilat ve onarım işi ile kampüs içi muhtelif yerlerde (Amfi Tiyatro, Tropikal Hastalıklar Merkezi, İletişim Fakültesi, Kongre Merkezi Binası, Rektörlük, Fen Edebiyat Fakültesi, Laboratuvarlar, Kütüphane Binası, Anaokulu) tadilat ve onarım yapılması işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler için bütçe yılı başında ihaleye çıkılmalıdır.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## 4. 2018H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2018H050040					
Proje Adı:	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri					
Sektör/Alt sektör:	Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor					
Proje Amacı:	Üniversitemiz spor tesislerinin gerekli bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek ve sunulan spor hizmetlerinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Bakım Onarım					
Fiziki Hedefi:	Bakım onarım yapım işi.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2018-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.000			1.625	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		1.622			1.622	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ait bakım ve onarım işleri tamamlanmış ve buna bağlı olarak da spor tesisleri fiziki olarak güçlendirilmiş, sunulan spor hizmetlerinin kalitesi artırılarak tesislerden yararlanan kişi sayısında artış sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Ç.Ü. Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı binasının çatı tadilat ve onarım yapılması işi, Sosyal Tesislerdeki futbol sahasına himaye teli yapılması işi, Ç.Ü. Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu kazan dairesi bakım ve onarım işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## 5. 2017I000180 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2017I000180					
Proje Adı:	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör:	Sağlık					
Proje Amacı:	Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletlerin alımını gerçekleştirmek, hastanenin büyük onarım ihtiyacını gidermek suretiyle sağlık hizmetinin kalitesini artırmak.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi:	Büyük bakım onarım yapım işi, makine-teçhizat alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2017-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		75.155			75.775	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)		20.068			21.594	
2018		29.970			29.970	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin amacı doğrultusunda Hastanemiz fiziki alanlarının iyileştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletler alınmış ve hastanemizin büyük bakım onarım işleri yapılarak sağlık hizmeti sunulan kişi sayısında artış sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Tıbbi ve biyolojik amaçlı kullanılan cihaz ve aletlerin (KBB Ünitesi Hasta İzleme Konsolu Ve Detectörü, KBB Poliklinik Görüntüleme Sistemi, Kalp Damar Cerrahi Elektrokoter, Cerrahi Alet Setleri, Teleskop, Üç Kanallı EMG Cihazı, Tek Kollu Esnek Cerrahi Tutucu Ve Pozisyonlama Sistemi, Tonopen, Tansiyon Aleti Ve Steteskop, Cerrahi Tanı Ve Girişim Seti, SİYOLA Endoskopi Sistemi, Alçı Kesme Motoru, Renkli Dopler Ultrasonografi Cihazı, Laparoskopik El Aletleri Seti, Tur Motoru Ve Mikrodebrider Sistem İçin Medtronic Mikrodebrider Elcek, Dijital Röntgen Cihazı, Yüksek Devirli Motor Elceği, Hasta Isıtma Blanketi, Yenidoğan Batın Seti Ve Mikrocerrahi Seti, Üroflometre Sistemi, Üst Düzey Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Cihazı, Kablosuz Şarj Edilebilir Dermatome Cihazı, Diode Lazer Cihazı, Flexible Nasofaringoskop Ve Otoloji Cerrahi Seti, Kemik Dokularının Makroskopik İncelenmesinde Kullanılacak Kesme Sistemi, Paslanmaz Çelik Hastane Donanımları, Spektrofluometre Cihazı, Ergonomik Mikroskop vb.) alımı ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi muhtelif yerlerindeki büyük onarım işi gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

## 6. 2018K120490 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2018K120490					
Proje Adı:	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Alt sektör:	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal					
Proje Amacı:	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerine destek vermek.					
Proje Yeri:	Adana					
Karakteristiği:	Proje Desteği					
Fiziki Hedefi:	Makine-Teçhizat alımı, Mal alımı.					
Başlama-Bitiş Tarihi:	01.01.2017-31.12.2018					
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		8.540			13.067	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)		13.067			13.067	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz Koordinasyon Birimimiz tarafından Üniversitemiz harcama birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinden 747 adedine destek sağlanarak, eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında yürütülen çalışmalara katkıda bulunulmuştur.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, demirbaş ve tüketim malzemesi alımları gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

### 3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle idaremizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşulların ve gerekliliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı arttırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, Yeni Muhasebe Sistemi, e-bütçe ve Ka-Ya Sistemi programlarının birbirleri ile entegre çalışabilecek şekilde düzenlenmesi faydalı olacaktır.



## Ek 1 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum/Birim Adı : Çukurova Üniversitesi  
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
<b>Eğitim*</b>	<b>6</b>		<b>166.362</b>			<b>96.502</b>			<b>31.000</b>			<b>66.321</b>			<b>60.716</b>
<b>Sağlık**</b>	<b>2</b>		<b>133.155</b>			<b>39.062</b>			<b>41.500</b>			<b>51.020</b>			<b>39.287</b>
<b>Diğer Kamu Hizmetleri</b>	<b>2</b>		<b>25.465</b>			<b>15.425</b>			<b>10.040</b>			<b>14.567</b>			<b>14.567</b>
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	2		25.465			15.425			10.040			14.567			14.567
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>		<b>324.982</b>			<b>150.989</b>			<b>82.540</b>			<b>131.908</b>			<b>114.570</b>

(\*) Sektör içerisindeki Kampüs Altyapı projesine 553.000 TL 2017 yılından devreden şartlı bağış ve yardımlardan ödenek eklemesi yapılmış ve 177.000 TL'si harcanmıştır.

(\*\*) Sektör içerisindeki Onkoloji Hastanesi projesine 5.290.000 TL yılı içerisinde gelen şartlı bağış ve yardımlardan ödenek eklemesi yapılmış ve tamamı harcanmıştır.
